

**BEFORE LD. CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AT
NEW DELHI
PETITION NO. ____/TT/2026**

AND IN THE MATTER OF:

Torrent Power Grid Limited

...Petitioner

Verus

Central Transmission Utility of India Ltd. & Ors.

...Respondents

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Index	1-3
2.	Memo of Parties	4-5
3.	Petition	6-21
4.	Annexure P-1: Copy of relevant extracts of Minutes of 11 th NCT Meeting along with CTUIL's letter dated 16.02.2023 conveying approval of the Transmission Scheme for implementation by TPGL.	22-42
5.	Annexure P-2: Copy of this Ld. Commission's Order dated 31.10.2023 in Petition No. 217/TL/2023 amending the Transmission License granted to TPGL.	43-70
6.	Annexure P-3: Copy of TPGL's letter dated 24.03.2023 requesting PGCIL to provide coordinates of the proposed 765 kV Ahmedabad Substation.	71
7.	Annexure P-4 (Colly): Copies of TPGL's follow up letters dated 01.05.2023, 10.11.2023, 03.01.2024 and 08.02.2024 to PGCIL requesting details of the proposed Ahmedabad S/s.	72-75
8.	Annexure P-5: Copy of PGCIL's email dated 19.02.2024 sharing coordinates and details of the Ahmedabad S/s with TPGL.	76-78

JIGNESH
DHANSUKHL
AL
LANGALIA

Digitally signed by
JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
18:58:56 +05'30'

Sr. No.	Particulars	Page Nos.
9.	Annexure P-6 (Colly): Copies of TPGL's Applications to the District Magistrate and the respective orders passed therein for Right of Way clearances.	79-257
10.	Annexure P-7: Copy of TPGL's letter dated 25.04.2025 to CTUIL and CEA apprising of severe resistance and requesting administrative support and police protection for RoW.	258-261
11.	Annexure P-8 (Colly): Copy of TPGL's Notice dated 05.06.2025 to CTUIL qua disruption and halt in project work due to heavy and unseasonal rainfall in May 2025.	262-268
12.	Annexure P-9 (Colly): Copy of TPGL's Notice dated 15.07.2025 to CTUIL qua disruption and halt in project work due to heavy and unseasonal rainfall during June and July 2025	269-330
13.	Annexure P-10 (Colly): Copy of TPGL's Notice dated 05.11.2025 to CTUIL qua disruption and halt in project work due to heavy and unseasonal rainfall	331-351
14.	Annexure P-11 (Colly): Copy of TPGL's letter dated 16.10.2024 to CTUIL regarding the Quarry Strike in Gujarat	352-354
15.	Annexure P-12: Copy of CEA's approval dated 27.01.2026 for energization of the Transmission Project.	355-356
16.	Annexure P-13 (Colly): Copies of TPGL's requests dated 03.02.2026 and 04.02.2026 to WRLDC for outage/shutdown during 10.02.2026 to 13.02.2026 for stringing work at the Transmission Project.	357-361
17.	Annexure P-14: Copy of WRLDC's email dated 09.02.2026 conveying deferment of scheduled outages requested by TPGL.	362-365
18.	Annexure P-15: Copy of TPGL's request dated 09.02.2026 re-scheduling dates of outage/shutdown for stringing, testing and commissioning works, with WRLDC approval for 16.02.2026 to 19.02.2026.	366-367

JIGNESH
 DHANSUKH
 LAL
 LANGALIA

Digitally signed
 by JIGNESH
 DHANSUKHLAL
 LANGALIA
 Date: 2026.06.16
 19:00:09 +05'30'

Sr. No.	Particulars	Page Nos.
19.	Annexure P-16 (Colly): Copies of TPGL's notification dated 05.03.2026 declaring CoD and WRLDC's certificate dated 27.02.2026 of successful trial operation for transmission elements/bays developed by TPGL.	368-369
20.	Annexure P-17: Copy of TPGL's Board Resolution dated 01.05.2024.	370-371
21.	Annexure P-18: Copy of the auditor's certificate dated 22.05.2026.	372-375
22.	Annexure P-19: Copy of the calculation of Interest During Construction (IDC) including notional IDC	376
23.	Annexure P-20 : Copy of the Tariff Forms	377-423
24.	Board Resolution	424-425
25.	Vakalatnama	426

Filed Through

PalashM

JSA, Advocates and Solicitors

Advocates for the Petitioner

3rd Floor, Tower C, World Trade Centre
Nauroji Nagar, New Delhi – 110029, India

Place: New Delhi

Date: 16.06.2026

**JIGNESH
DHANSUKH
LAL
LANGALIA**

Digitally signed
by JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:01:56 +05'30'

**BEFORE LD. CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
AT NEW DELHI
PETITION NO. ____/TT/2026**

AND IN THE MATTER OF:

Torrent Power Grid Limited

...Petitioner

AND

Central Transmission Utility of India Ltd. & Ors.

...Respondents

MEMO OF PARTIES

1. **Torrent Power Grid Ltd.**
"Samanvay", 600, Tapovan,
Ambawadi, Ahmedabad- 380015
Email: cs.tpgl@torrentpower.comPetitioner
- Versus*
1. **Central Transmission Utility of India Ltd.**
First Floor, Saudamini, Plot No. 2, Sector 29,
Near IFFCO Chowk Metro Station,
Gurgaon, Haryana - 122001.
Email: contact-ctu@ctuil.inRespondent No. 1
2. **Western Regional Power Committee**
F-3, MIDC Area, Marol
Opposite SEEPZ, Central Road
Andheri (East), Mumbai – 400 093
Email: as-wrpc@nic.inRespondent No. 2
3. **PTC India Limited**
2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama
Place, New Delhi - 110066
Email: cs@ptcindia.comRespondent No. 3
4. **Goa Electricity Department**
3rd Floor, Vidyut Bhavan, Panaji,
Goa - 403001.
Email: customersupport@goaelectricity.gov.inRespondent No. 4
5. **Gujarat Urja Vikas Nigam Limited**
Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course,
Vadodara - 390007, Gujarat.
Email: cs.guvnl@gebmail.comRespondent No. 5
6. **M.P. Power Management Company Limited**
14, Shakti Bhavan, Rampur,
Jabalpur - 482008

JIGNESH

DHANSUKHL

AL

LANGALIA

Digitally signed by

JIGNESH

DHANSUKHLAL

LANGALIA

Date: 2026.06.16

19:02:56 +05'30'

- Email: md@mppmcl.comRespondent No. 6
7. **Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited**
 "Prakashgad", Plot No. C -19,
 Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
 Mumbai - 400051.
- Email: customercare@mahadiscom.inRespondent No. 7
8. **Torrent Power Limited**
 Torrent Power Limited Naranpura Zonal Office,
 Sola Road, Ahmedabad – 380013.
- Email: cs@torrentpower.comRespondent No. 8
9. **Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited**
 Office of The Executive Director (C&P),
 State Load Dispatch Building,
 Dangania, Raipur - 492 013
- Email: eitc@cspc.co.inRespondent No. 9
10. **Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited**
 1st & 2nd Floor, Vidyut Bhavan, Silvassa,
 U.T. of Dadra & Nagar Haveli - 396230.
- Email: support.dnhpdcl@gov.inRespondent No. 10
11. **Central Electricity Authority**
 Sewa Bhawan, Rama Krishna Puram, Sector -1,
 New Delhi – 110066
- Email: chair@nic.in, saumitra.cea@nic.inRespondent No. 11

Through

Palash M
J. Sagar Associates
Advocates for the Petitioner
 3rd Floor, Tower C, World Trade Centre
 Nauroji Nagar, New Delhi – 110029, India

Place: New Delhi

Date: 16.06.2026

JIGNESH
DHANSUKH
LAL
LANGALIA

Digitally signed
 by JIGNESH
 DHANSUKHLAL
 LANGALIA
 Date: 2026.06.16
 19:04:03 +05'30'

**BEFORE LD. CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AT NEW
DELHI**

PETITION NO. ____/TT/2026

IN THE MATTER OF: Petition under Sections 62 and 79(1)(c) & (d) of the Electricity Act, 2003 and CERC (Terms and Conditions of Tariff Regulations), 2024 r/w Reg. 15(1)(a) and Reg. 23 of CERC (Conduct of Business) Regulations, 2023 seeking determination of tariff for the period from commercial operation date till 31.03.2029 for the Transmission Project developed under '*Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II - Part D*'.

AND IN THE MATTER OF:

Torrent Power Grid Limited

...**Petitioner**

AND

Central Transmission Utility of India Ltd. & Ors.

...**Respondents**

PETITION

The Petitioner respectfully submits:

A. Executive Summary of the Petition

A(i) Brief background of the Petitioner

1. Torrent Power Grid Ltd. ("TPGL") is a licensee of an inter-state transmission system ("ISTS") under Section 2(73) of the Electricity Act, 2003. As per the license dated 16.05.2007 [as amended on 01.12.2010 and 31.10.2023] granted by this Ld. Commission, TPGL developed the 'Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II - Part D' ("**Transmission Project**") and achieved commercial operation on 24.02.2026 ("**CoD**").

A(ii) Brief Background of the Respondent(s)

2. The background of the Respondents to the present Petition is detailed below.

2.1 Central Transmission Utility of India Ltd. ("CTUIL"), Respondent No. 1, is a company incorporated under the Companies Act, 1956 and is the central transmission utility within the meaning of Section 2(10) of the Electricity Act, 2003.

**JIGNESH
DHANSUKH
LAL
LANGALIA**

Digitally signed
by JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:05:08 +05'30'

2.2 Western Regional Power Committee (“WRPC”), Respondent No. 2, is a Regional Power Committee established by the Central Government under Section 2(55) of the Electricity Act, 2003 for facilitating the integrated operation of the power system in the Western region.

2.3 PTC India Limited, Respondent No. 3, is a company incorporated under the Companies Act, 1956 and is engaged in the business of inter-state trading of electricity.

2.4 Goa Electricity Department, Respondent No. 4, is the Electricity Department of the state of Goa, engaged in the distribution and supply of electricity within Goa.

2.5 Gujarat Urja Vikas Nigam Limited, Respondent No. 5, is a distribution licensee in the state of Gujarat.

2.6 M.P. Power Management Company Limited, Respondent No. 6, is a company engaged in the business of distribution and supply of electricity on behalf of all the distribution licensees of the State of Madhya Pradesh.

2.7 Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, Respondent No. 7, is a distribution licensee engaged in power distribution activities in Maharashtra.

2.8 Torrent Power Limited, Respondent No. 8, is a distribution licensee and a generating company under the Electricity Act, 2003.

2.9 Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Respondent No. 9, is the transmission licensee and state transmission utility for the State of Chhattisgarh.

2.10 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited, Respondent No. 10, is a distribution licensee in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

2.11 Central Electricity Authority (“CEA”), Respondent No. 11, is a statutory body constituted under Section 70 of the Electricity Act, 2003.

A(iii) Background of Transmission Asset

3. By Order dated 16.05.2007 in Petition No. 97/2006 [*Torrent Power Transmission Private Limited, Ahmedabad vs. Torrent Power AEC Limited, Ahmedabad & Ors.*], TPGL was granted a transmission license by this Ld. Commission (as amended by order dated 03.11.2010

**JIGNESH
DHANSUKHL
AL LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:07:08 +05'30'

r/w corrigendum dated 01.12.2010) for the construction, maintenance and operation of the following transmission system:

“a. Transmission Lines

- (i) LILO of Gandhar-Vapi 400 kV S/C line at Sugan CPP switchyard – 26 Kms*
- (ii) Sugan-Pirana (PG) 400 kV D/C (in two phases): [400 kV D/C line 222 kms. and M/C line 6 kms.] as under:*

- (a) From Sugan to a point near Gandhar where LILO of the circuit where LILO of the circuit of existing Gandhar-Dehgam 400 kV D/C line at Sugan will be done.*
- (b) Extension of the line to Pirana (PG) with LILO of Pirana (TPL) sub-station and opening of LILO of Gandhar-Dehgam line near Gandhar as well as restoration of Gandhar-Dehgam line to its original configuration.*

b. Sub-station Work

- (i) 2 Nos. 400 kV line bays at Pirana (PG) 400/200 KV (New) Sub-station.”*

4. The aforesaid transmission system was commissioned in three phases viz. 01.03.2009 (Phase I), 01.04.2010 (Phase II) and 01.04.2011 (Phase III).

5. On 23.09.2020, Ministry of Power (“**MoP**”) notified the ‘Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II-Part D’ (“**2020 Transmission Scheme**”) to be implemented under the Tariff Based Competitive Bidding (“**TBCB**”) which forms a part of the planned transmission for evacuation of the 4.5 GW RE injection from Khavda complex (Part A to Part D).

6. On 07.11.2022, in the 10th Meeting of National Committee on Transmission (“**NCT**”), it was agreed that since the 2020 Transmission Scheme includes reconductoring part of assets under TPGL’s Transmissions System, i.e. Pirana (PG)-Pirana (T) line, the mode of implementation of the 2020 Transmission Scheme would be changed from TBCB to Regulated Tariff Mechanism (“**RTM**”), which would entail de-notifying the 2020 Transmission Scheme under TBCB route.

7. On 13.01.2023, MoP de-notified the 2020 Transmission Scheme under the TBCB route.

8. On 28.12.2022 and 17.01.2023, NCT, in its 11th Meeting, approved the 2020 Transmission Scheme with revised scope of works to be implemented by TPGL under RTM mode. Subsequently, CTUIL by letter dated 16.02.2023, conveyed approval of the 2020 Transmission Scheme, as decided in the 11th NCT Meeting, and for its implementation by TPGL under RTM. The **scope of work** as detailed under the 11th NCT Meeting is below:

**JIGNESH
DHANSUKHL
AL LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:08:26 +05'30'

“Transmission Scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II – Part D

<i>Sl. No.</i>	<i>Scope of the Transmission Scheme</i>
<i>1.</i>	<i>LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section</i>
<i>2.</i>	<i>Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos@</i>

@ The current rating of existing bays at Pirana (PG) & Pirana (T) is 2000 A. 04 Nos. 400 kV line bays upgradation includes 02 bays upgradation at Pirana (PG) and 02 bays upgradation at Pirana (T). Upgradation at Pirana (T) shall also include upgradation of 400 kV Bus coupler bay and 400 kV Transfer bus coupler bay along with upgradation of bus bar.

Note:

- (i) Transmission system for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda is being taken up under Phase-I. Phase-II RE scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda needs to be taken up for evacuation requirement beyond 3 GW from Khavda RE park.*
- (ii) Implementation of all the transmission packages proposed for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda RE park under Phase-II (Part A to Part D) needs to be taken up in similar timeframe.*
- (iii) The switching scheme of existing 400 kV Pirana (T) S/S is Double Main and Transfer (DMT) Scheme and current rating of existing Bus Coupler Bay and Transfer Bus Coupler Bay is 2000 A. With upgradation of line bays to 3150 A (to suit the re-conductoring with Twin HTLS conductor), existing 400 kV Bus Coupler Bay and Transfer Bus Coupler (with associated bus bar) shall also be upgraded to 3150 by the TSP.*

The scheme has already been de-notified vide Gazette Notification No. 221 dated 13.01.2023. Estimated cost of the scheme: Rs. 221 Crs (as per CTUIL email dated 10.02.2023)

Implementing agency: Torrent Power Grid Limited (TPGL)

Implementation timeframe: In matching the commissioning timeframe of Khavda Phase-II (Part A to C). The implementing agency under RTM would coordinate with the BPC/SPV of Khavda Phase II (Part A – C) schemes to match the commissioning timeframe.”

Copy of the relevant extracts of the Minutes of 11th NCT meeting, along with CTUIL’s letter dated 16.02.2023, is at **Annexure P-1 (Colly)**.

9. On 31.10.2023, this Ld. Commission passed Order in Petition No. 217/TL/2023 amending the Transmission License granted to TPGL by including the scope of work envisaged under the 2020 Transmission Scheme to be implemented by TPGL. Accordingly, TPGL

JIGNESH

DHANSUKHL

AL LANGALIA

Digitally signed by

JIGNESH

DHANSUKHLAL

LANGALIA

Date: 2026.06.16

19:09:37 +05'30'

initiated development of its Transmission Project. Copy of this Ld. Commission's Order dated 31.10.2023 is annexed at **Annexure P-2**.

B. Issues encountered by TPGL during execution of Transmission Project

10. During the execution of the Transmission Project, the issues encountered by TPGL are detailed below.

B(i) Delay due to belated intimation of location of Ahmedabad S/s by PGCIL

11. Since the scope of TPGL's Transmission Project included development of LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at 765 k/V Ahmedabad substation ("S/s") [*developed by PGCIL under TBCB package Khavda Phase II Part C*], without the location and details of the Ahmedabad S/s, TPGL could not have even commenced work towards its Project. In this regard, the following is noteworthy: -

- (a) On 24.03.2023, TPGL requested PGCIL to provide coordinates of the proposed 765 k/V Ahmedabad Substation (*being developed by PGCIL under TBCB package Khavda Phase II Part C*) ("**Ahmedabad S/s**") along with exact location, bay orientation and target commissioning date to enable route finalization and undertake survey activity. Copy of TPGL's letter dated 24.03.2023 is annexed at **Annexure P-3**.
- (b) On 01.05.2023, 10.11.2023, 03.01.2024 and 08.02.2024, TPGL sent follow up letters to PGCIL to enquire about details of the proposed Ahmedabad S/s and informed that since the said information is still awaited, TPGL is not able to initiate any work towards the Project. Copies of TPGL's follow up letters are annexed at **Annexure P-4 (Colly)**.
- (c) On 19.02.2024, PGCIL shared coordinates and details of the Ahmedabad S/s with TPGL. Copy of PGCIL's email dated 19.02.2024 is annexed at **Annexure P-5**.
- (d) Accordingly, TPGL was not in a position to commence development of LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line, due to factors beyond TPGL's reasonable control.

12. In view of the above, the delay of 332 days caused due to delay in finalisation of location of Ahmedabad S/s by PGCIL ought to be considered from the overall period in achieving the CoD of TPGL's Transmission Project.

**JIGNESH
DHANSUKHL
AL LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:11:03 +05'30'

B(ii) Delay due to Right of Way issues

13. During execution of the project, TPGL encountered severe Right of Way (“RoW”) issues. To resolve such issues, TPGL approached the District Magistrate (“DM”) through appropriate applications seeking RoW clearances. Details of TPGL’s applications to the DM and the orders issued therein are tabulated below:

Sl. No.	Date of Application	Location for RoW clearance	No. of tower locations	Date of DM Order	Delay (days)
1.	26.07.2024 (D-1)	Village Saroda, Taluka Dholka	4	13.03.2025	231
2.	20.09.2024 (D-2 & D-3)	Villages Kasindra, Saroda, Badarkha, Chaloda, Juval-Rupavati across Talukas Daskroi, Dholka, and Bavla	16	09.04.2025	202
3.					
4.	17.10.2024 (D-4)	Villages Kamod and Bakrol-Badrabad, Taluka Daskroi	3	13.03.2025	148
5.	22.11.2024 (D-5)	Villages Bavla, Adroda, Taluka Bavla	16		112
6.	30.12.2024 (D-6)	Villages Melasana, Makhiyav, Bakarana, Zolapur, Taluka Sanand	20		74
7.	21.01.2025 (D-7)	Villages Juval-Rupavati, Salajda, Rupal, Sankod, Taluka Bavla	8	01.05.2025	101
8.	27.01.2025 (D-8)	Villages Mankol, Kundal, Taluka Sanand	5	08.04.2025	72
9.	21.02.2025 (D-9)	Village Bakrana, Taluka Sanand	1		47
10.	07.03.2025 (D-10)	Village Kundal, Taluka Sanand	1	01.05.2025	56

Copies of TPGL’s Applications and DM’s Orders are at **Annexure P-6 (Colly)**.

14. Further, despite the DM Orders granting RoW clearances for the Transmission Project, TPGL faced severe and continued resistance at several locations which impaired the execution of the Transmission Project. TPGL was compelled to request for administrative support and police protection to resolve such issue. TPGL, by letter dated 25.04.2025, apprised the same to CTUIL and Central Electricity Authority (“CEA”). Copy of the letter dated 25.04.2025 is annexed at **Annexure P-7**.

15. Evidently, due to the RoW issues faced by TPGL, there was a cumulative delay of 280 days which was beyond TPGL’s reasonable control.

**JIGNESH
DHANSUKHLA
L LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:12:29 +05'30'

B(iii) Disruption and halting of project work due to heavy and unseasonal rainfall

16. Due to heavy and unseasonal rainfall in Ahmedabad during the months of May to July 2025 and October to November 2025, the project was halted for a cumulative period of 50 days, due to factors beyond TPGL's reasonable control. In this regard, the following is noteworthy:

- (a) On 05.06.2025, TPGL informed CTUIL about disruption and halt in project work in the construction of the 400 kV M/C LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c transmission line for a period of 12 days in May 2025 due to heavy and unseasonal rainfall in Ahmedabad between 05.05.2025 to 07.05.2025 and 25.05.2025 to 27.05.2025. TPGL, accordingly, sought time extension for commissioning the Transmission Project. Copy of TPGL's Notice dated 05.06.2025, along with documents evidencing the heavy and unseasonal rainfall, is annexed at **Annexure P-8 (Colly)**.
- (b) On 15.07.2025, TPGL intimated CTUIL about disruption and halt in project work in the construction of 400 kV M/C LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c transmission line due to heavy and unseasonal rainfall in Ahmedabad during June 2025 and July 2025 which *inter alia* affected the project work for 24 days. Copy of TPGL's Notice dated 15.07.2025, along with documents evidencing the heavy and unseasonal rainfall are annexed at **Annexure P-9 (Colly)**.
- (c) On 05.11.2025, TPGL intimated CTUIL about disruption and halt in project work in the construction of 400 kV M/C LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c transmission line due to heavy and unseasonal rainfall in Ahmedabad during October and November 2025 *inter alia* which affected the project work for 14 days. Copy of TPGL's Notice dated 05.11.2025, along with documents evidencing the heavy and unseasonal rainfall at Ahmedabad is annexed at **Annexure P-10 (Colly)**.

B(iv) Disruption in supply of crucial materials due to Quarry Strike

17. On 02.10.2024, Quarries and Mines Association in Gujarat initiated an indefinite strike due to non-issuance of Environmental Clearance by Government of Gujarat to quarries ("Quarry Strike"). This strike led to a massive disruption in the supply chain of crucial raw material required for the development of the Transmission Project.

**JIGNESH
DHANSUKHLA
L LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:13:33 +05'30'

18. On 16.10.2024, TPGL issued a notice to CTUIL informing about the Quarry Strike and that the strike has disrupted supply of crucial materials that are essential for construction of LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c. TPGL also informed that due to the strike, the project work was hampered from 02.10.2024 to 16.10.2024. Copy of TPGL's letter dated 16.10.2024, along with newspaper clippings evidencing the Quarry Strike, are at **Annexure P-11 (Colly)**.

B(v) Delay in outage/shutdown approval of LILO

19. On 27.01.2026, CEA granted approval to TPGL for energization of the Transmission Project. Copy of CEA's approval is annexed at **Annexure P-12**.

20. On 03.02.2026 and 04.02.2026, TPGL submitted its request for outage/shutdown on 10.02.2026 to 13.02.2026 to Western Regional Load Despatch Centre ("WRLDC") for conducting stringing work at the Transmission Project. Copies of TPGL's requests are annexed at **Annexure P-13 (Colly)**.

21. On 09.02.2026, WRLDC conveyed deferment of scheduled outages requested by TPGL. Copy of WRLDC's email dated 09.02.2026 is annexed at **Annexure P-14**.

22. On 09.02.2026, TPGL re-scheduled the dates of its outage/shutdown for stringing, testing and commissioning works. Subsequently, WRLDC approved outage/shutdown during 16.02.2026 to 19.02.2026. Copy of TPGL's request dated 09.02.2026 is at **Annexure P-15**.

23. On 24.02.2026, TPGL's Transmission Project achieved CoD. On 27.02.2026, WRLDC issued certificate of successful trial operation for the transmission elements/bays developed by TPGL under the 2020 Transmission Scheme. Copies of TPGL's notification dated 05.03.2026 declaring CoD and WRLDC's certificate dated 27.02.2026 are at **Annexure P-16 (Colly)**.

24. Summary of event-wise delay is tabulated below:

Sl. No.	FM Event	Start Date	End Date	Period of Impact
1.	Delay due to belated intimation of location of Ahmedabad S/s by PGCIL	24.03.2023	18.02.2024	332 Days
2.	Delay due to RoW issues	26.07.2024	01.05.2025	280 days
3.		05.05.2025	10.05.2025	6 days
		25.05.2025	30.05.2025	6 days
		17.06.2025	30.06.2025	14 days

**JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16 19:15:10
+05'30'

Sl. No.	FM Event	Start Date	End Date	Period of Impact
	Disruption and halting of project work due to heavy and unseasonal rainfall	01.07.2025	10.07.2025	10 days
		28.10.2025	10.11.2025	14 days
		Total		50 days
4.	Disruption in supply of crucial materials due to Quarry Strike	02.10.2024	16.10.2024	15 days
5.	Delay in outage/shutdown approval of LILO	10.02.2026	15.02.2026	6 days
Total period of impact (A)			683 days	
Period of overlap (B)			15 days	
Actual Period of Impact (A-B)			668 days	

25. In view of the aforesaid detailed submissions, it is evident that the commissioning of the Transmission Project was impacted by unforeseen events which were beyond the reasonable control of TPGL and qualify as Force Majeure. Such unforeseen events impacted the development of the Transmission Project for a total of 683 days, and led to a cumulative delay of 668 days.

26. Despite the development of the Transmission Project being impacted for 668 days, as a result of TPGL's efficient and accelerated execution, the delay was mitigated to 340 days and the Transmission Project achieved CoD on 24.02.2026. In view of the aforesaid, delay of 340 days ought to be condoned.

27. In terms of Regulations 3(31), 19(2)(n) and 21(4) of the CERC Tariff Regulations 2024, a transmission licensee, affected by factors beyond its reasonable control, is not held adversely liable if there is delay in commissioning of its transmission system. In fact, the transmission licensee is, effectively, financially compensated.

C. Details of cost of the Transmission Project & Annual Transmission Charges

28. The breakdown of cost components incurred towards development of the Transmission Project and the calculation for working out the Annual Transmission Charges are detailed below.

C(i) Capital Cost of TPGL's Transmission Project

29. Regulation 19 of CERC Tariff Regulations specifies the norms related to capital cost of a project. Towards the Transmission Project, TPGL's Board approved capital cost of INR 80,000.00 Lakh on 01.05.2024. Copy of TPGL's Board Resolution is annexed at **Annexure P-17**.

JIGNESH
DHANSUKHL
AL LANGALIA

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:18:11 +05'30'

30. The Capital Cost incurred as on CoD of the Transmission Project (i.e. 24.02.2026) is INR 51,176.25 Lakh, as tabulated below:

Sl. No.	Particulars	in INR Lakhs
1.	Plant & Machinery Cost	48,766.81
2.	IEDC	207.53
3.	IDC	2,201.90
Total*		51,176.24

**Includes Notional IDC of Rs. 1,012.28 Lakh and un-discharged liability of Rs. 1,218.27.*

31. Detailed breakup of Capital Cost has been provided in **FORM-5**. The capital cost incurred up to CoD is duly certified by an auditor's certificate which details the assets covered in the present Petition. Copy of the auditor's certificate is at **Annexure P-18**.

C(ii) Additional Capitalization after CoD

32. The Transmission Project achieved CoD on 24.02.2026. Accordingly, as per Regulation 3(16) of CERC Tariff Regulations 2024, the cut-off date for Additional Capital Expenditure ("ACE") to be incurred after CoD is 31.03.2029.

33. In terms of Regulation 3(16) r/w Regulation 24 of CERC Tariff Regulations 2024, TPGL has claimed ACE for FY 2025-26 & 2026-27 primarily towards undischarged liabilities recognized to be payable in the future, retention payments, payments towards RoW in terms of Regulation 24(1)(a). The breakup of ACE is detailed below:

(Rs. Lakhs)

Particulars	FY 2025-26 [24.02.2026 to 01.03.2026]	FY 2026-27	Total
Transmission	3,302.63	7,981.62	11,284.25
Sub-station	120.03	-	120.03
Total	3,422.66	7,981.62	11,404.28

34. Detailed break-up of ACE is at **FORM-7** of the present Petition.

C(iii) Interest during construction and incidental expenditure during construction

35. Regulation 21 of CERC Tariff Regulations 2024 specifies the methodology for calculation of interest during construction ("IDC") and incidental expenditure during construction ("IEDC"). Accordingly, TPGL has furnished details of IDC showing details of loans deployed along with the interest rates at **FORM 12B** of the present petition.

**JIGNESH
DHANSUKHL
AL LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:19:49 +05'30'

36. TPGL has claimed IDC of INR 2,201.90 Lakh including notional IDC in accordance with Regulation 19(2)(b) and Regulation 21(1) of CERC Tariff Regulations 2024. The calculation thereof is annexed at **Annexure P-19**.

37. The overall project cost, including estimated ACE, is INR 61,362.25 Lakhs, which is lower than the capital cost for the Transmission Project approved by TPGL's Board. The reason behind reduction in actual capital cost as against capital cost approved by TPGL's Board is primarily due to efficient management of RoW resulting into lower RoW compensation. TPGL has rigorously pursued land owners to optimize the RoW expenses.

C(iv) Component of Annual Transmission Charges:

38. TPGL has worked out Annual Transmission Charges in accordance with CERC Tariff Regulations 2024 as elaborated below:

- (a) **Depreciation:** Regulation 33 of CERC Tariff Regulations 2024 provides for the methodology for computation of depreciation. Appendix-II of CERC Tariff Regulations 2024 'Depreciation Schedule for New Project' provides for depreciation rates to be considered for calculating depreciation. Accordingly, TPGL has provided detailed working on calculation of Weighted Average Rate of Depreciation ("**WAROD**") at **FORM 10** of the present Petition.
- (b) **Interest on Loan capital:** Regulation 32 of CERC Tariff Regulations 2024 specifies the methodology for calculation of interest on loan. For the finances required for the Transmission Project, there is only one lender involved, and the applicable interest on loan is 8.30% as on CoD. TPGL has furnished the computation of interest on loan at **FORM 9E** of the present Petition.
- (c) **Return on Equity:** Regulations 30 and 31 of CERC Tariff Regulations 2024 specify the methodology for computation of Return on Equity ("**RoE**"). Regulation 30(3) provides that RoE for new project achieving CoD on or after 01.04.2024 shall be computed at the base rate of 15.00%. Regulation 31(2) of CERC Tariff Regulations 2024 provides for grossing up of RoE with income tax. Accordingly, RoE has been calculated on the normative equity contribution, which is 30% of the capital cost. Based on the above, TPGL has provided the computation of RoE at **FORM 8** of the present Petition.
- (d) **Operation and Maintenance Expenses:** Operation and Maintenance ("**O&M**") expenses have been calculated as per Regulations 36(3)(a) of the Tariff Regulations

JIGNESH

DHANSUKHLA

L LANGALIA

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL

LANGALIA

Date: 2026.06.16

19:21:03 +05'30'

2024. Further, Regulation 36(3)(d) of CERC Tariff Regulations 2024 which *inter alia* provides that insurance expenses for the transmission system and associated communication system shall be allowed separately. The details of O&M expenses, including insurance expenses, is furnished at **FORM 2** of the present Petition.

- (e) **Interest on Working Capital:** Regulation 34(1)(d) of CERC Tariff Regulations 2024 specifies norms of working capital for transmission systems. TPGL has considered the rate of interest on working capital as per Regulation 34(3) & (4) of CERC Tariff Regulations 2024. The calculation of interest on working capital has been provided at **FORM-11** of the present Petition.

39. Based on above, the Annual Fixed Cost for TPGL's Transmission Project for the Control Period FY 2024-25 to FY 2028-29 has been summarized as follows:

Particulars (in Rs. Lakh)	2025-26 [24.02.2026 to 31.03.2026]	2026-27	2027-28	2028-29
Depreciation	215.40	2,424.42	2,593.07	2,593.07
Interest on Loan	295.20	3,214.79	3,238.43	3,023.20
Return on Equity	277.88	3,084.80	3,299.39	3,299.39
Interest on Working Capital	12.82	137.93	144.02	141.59
O&M Expenses	17.26	172.97	181.94	191.32
Total AFC	818.57	9,034.92	9,456.84	9,248.57

40. Regulation 94 of CERC Tariff Regulations 2024 provides for reimbursement/recovery of court fees paid towards filing of Petition seeking determination of tariff, along with other expenses incurred towards publication of notices, license fee, and other charges. TPGL prays before this Ld. Commission to allow the same as per the applicable Regulations.

41. Copy of the Tariff Forms along with the checklist is annexed at **Annexure P-20**.

D. Limitation

42. In terms of Regulation 9(1) of CERC Tariff Regulations 2024, TPGL is filing this Petition with a delay of 23 days. It is submitted that the delay in filing the present Petition is inadvertent and there is no *mala fide* on part of TPGL. The said delay was occasioned on account of the time it took for working out the detailed cost calculations and the Annual Transmission Charges for the Transmission Project, which are required to be furnished along with the present Petition. No prejudice will be caused to any party if this Ld. Commission condones the delay occasioned in filing the present Petition, however, grave prejudice will be

**JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA**

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16 19:23:22
+05'30'

caused to TPGL if such delay is not condoned. Therefore, it is humbly prayed that this Ld. Commission may condone the delay of 22 days in filing the present Petition.

E. Prayers

43. In view of the facts, circumstances and submissions detailed above, the Petitioner humbly prays that this Ld. Commission may be pleased to:

- (a) Admit the present Petition filed for determination of transmission tariff for the Control Period FY 2024-25 to FY 2028-29, and condone the delay of 23 days in filing the present Petition.
- (b) Condone delay in commissioning of TPGL's Transmission Project.
- (c) Approve the CoD of TPGL's Transmission Project, i.e. 24.02.2026.
- (d) Admit the Capital Cost claimed in the present Petition and approve the Additional Capitalization incurred/projected to be incurred by TPGL towards the Transmission Project.
- (e) Allow the Notional IDC claimed in terms of Regulation 19(2)(b) and 21(1) of CERC Tariff Regulations 2024.
- (f) Approve the Transmission Tariff for the Control Period FY 2024-25 to FY 2028-29 for the transmission assets covered under the present Petition.
- (g) Allow interim tariff of 90% in accordance with Regulation 10(3) of CERC Tariff Regulations 2024.
- (h) Allow TPGL to claim the insurance expenses and consequential interest on working capital on that insurance expenses.
- (i) Allow final tariff in accordance with Regulation 10(5) of CERC Tariff Regulations 2024.
- (j) Approve reimbursement of expenditure from the beneficiaries towards filing fees of the present Petition, expenditure on publishing of notices in newspapers, other expenditure (if any) in relation to the filing of the present Petition, licensee fee and RLDC fees & charges in terms of Regulation 94(1), (3) & (4) of CERC Tariff Regulations, 2024.
- (k) Allow TPGL to bill and recover from the beneficiaries, any taxes payable to the Government (central or state) or statutory authorities, towards realization, processing, calculation etc. of aforementioned Tariff (Annual Transmission Charges) that are paid by TPGL for Tariff Block of FY 2024-25 to FY 2028-29.

**JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA**

Digitally signed by JIGNESH
DHANSUKHLAL LANGALIA
Date: 2026.06.16 19:24:44
+05'30'

- (l) Allow TPGL to bill and adjust impact on interest on loan due to change in interest rate on account of floating rate of interest applicable during FY 2024-25 to FY 2028-29, if any, from the beneficiaries.
- (m) Allow TPGL to make additions/alterations/modifications/changes to the Petition, if required.
- (n) Condone any inadvertent omissions/errors/shortcomings in the present Petition and permit TPGL to add/modify/change/alter the present Petition and make further submissions, as may be required.
- (o) Pass any other orders/directions that this Ld. Commission may deem fit and appropriate.

Torrent Power Grid Limited

Through: *Palash M*
J. Sagar Associates
Advocates for the Petitioner
3rd Floor, Tower C,
World Trade Centre, Nauroji Nagar,
New Delhi – 110029


Date: 16.06.2026

Place: New Delhi

JIGNESH
DHANSUKHL
AL LANGALIA

Digitally signed by
JIGNESH DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:26:16 +05'30'

PalashM
COUNSEL FOR THE PETITIONER



15 JUN 2026

M. H. Thakkar
PETITIONER



DECLARATION

The Petitioner abovenamed hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declares that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of the original(s)/fair representation of the originals/true translation thereof.

Verified at _____ on _____ day of June 2026

PalashM
Counsel for the Petitioner





M. H. Thakkar
Petitioner

VERIFICATION

Verified at _____ on this 15 day of June 2026, that the contents of my above noted affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Place: Ahmedabad

Date: .06.2026



15 JUN 2026

JIGNESH
DHANSUKH
LAL
LANGALIA

Digitally signed
by JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:27:38 +05'30'

BEFORE LD. CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AT NEW
DELHI
PETITION NO. ___/TT/2026

IN THE MATTER OF:

Torrent Power Grid Limited

AND

Central Transmission Utility of India Ltd. & Ors.



AFFIDAVIT

15 JUN 2026

I, Mihir Hasmukhbhai Thakkar, son of Mr. Hasmukhbhai Thakkar, aged about 38 years, having office at "Samnvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380015, being the authorized signatory of the Petitioner, Torrent Power Grid Limited

1. I say that I am the authorized signatory of the Petitioner and am competent to affirm the present Petition on behalf of the Petitioner.
2. I say that the facts stated in the accompanying Petition are true and correct to the best of my knowledge based on the records of the Petitioner and the legal submissions made are based upon information received by me and believed to be true.
3. I say that all the annexures to the accompanying Petition are true copies of its respective originals.




M. H. Thakkar
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of my above affidavit are true and correct, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at ___ on this 15 day of June, 2026.



M. H. Thakkar
DEPONENT



15 JUN 2026

JIGNESH
DHANSUK
HLAL
LANGALIA
Digitally signed
by JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA
Date: 2026.06.16
19:29:50 +05'30'



I/25992/2023

Annexure P-1 (Colly)



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
विद्युत प्रणाली योजना एवं मूल्यांकन प्रभाग-II
Power System Planning & Appraisal Division-II

सेवा में/To

As per list of Addresses

विषय : ट्रांसमिशन पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त – के सम्बन्ध में।

Subject: Minutes of the 11th meeting of National Committee on Transmission (NCT) – regarding.

महोदया (Madam) / महोदय (Sir),

The 11th meeting of the "National Committee on Transmission" (NCT) was held on 28th December 2022 (1st Sitting) and 17th January 2023 (2nd Sitting). Minutes of the meeting are enclosed herewith.

Encl.: As above.

भवदीय/Yours faithfully,

 01.02.2023

(ईशान शरण/Ishan Sharan)

मुख्य अभियंता / Chief Engineer

प्रतिलिपि / Copy to:

Joint Secretary (Trans), Ministry of Power, New Delhi

JIGNESH

DHANSUKHL

AL LANGALIA

Digitally signed by

JIGNESH

DHANSUKHLAL

LANGALIA

Date: 2026.06.16

19:31:11 +05'30'

List of Addresses:

1.	Chairperson, Central Electricity Authority Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi – 110 066.	2.	Member (Power Systems), Central Electricity Authority Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi – 110 066.
3.	Member (Economic & Commercial), Central Electricity Authority Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi – 110 066.	4.	Director (Trans), Ministry of Power Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001.
5.	Sh. Dilip Nigam, Scientist 'G', MNRE, Block Nos. 14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003	6.	Chief Operating Officer, CTUIL, Saudamini, Plot Nos. 2, Sector-29, Gurgaon – 122 001.
7.	Sh. Rajnath Ram, Adviser (Energy), NITI Aayog, Parliament Street, New Delhi – 110 001.	8.	CMD, Grid Controller of India, B-9, Qutub, Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110010
9.	Dr. Radheshyam Saha, Ex. Chief Engineer, Central Electricity Authority		

Index

1	Confirmation of the minutes of the 10 th meeting of National Committee on Transmission.....	2
2	Status of the transmission schemes Noted/approved/recommended to MoP in the 10 th meeting of NCT:.....	2
3	New Transmission Schemes submitted by CTUIL:.....	3
4	Communication schemes for existing ISTS.....	42
5.	Evaluation of functioning of National Grid.....	46
6.	Comprehensive presentation by CTU apprising NCT of measures taken for ensuring development of an efficient, co-ordinated and ecoNomical ISTS for smooth flow of electricity.....	48
7.	Five-year rolling plan for ISTS capacity addition.....	48
	Summary of the deliberations of the 11 th NCT meeting held on 28.12.2022 and 17.01.2023.....	50
	Annex-I.....	63

Minutes of the 11th meeting of National Committee on Transmission (NCT) held on 28th December 2022 & 17th January 2023

List of participants is attached as **Annex-I**.

Chairperson, CEA & Chairman, NCT, welcomed the participants and requested Member Secretary, NCT, to take up the agenda points for discussion.

1 Confirmation of the minutes of the 10th meeting of National Committee on Transmission.

1.1 The minutes of 10th meeting of NCT held on 07.11.2022 were issued on 12.12.2022 vide letter Nos.CEA-PS-12-13/3/2019-PSPA-II Division. No comments/observations were received on the minutes. The minutes of the 10th meeting were confirmed.

2 Status of the transmission schemes Noted/approved/recommended to MoP in the 10th meeting of NCT:

2.1 The status of the transmission schemes Noted/approved/recommended to MoP in the 10th meeting of NCT is tabulated below:

Sl. No.	Name of the Transmission Scheme	Noted/ Recommended/ Approved	Survey Agency	MoP approval	BPC	Remarks
1.	Transmission Scheme for integration of Renewable Energy Zone (Phase-II) in Koppal-II (Phase-A) and Gadag-II (Phase- A) in Karnataka	Recommended to MoP for implementation through TBCB	RECPDC L	To be approved	To be done by MoP	The two schemes have been clubbed together for bidding purpose with implementation timeframe of 24 months and 36 months respectively
	Transmission Scheme for integration of Renewable Energy Zone (Phase-II) in Koppal-II (Phase-B)					

I/25992/2023

26

Sl. No.	Name of the Transmission Scheme	Noted/ Recommended/ Approved	Survey Agency	MoP approval	BPC	Remarks
2.	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D	Recommended for implementation through RTM route	Not applicable	Required		As the scheme was originally Notified by MoP for implementation through TBCB route, the scheme needed to be de-Notified by MoP. MoP vide Gazette dated 13.01.2023 has de-Notified the same. Suitable OM allocating the scheme to CTUIL for implementation through RTM route to be issued.

3 New Transmission Schemes submitted by CTUIL:

3.1 Transmission System for Evacuation of Power from RE Projects in Rajgarh 1000 MW Solar Energy Zone (SEZ) in Madhya Pradesh - Phase-II

3.1.1 Following transmission System for 2.5 GW REZ at Rajgarh (MP) had been evolved as part of 66.5 GW REZs in two phases:

- Ph-I of 1.5 GW: The scheme involves establishment of 3x500 MVA, 400/220 kV ICTs at Pachora PS & Pachora – Bhopal 400 kV D/c line (under implementation with SCoD of 30.11.2023) (out of which generation of 1 GW of Agar / Shajapur Solar Parks has been identified)
- Ph-II of 1 GW: As agreed in 4th NCT, the scheme involved augmentation of transformation capacity at Pachora PS by 2x500 MVA, 400/220 kV ICTs (4th & 5th) & Pachora – Shujalpur 400 kV D/c line and was required to be implemented with RE injection beyond 1.5 GW at Pachora PS.

3.1.2 On request of SECI to take up the implementation of Phase-II of the scheme without waiting for connectivity applications beyond 1.5 GW at Pachora PS, the Phase-II of the scheme was submitted by CTUIL for deliberation in the 10th NCT meeting held on 07.11.2022. In the meeting, CTUIL had informed that the scheme was to be reviewed as Shujalpur ICTs & downstream network of MPPTCL were found to be overloaded due to interconnection of Pachora - Shujalpur 400 kV D/c line for evacuation of power from RE Projects in Rajgarh. Accordingly, the scheme was deferred in the 10th NCT meeting with the direction to CTUIL to resolve the issues pertaining to MPPTCL's downstream system.

3.1.3 In view of above, a meeting was held on 01.12.2022 amongst CEA, CTUIL, MPPTCL and GRID-INDIA for finalizing above scheme, wherein, augmentation of transformation capacity at Pachora PS by 2x500 MVA, 400/220 kV ICTs (4th & 5th) & Pachora – Ujjain 400 kV D/c line with total cost of approx. Rs 497 crore was agreed for evacuation of 1 GW power from Pachora PS under Ph-II.

3.1.4 CTUIL informed that to fulfill 'N-1' reliability criteria at Pachora PS, 1x500 MVA (6th ICT) is also required. This would result in the total estimated cost to be greater than Rs 500 Cr. Accordingly, CTUIL will submit the scheme for consideration of NCT in the next meeting after discussion of the scheme in WRPC.

3.1.5 Members Noted the above.

3.2 Transmission system for evacuation of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III

c) Establishment of Khavda Pooling Station-3 (KPS3) in Khavda RE Park

3.12.3 During that meeting, the SPPDs noted the latest time-lines of the schemes and expressed no issues with the same. In line with above decision, CTU has already provided inputs towards RfP amendment of the subject schemes to the BPC.

3.12.4 After detailed deliberations, the time-line of implementation of the following schemes from 24 months to 21 months was ratified by NCT:

- a) Establishment of Khavda Pooling Station-2 (KPS2) in Khavda RE Park
- b) Transmission scheme for injection beyond 3 GW RE power at Khavda PS1 (KPS1)
- c) Establishment of Khavda Pooling Station-3 (KPS3) in Khavda RE Park

3.13 **Change in scope of the "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE Injection at Khavda PS under Phase-II- Part B"**

3.13.1 Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE Injection at Khavda PS under Phase-II- Part B is given below:

- Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line (250 km.)
- 2 Nos. of 765 kV line bays at Lakadia PS for Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line
- 240 MVar, 765 kV switchable line reactor for each circuit at each end of Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line)

3.13.2 M/s Adani had communicated non-availability of space for 2 Nos. of Switchable Line Reactors at Lakadia S/stn for Lakadia-Ahmedabad 765 kV D/c line. Accordingly, a meeting was convened by CEA on 28.11.2022 with participants from CTUIL and WRLDC to discuss the "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE Injection at Khavda PS under Phase-II- Part B". In the meeting, CTUIL had highlighted that the requirement of Switchable Line Reactors at Lakadia S/stn was for interim period. After the planned LILO of the Lakadia-Ahmedabad 765 kV D/c line at Halvad, only the reactors at Ahmedabad end would suffice. After deliberations in that meeting, it was agreed to delete the Switchable Line Reactors at Lakadia S/stn for Lakadia-Ahmedabad 765 kV D/c line and revised scope is given below:

- Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line (200 km.)
- 2 Nos. of 765 kV line bays at Lakadia PS for Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line
- 240 MVar, 765 kV switchable line reactor for each circuit at Ahmedabad end of Lakadia PS –Ahmedabad 765 kV D/c line)

3.13.3 In line with above, CTUIL has already provided inputs towards RfP amendment of the subject scheme to the BPC.

3.13.4 After detailed deliberations, NCT ratified the revised scope of “Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II Part B” as given below:

Original Scope	Revised Scope
• Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line (250 km.) • 2 Nos. of 765 kV line bays at Lakadia PS	• Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line (200 km.) • 2 Nos. of 765 kV line bays at Lakadia PS

for Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line • 240 MVar, 765 kV switchable line reactor for each circuit at each end of Lakadia PS –Ahmedabad 765 kV D/c line	for Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line • 240 MVar, 765 kV switchable line reactor for each circuit at Ahmedabad end of Lakadia PS –Ahmedabad 765 kV D/c line
--	---

3.14 **Modifications in the scheme “Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D”.**

3.14.1 In the 10th meeting of NCT held on 07.11.2022 w.r.t. Agenda Item 3.3 (Implementation modalities of Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D), following was agreed:

- The mode of implementation for the “Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D” would be changed from TBCB to RTM.
- Further, as implementation of all the transmission packages proposed for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda RE park under Phase-II (Part A to Part D) needs to be taken up in similar timeframe, accordingly, the implementing agency under RTM would coordinate with the BPC/SPV of Khavda Phase II (Part A – C) schemes to match the commissioning timeframe. This would entail the following:
 - i. Denotification of the scheme “Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D” that was issued by MoP vide Gazette Notification dated 25.09.2020.
 - ii. Allocation of the aforesaid scheme to CTUIL for implementation through RTM route by the respective asset owners i.e.
 - a. LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor alongwith reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL.
 - b. Bay upgradation work at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to Powergrid.

3.14.2 CTUIL mentioned that M/s TPGL vide letter dated 20.12.2022 had informed that they are also the owner of 2 Nos. 400 kV line bays at Pirana (PG) S/s. Accordingly, implementation agency for bay work at Pirana (PG) needs to be revised as given below:

Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme (Original)	Scope of the Transmission Scheme (Revised)
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor alongwith reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor alongwith reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) and at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL
2.	Bay upgradation work at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to Powergrid.	

3.14.3 NCT approved the above.

3.15 **Modification in scope of work of “Transmission Network Expansion in Gujarat to increase ATC from ISTS: Part C” scheme**

3.15.1 The Transmission Network Expansion in Gujarat to increase its ATC from ISTS: Part C scheme was agreed in the 7th NCT meeting held on 03.12.2021 with following scope of work:

Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme	Capacity /km
1	Augmentation of transformation capacity at 765/400 kV ICT Banaskantha S/S by 1x1500 MVA	765/400 kV, 1500 MVA ICT: 1 No. 765 kV ICT bay – 1 No. 400 kV ICT bay– 1 No.
2	Banaskantha -Sankhari 400 kV 2 nd D/c line	Route length: 26 km 400 kV line bays- 4 Nos. (2 Nos. at Banaskantha and 2 Nos. at Sankhari)

Summary of the deliberations of the 11th NCT meeting held on 28.12.2022 and 17.01.2023.

(1) ISTS schemes costing less than Rs100 Crs approved by NCT:

Sl. No.	Name of Transmission Scheme	Implementa- tion Mode	Implementati on timeframe	Allocated to	Estimated Cost (Rs Crs)
1.	ICT Augmentation associated with integration of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III	RTM route by TSP of Navsari (new) S/s i.e. POWERG RID	In matching timeframe of Transmission system for evacuation of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III Package B	POWERG RID	58.52
2.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part B1	Under RTM to the owner of Gwalior-Satna 765 kV line i.e. Powergrid	In matching timeframe of Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part B	POWERG RID	19
3.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part C1	RTM route by POWER GRID, the TSP of Jabalpur - Orai 765 kV S/c line.	In matching timeframe of Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part C	POWERG RID	0.5

(2) ISTS Communication schemes approved by NCT under RTM route:

I/25992/2023

Sl. No.	Name of Scheme & Implementation timeframe	Broad Scope	Bid Process Coordinator
		210 km ^s Line capacity shall be 2500 MVA per circuit at Nominal voltage * with minimum capacity of 2100 MVA on each circuit at Nominal voltage (Detailed scope as approved by 11th NCT and subsequent amendments, if any)	
7)	Transmission scheme for drawal of 4000 MW power by MPSEZ UTILITIES LIMITED (MUL)	(1) Establishment of 4x1500 MVA, 765/400 kV Navinal(Mundra) S/s (GIS) with 2x330 MVAR, 765 kV & 1x125 MVAR, 420 kV bus reactors (2) LILO of Bhuj-II – Lakadia 765 kV D/c line at Navinal(Mundra) (GIS) S/s with associated bays at Navinal(Mundra) (GIS) S/s (3) Installation of 1x330 MVAR switchable line reactor on each ckt at Navinal end of Lakadia – Navinal 765 kV D/c line (formed after above LILO) (Detailed scope as approved by 11th NCT and subsequent amendments, if any)	To be decided by MoP.

5. Modification in the scope of works of Transmission Scheme approved/ recommended in previous meetings of NCT:

- (i). The time-line of implementation of the following schemes may be reduced from **24 months to 21 months**:
- Establishment of Khavda Pooling Station-2 (KPS2) in Khavda RE Park
 - Transmission scheme for injection beyond 3 GW RE power at Khavda PS1 (KPS1)
 - Establishment of Khavda Pooling Station-3 (KPS3) in Khavda RE Park

I/25992/2023

33

- (ii). Change in scope of the "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE Injection at Khavda PS under Phase-II- Part B"

ii.1 Revised scope of "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II Part B" as given below:

- Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line (200 km.)
- 2 Nos. of 765 kV line bays at Lakadia PS for Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line
- 240 MVar, 765 kV switchable line reactor for each circuit at Ahmedabad end of Lakadia PS – Ahmedabad 765 kV D/c line)

- (iii). Modifications in the scheme "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D".

S.No.	Scope of the Transmission Scheme (Original)	Scope of the Transmission Scheme (Revised)
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor alongwith reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor alongwith reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) and at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL
2.	Bay upgradation work at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to Powergrid.	

- (iv). Transmission system for evacuation of power from REZ in Rajasthan (20GW) under Phase-III Part C1:

Sl.Nos.	Original Scope	Revised Scope
4.	Establishment of 2x1500 MVA, 765/400kV & 2x500 MVA, 400/220 kV pooling station at Ramgarh along with 2x240 MVar (765kV) Bus Reactor & 2x125 MVar (420kV) Bus reactor <u>Capacity</u> 765/400 kV 1500 MVA ICTs: 2 Nos. (7x500 MVA including one spare unit)	Establishment of 2x1500 MVA, 765/400kV & 2x500 MVA 400/220 kV pooling station at Ramgarh along with 2x240 MVar (765kV) Bus Reactor & 2x125 MVar (420kV) Bus Reactor, ± 2x300MVar STATCOM along with MSC+MSR <u>Capacity</u> 765/400 kV 1500 MVA ICTs: 2 Nos. (7x500 MVA including one spare unit)

34

सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में)
(भारत सरकार का उद्यम)

CENTRAL TRANSMISSION UTILITY OF INDIA LTD.

(A wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)
(A Government of India Enterprise)

Ref. No.: CTUIL/OM/09/Rev

16th February 2023

Director (Projects) Power Grid Corporation of India Ltd., Saudamini, Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon- 122 001	Shri Chetan Bundela Torrent Power Grid Ltd. 'SAMANVAY', 600, Topovan, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat
CEO POWERGRID Bikaner Transmission System Ltd. C/o ED (TBCB) Power Grid Corporation of India Ltd., Saudamini, Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon- 122 001	Shri Lonkedra Singh Ranawat Head – Regulatory INDIGRID Unit No. 101, 1 st Floor, Windor, Village Kolekalyan Off CST Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400 098.

Sub: Implementation of ISTS Transmission Schemes approved by NCT in its 11th meeting held on 28.12.2022 and 17.01.2023 under Regulated Tariff Mechanism (RTM)

NCT vide letter dated 16.02.2023 has awarded the following ISTS Transmission Scheme for its implementation under RTM mode by implementing agencies as indicated in the table below:

Sl. No.	Transmission Scheme	Implementing Agency
I. Approved ISTS Schemes:		
1.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part A	POWERGRID
2.	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D:	TPGL
3.	ICT Augmentation at Navsari (New) associated with integration of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III.	POWERGRID
4.	Western Region Expansion Scheme-XXXIII (WRES-XXXIII): Part B1	POWERGRID
5.	Western Region Expansion Scheme-XXXIII (WRES-XXXIII): Part C1	POWERGRID
II. Modification in the already approved schemes:		
1.	Transmission Network Expansion in Gujarat to increase ATC from ISTS: Part C	POWERGRID
2.	Transmission system for evacuation of power from Rajasthan REZ Ph IV (Part-1) (Bikaner Complex) Part-E (iii) Augmentation with 5x500MVA, 400/220 kV ICTs at Bikaner-II PS:	POWERGRID Bikaner

Sl. No.	Transmission Scheme	Implementing Agency
		Transmission System Ltd. (PBTSL)
III. Communication schemes approved by NCT:		
1.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Jalandhar (PG) – Kurukshetra (PG) line which is to be LILOed at 400 kV Dhanansu (PSTCL) (229 km)	POWERGRID
2.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Koldam – Ludhiana (PG) line which is to be LILOed at 400 kV Ropar (PSTCL) (150 kms)	INDIGRID
3.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Agra – Ballabgarh line (181km) - Replacement	POWERGRID
4.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Kishenpur – Wagoora line (183 km) - Replacement	POWERGRID
5.	Redundant communication system for Bhinmal (PG) and Kankroli (PG) ISTS stations.	POWERGRID
6.	Supply and Installation of OPGW on existing 220kV Anta (NTPC) – Bhilwara line (187 km)	POWERGRID

Copy of NCT letter dated 16.02.2023 in this regard is enclosed at **Annexure-I**. The detailed scope of work along with implementation time frame for the above transmission scheme is as per the letter enclosed.

The respective implementing agencies shall enter into a concession agreement with CTUIL for implementation of aforementioned Transmission Scheme. However, pending finalization of Concession Agreement, it is requested to initiate necessary actions for implementation of the aforementioned Transmission Schemes.

The earlier letter ref. no. CTUIL/OM/09 dated 14.02.2023 issued on the above subject stands withdrawn.

This is for your kind information and necessary action, please.

Yours faithfully,


16/02/23
(Jasbir Singh)
Chief General Manager

Encl: as stated.



भारत सरकार
 Government of India
 विद्युत मंत्रालय
 Ministry of Power
 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
 Central Electricity Authority
 विद्युत प्रणाली योजना एवं मूल्यांकन प्रभाग-II
 Power System Planning & Appraisal Division-II

सेवा में / To

Chief Operating Officer, CTUIL
 Saudamini, Plot No. 2,
 Sector-29, Gurgaon-122001

विषय/Subject: Implementation of ISTS Transmission Schemes approved by NCT in its 11th meeting held on 28.12.2022 and 17.01.2023- regarding

महोदय/Sir,

The undersigned is directed to inform that NCT has approved implementation of the following ISTS Transmission Schemes in its 11th meeting held on 28.12.2022 and 17.01.2023, in line with MoP office order dated 28.10.2021, to be implemented through Regulated Tariff Mechanism (RTM) route by agency as indicated below:

I. APPROVED ISTS SCHEMES:

1. Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part A

Sl. Nos.	Transmission Scheme	Scope	Implementing Agency
1.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part A	i) Creation of 220 kV level at 765/400 kV Jabalpur PS with installation of 2x500 MVA, 400/220 kV ICTs along with associated ICT bays, ii) 4 Nos. of 220 kV line bays at Jabalpur PS for LILO of Narsinghpur - Jabalpur (MP) 220 kV D/c line at Jabalpur Pool	POWERGRID

Detailed scope of the scheme is given below:

<i>Sl.</i>	<i>Scope of the Transmission Scheme</i>	<i>Capacity /km</i>
1.	Creation of 220 kV level at 765/400 kV Jabalpur PS with installation of 2x500 MVA, 400/220 kV ICTs along with associated ICT bays	400/220 kV, 500 MVA ICT – 2 Nos. 400 kV ICT bays – 2 Nos. 220 kV ICT bays – 2 Nos.
2.	4 Nos. of 220 kV line bays at Jabalpur PS for LILO of Narsinghpur - Jabalpur (MP) 220 kV D/c line at Jabalpur Pool	220 kV line bays – 4 Nos.

Estimated Cost: Rs. 126.09 Crs.

Implementing Agency: POWERGRID.

Implementation timeframe: 18 months from date of allocation

2. Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D:

Sl. Nos.	Scope of the Transmission Scheme
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS alongwith reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section
2.	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos@

@ The current rating of existing bays at Pirana (PG) & Pirana(T) is 2000 A. 04 Nos. 400 kV line bays upgradation includes 02 bays upgradation at Pirana (PG) and 02 bays upgradation at Pirana (T). Upgradation at Pirana (T) shall also include upgradation of 400 kV Bus coupler bay and 400 kV Transfer bus coupler bay along with upgradation of bus bar.

Note:

- Transmission system for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda is being taken up under Phase-I. Phase-II RE scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda needs to be taken up for evacuation requirement beyond 3 GW from Khavda RE park.
- Implementation of all the transmission packages proposed for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda RE park under Phase-II (Part A to Part D) needs to be taken up in similar timeframe.

- iii) The switching scheme of existing 400 kV Pirana (T) S/S is Double Main and Transfer (DMT) Scheme and current rating of existing Bus Coupler bay and Transfer Bus Coupler bay is 2000 A. With upgradation of line bays to 3150 A (to suit the re-conductoring with Twin HTLS conductor), existing 400 kV Bus Coupler bay and Transfer Bus Coupler bay (with associated Bus Bar) shall also be upgraded to 3150 A by the TSP.

The scheme has already been de-notified vide Gazette Notification No. 221 dated 13.01.2023.

Estimated cost of the scheme: Rs.221 Crs (as per CTUIL email dated 10.02.2023)

Implementing agency: Torrent Power Grid Limited (TPGL)

Implementation timeframe: In matching the commissioning timeframe of Khavda Phase-II (Part A to C). The implementing agency under RTM would coordinate with the BPC/SPV of Khavda Phase II (Part A – C) schemes to match the commissioning timeframe.

3. ICT Augmentation at Navsari (New) associated with integration of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III:

Sl. Nos.	Name of Transmission Scheme	Implementation Mode
1.	ICT Augmentation at Navsari (New) S/s associated with integration of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III	RTM route by TSP of Navsari (new) S/stn i.e. POWERGRID

Detailed scope of the scheme:

S.No.	Scope of the Transmission Scheme	Capacity / line length km
1.	Augmentation of transformation capacity at Navsari (New) 765/400 kV S/s by 1x1500 MVA (ICT-IV)	765/400 kV, 1500 MVA ICT – 1 Nos. 765 kV ICT bay – Not required as ICT to be terminated in existing bay 400 kV ICT bay – 1 Nos. (GIS)

Note: Bay(s) as may be required for completion of diameter (GIS) in one-and-half breaker scheme, shall also be executed by the TSP.

Estimated Cost: Rs. 58.52 Crores.

Implementing Agency: POWERGRID.

Implementation timeframe: In matching timeframe of Transmission system for evacuation of additional 7 GW RE power from Khavda RE park under Phase-III Part B

4. Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part B1

Sl. No.	Name of Transmission Scheme	Implementation Mode
1.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part B1	Under RTM to the owner of Gwalior-Satna 765 kV line i.e. Powergrid

Detailed scope of the scheme:

Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme	Capacity /km
1.	Conversion of 1x240 MVar, 765 kV Fixed line reactor at Gwalior end to Switchable line reactor (with NGR bypass arrangement) along with implementation of Inter-tripping scheme (for tripping of the switchable shunt reactor at Gwalior end along with the main line breaker)	- Switching equipment for 765 kV line reactor (with NGR bypass arrangement) – 1 No. - Implementation of inter-tripping scheme for the switchable line reactor at Gwalior end

Estimated Cost: Rs 19 Crs

Implementing Agency: POWERGRID.

Implementation timeframe: In matching timeframe of Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part B

5. Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part C1

Sl. Nos.	Name of Transmission Scheme	Implementation Mode
1.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part C1	RTM route to POWERGRID, the TSP of Jabalpur - Orai 765 kV S/c line.

Detailed scope of the scheme:

Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme	Capacity /km
---------	----------------------------------	--------------

1.	Conversion of 1x330 MVAR, 765 kV Fixed line reactor at Orai end of Ishanagar – Orai 765 kV line [formed after LILO of one circuit of Jabalpur - Orai 765 kV D/c line at Ishanagar (New) S/s] to Bus reactor at Orai S/s.	Shifting of 330 MVAR, 765 kV Line reactor of Orai-Jabalpur line at Orai end and installing the same as Bus Reactor in existing bay (GIS) at Orai.
----	--	---

Estimated cost: Rs. 0.5 Crore

Implementing Agency: POWERGRID

Implementation timeframe: In matching timeframe of Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part C.

I. MODIFICATION IN THE ALREADY APPROVED SCHEMES:

- (1) Modification in the “**Transmission Network Expansion in Gujarat to increase ATC from ISTS: Part C**” has been approved in the 11th meeting of NCT. The modified scope is as given below:

Sl. No.	Original Scope of the Transmission Scheme	Modified scope of the transmission scheme
1	Augmentation of transformation capacity at 765/400 kV ICT Banaskantha S/S by 1x1500MVA 765/400 kV, 1500 MVA ICT: 1 Nos. 765 kV ICT bay – 1 No. 400 kV ICT bay– 1 No.	Augmentation of transformation capacity at 765/400 kV ICT Banaskantha S/S by 1x1500 MVA 765/400 kV, 1500 MVA ICT: 1 Nos. 765 kV ICT bay – 1 No. 400 kV ICT bay– 1 No.
2	Banaskantha -Sankhari 400 kV 2 nd D/c line (26 km) Line Length : 26 km 400 kV line bays- 4 Nos. (2 Nos. at Banaskantha and 2 Nos. at Sankhari)	Banaskantha – Sankhari section of Banaskantha – Prantij 400 kV D/c line (Twin AL59 Moose equivalent) Route Length : 26 km 400 kV line bays- 2 Nos. (at Banaskantha)

Implementation Time-frame: Matching with establishment of Prantij 400/220 kV S/s and Prantij - Sankhari section of Banaskantha – Prantij 400 kV D/c line (presently expected by March, 2025)

Implementing Agency: POWERGRID

(2) Transmission system for evacuation of power from Rajasthan REZ Ph IV (Part-1) (Bikaner Complex) Part-E

The scheme inter-alia includes augmentation with 5x500 MVA, 400/220 kV ICTs at Bikaner-II PS:

- **Augmentation with 5x500 MVA, 400/220 kV ICTs at Bikaner-II PS:**

CEA vide letter dated 15.11.22 has allocated the implementation of above scheme to POWERGRID under RTM.

CTUIL vide its mail dated 01.12.2022 has informed that Bikaner-II PS is under implementation by POWERGRID Bikaner Transmission System Ltd. (PBTSL) [100% subsidiary of POWERGRID] under TBCB.

Accordingly, the implementing agency for augmentation with 5x500 MVA, 400/220 kV ICTs at Bikaner-II PS is POWERGRID Bikaner Transmission System Ltd. (PBTSL).

II. COMMUNICATION SCHEMES APPROVED BY NCT:

Sl. Nos.	Name of Transmission Scheme	Implementation Mode	Implementation timeframe	Allocated to	Estimated Cost (Rs Crs)
1.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Jalandhar (PG) – Kurukshetra (PG) line which is to be LILOed at 400 kV Dhanansu (PSTCL) (229 km)	RTM	24 months	POWER GRID	10.3
2.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Koldam (Indigrid) – Ludhiana (PG) line which is to be LILOed at 400 kV Ropar (PSTCL) (150 kms)	RTM	18 months	INDIGRID	6.7
3.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Agra – Ballabgarh line (181 km) - Replacement	RTM	18 months	POWER GRID	9.05

I/26294/2023

Sl. Nos.	Name of Transmission Scheme	Implementation Mode	Implementation timeframe	Allocated to	Estimated Cost (Rs Crs)
4.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Kishenpur – Wagoora line (183 km) - Replacement	RTM	18 months	POWER GRID	9.15
5.	Redundant communication System for Bhinmal (PG) and Kankroli (PG) ISTS stations	RTM	18 months	POWER GRID	2.55
6.	Supply and Installation of OPGW on existing 220 kV Anta (NTPC) – Bhilwara line (187 km)	RTM	18 months	POWER GRID	9.35

The above schemes are awarded to CTUIL for implementation under RTM route. CTUIL is requested to take necessary action for entering into a concession agreement with the respective agency for implementation of the above schemes.

The letter dated 14.02.2023 on the above subject stands withdrawn.

Yours faithfully



16.02.2023

(ईशान शरण/Ishan Sharan)

मुख्य अभियंता /Chief Engineer &
Member Secretary (NCT)

Copy to:

Joint Secretary (Trans), Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI**

Petition No. 217/TL/2023

Coram:

Shri Jishnu Barua, Chairperson

Shri I.S. Jha, Member

Shri Arun Goyal, Member

Shri P.K. Singh, Member

Date of Order: 31st October, 2023

In the matter of

Petition under Section 18 of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 19 of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009 seeking an amendment of Transmission Licence No.2/Transmission/ CERC granted by this Commission to the Petitioner by its order dated 16.5.2007 and further amended by its order dated 3.11.2010 (read with corrigendum dated 1.12.2010).

And

In the matter of

Torrent Power Grid Limited,
"Samanvay", 600, Tapovan,
Ambawadi, Ahmedabad- 380015

.....Petitioner

Vs.

1. Torrent Power Limited,
"Samanvay", 600, Tapovan,
Ambawadi, Ahmedabad– 380015, Gujarat

2. Central Transmission Utility of India Limited,
First Floor, Saudamini, Plot No. 2, Sector 29,
Near IFFCO Chowk Metro Station,
Gurgaon, Haryana - 122001.

3. Western Regional Power Committee,
F-3, MIDC Area, Marol,
Opp. SEEPZ, Central Road,
Andheri (East), Mumbai – 400093

4. PTC India Limited,
2nd Floor, NBCC Tower, 15,
Bhikaji Cama Place,
New Delhi – 110066



5. M.P Power Management Company Limited,
Shakti Bhavan, Vidyut Nagar,
Bhopal, Madhya Pradesh.

6. Gujarat Urja Vikas Nigam Limited,
Sardar Patel Vidyut,
Bhavan, Race Course,
Vadodara-390007, Gujarat

7. Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited,
"Prakashgad", Plot No. G-9,
Anant Kanekar Marg,
Bandra (East), Mumbai- 400 051

8.Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited,
P.O. Sundernagar, Dangania,
Raipur- 492013.

9. Goa Electricity Department, Government of Goa,
3rd Floor, Vidyut Bhavan,
Panaji, - 40300, Goa

10. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited,
1st & 2nd Floor, Vidyut Bhavan, Silvassa,
U.T. of Dadra & Nagar Haveli-396230

11. Central Electricity Authority,
Sewa Bhawan, Sector-1,
R.K. Puram,
New Delhi-110066

...Respondents

Parties Present:

Shri Gaurav Dudeja, Advocate, TPGL
Shri Dhruval Singh, Advocate, TPGL
Shri Mihir Thakkar, TPGL
Shri Jignesh Langalia, TPL
Shri Shashank Shekhar, CTUIL
Shri Ranjeet Singh, CTUIL
Shri Lashit Sharma, CTUIL

ORDER

The Petitioner, Torrent Power Grid Limited (hereinafter referred to as "TPGL"),
has filed the present Petition for seeking an amendment of the inter-State
Transmission Licence i.e. Licence No.2/Transmission/CERC dated 16.5.2007 as



amended by order dated 3.11.2020 read with a corrigendum dated 1.12.2010, granted to the Petitioner by this Commission for incorporating the elements/changes proposed below, in the transmission licence granted to the Petitioner:

(a) Transmission Lines:

Existing Transmission Lines Elements		Proposed Transmission Lines Elements
A-(i)	LILO of Gandhar - Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard.	LILO of Gandhar - Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard.
A-(ii)	SUGEN CCPP Akhakhhol – Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C line (Twin Moose) 6 KM)	SUGEN CCPP Akhakhhol – Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C (two ckts with Twin Moose + two circuits with Twin HTLS) line 6 KM) along with OPGW.
A-(iii)	-	<u>D/c LILO of Pirana (PG) – Pirana (TPL) at 765/400 kV Ahmedabad S/S through 400 kV M/C 60 KM line with twin HTLS conductor along with OPGW.</u>

(b) Sub-station work:

S. No.	Existing Substation Elements	Proposed Substation Elements
B(i)	2 Nos. 400 kV Line bays (2000 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation	2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation with requisite FOTE at Pirana (PG) 400 kV line bays.

2. The Petitioner has made the following prayers:

“(a) Amend/alter the Transmission Licence granted to the Petitioner by incorporating the proposed elements/ changes in the scope of work in the Transmission Licence No. 2/Transmission/CERC dated 16.05.2007 and amended by order dated 03.11.2010 (read with corrigendum dated 01.12.2010); and

(b) Condone any inadvertent omissions/ errors/ shortcomings and permit the Petitioner to add/ modify/ change/ alter this filing and make further submissions as may be required at a future date.

(c) Pass any other orders/directions that the Hon'ble Commission may deem fit and appropriate.”



Background

3. Torrent Power Grid Limited (TPGL/ Petitioner) is a joint venture of Torrent Power Limited (TPL) with 74% and Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL) with 26% equity participation. By order dated 16.5.2007, Torrent Power Grid Limited was granted a transmission licence for the construction, maintenance and operation of the transmission system associated with the evacuation of power from 1100 MW SUGEN Combined Cycle Power Project (Sugen CCGP) at Akhakhhol in the State of Gujarat consisting of the following elements.

A. Transmission lines

Sl. No.	Transmission lines/facility	Approx. line length (kms)
1.	LILO of Gandhar – Vapi 400 kV line at Sugan CPP switchyard	26
2.	Sugen CCGP Akhakhhol – Pirana 400 kV D/C line (To be built in two phases): (a) From Sugan to a point near Gandhar where LILO of the circuit of existing Gandhar-Dehgam 400 kV D/C line at Sugan will be done. (b) Extension of this line to Pirana and opening of LILO of Gandhar – Dehgam line near Gandhar	222

B. Sub-station works

S. No.	Sub-station works
(a)	2 nos. 400 kV line bays at Pirana (PG) 400/220 kV (new) sub-station.
(b)	2 nos. 50 MVAR line reactor at Pirana (PG) 400/220 kV (new) sub-station.

4. Subsequently, the transmission licence granted to the Petitioner was amended vide orders dated 3.11.2010 read with a corrigendum dated 1.12.2010 in Petition No.



10/2010. The revised scope of work of the scheme as approved by the Commission was as under:

"a. Transmission Lines

(i) LILO of Gandhar-Vapi 400 kV S/C line at Sugan CPP switchyard – 26 Kms

(ii) Sugan Pirana (PG) 400 kV D/C (in two phases): [400 kV D/C line 222 kms. and M/C line 6 kms.] as under:

(a) From Sugan to a point near Gandhar where LILO of the circuit where LILO of the circuit of existing Gandhar-Dehgam 400 kV D/C line at Sugan will be done.

(b) Extension of the line to Pirana (PG) with LILO of Pirana (TPL) sub-station and opening of LILO of Gandhar-Dehgam line near Gandhar as well as restoration of Gandhar-Dehgam line to its original configuration.

b. Sub-station Work

(i) 2 Nos. 400 kV line bays at Pirana (PG) 400/200 KV (New) Sub-station."

5. The project was put into commercial operation in three phases on 1.3.2009 (Phase I), 26.3.2010 (Phase II) and 1.4.2011 (Phase III).

Submissions of the Petitioner

6. The Petitioner, has mainly submitted as under:

(a) The Ministry of Power, vide its Notification dated 23.9.2020, notified the 'Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II-Part D' ("Scheme") to be implemented under the Tariff Based Competitive Bidding ("TBCB") which forms a part of the planned transmission for evacuation of the 4.5 GW RE injection from Khavda complex (Part A to Part D).

(b) Since, the above Scheme includes reconductoring of part of the Petitioner's Project i.e., Pirana (PG)-Pirana (T) line, in the 10th meeting of the National Committee on Transmission ("NCT") dated 7.11.2022, it was agreed that the mode of implementation of the said Scheme would be changed from



TBCB to Regulated Tariff Mechanism (RTM) which would entail de-notifying the said Scheme by the Ministry of Power.

(c) Subsequently, vide Gazette Notification dated 13.1.2023, the Ministry of Power de-notified the said scheme under the TBCB route.

(d) NCT, in its 11th meeting held in two sittings dated 28.12.2022 and 17.1.2023, approved the said Scheme with the revised scope of works to be implemented by the Petitioner in RTM mode.

(e) Subsequently, the Central Transmission Utility of India (CTUIL) vide its letter dated 16.2.2023, conveyed approval of NCT for the said Scheme to be implemented by the Petitioner under the RTM mode.

(f) With respect to the scope of the Scheme, the bays at Pirana (TPL) have been established and operated by Respondent No. 1 (TPL) and therefore, the proposed bays upgradation work with requisite FOTE is required to be carried out by Respondent No. 1, TPL and the same has also been informed to the TPL.

(g) In the above background, the Petitioner is required to implement the said Scheme, and therefore amendment of the Transmission Licence by incorporating the proposed elements/ changes in the Transmission Licence has become necessary. As per Section 18 of the Electricity Act, 2003 read with the relevant provisions of the Transmission Licence Regulations, this Commission has the power to make alterations and amendments in view of the public interest.

Hearing Dated 15.9.2023

7. During the course of the hearing, learned counsel for the Petitioner pointed out that the scope of works to be undertaken by the Petitioner includes Bay upgradation works for the 2 Nos. of bays at Pirana (T) which have been established



and operated by Respondent No.1, Torrent Power Limited. The representative of Respondent No.1, TPL, affirmed and submitted that the Pirana (T) sub-station forms part of the distribution system of Respondent No. 1 and as such, the Respondent has no objection to undertaking the upgradation work of the 2 Nos. of 400 kV line bays at Pirana (TPL) by TPL or by TPGL. The representative of CTUIL submitted that the scope of work under the scheme as approved by the NCT includes LILO of Pirana (PG)-Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS, reconductoring of Pirana (PG)- Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both mainline and LILO section, and bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) section, and bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) sub-stations (400 kV line bays (4 Nos.)). The representative of CTUIL further submitted that at the time when the scope of work under the aforesaid Scheme was decided, it was not known that the bays at Pirana (T) section sub-station were part of Respondent No.1's distribution network. However, in the event, that the upgradation works of bays at Pirana (T) are to be undertaken by Respondent No.1, it would require de-linking the said works from the balance scope of works under the present scheme awarded to the Petitioner.

8. The Petitioner, vide Record of Proceedings for the hearing dated 15.9.2023, was directed to submit (i) an additional affidavit to include the upgradation work relating to the bays at Pirana (T), (ii) Whether the Petitioner has complied with all the procedural formalities relating to the amendment of the transmission licence. In this regard, the Petitioner vide its affidavit dated 26.9.2023, has confirmed that it shall undertake the above-stated scope of work including the upgradation of work relating to the bays at Pirana (T). The Petitioner has further submitted that it has complied



with all the procedural formalities relating to the amendment of the transmission licence specified in the Transmission Licence Regulations. and confirmed to incorporate the amendments to its transmission license as under:

(a) Transmission Lines:

Existing Transmission Lines Elements		Proposed Transmission Lines Elements
A-(i)	LILO of Gandhar - Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard.	LILO of Gandhar - Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard.
A-(ii)	SUGEN CCPP Akhakhhol – Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C line (Twin Moose) 6 KM)	SUGEN CCPP Akhakhhol – Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. [400 kV D/C line 222 KM + M/C (two ckts with Twin Moose plus two circuits with Twin HTLS) line 6 KM) along with OPGW.
A-(iii)	-	<u>D/c LILO of Pirana (PG) – Pirana (TPL) at 765/400 kV Ahmedabad S/S through 400 kV M/C 60 KM line with twin HTLS conductor along with OPGW.</u>

(b) Sub-station work:

S. No.	Existing Substation Elements	Proposed Substation Elements
B(i)	2 Nos. 400 kV Line bays (2000 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation	2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation and 2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (T) 400/220 kV substation with requisite FOTE.@

@Upgradation at Pirana (T) shall also include the upgradation of 400 kV Bus coupler bays and 400 kV Transfer bus coupler bay along with the upgradation of bus bar by TPGL.



9. The Petitioner, vide Record of Proceedings for the hearing dated 15.9.2023, was further directed to clarify (i) whether the implementation timeframe of the transmission scheme covered under the present scheme as it required to be in the matching timeframe of Khavda Phase-II (Part A to C) and timeframe for its scope of work, and (ii) What steps are being taken by the Petitioner as an RTM licensee to ensure competitive bidding of packages to be awarded under the instant scheme?. The Petitioner vide its affidavit dated 6.10.2023, has submitted as under:

(a) With regard to the implementation schedule for the transmission scheme, the Petitioner has submitted that at present, the implementation timeframe has been considered similar to that of Khavda Phase-II (Part A to C). Further, as communicated by CTUIL, the SCOD of Part A of the transmission scheme is 28.3.2025, and that of Part B & Part C of the transmission scheme is 21.3.2025. Accordingly, the Petitioner has also kept its SCOD of Part D of the transmission scheme as of March 2025.

(b) The Petitioner has further submitted that to ensure competitive bidding for the packages to be awarded under the current Scheme, the Petitioner has implemented a comprehensive process for the procurement of supplies and services with necessary checks and balances in the process to ensure competitive prices and timely completion of the projects.

10. CTUIL, vide Record of Proceedings for the hearing dated 15.9.2023, was directed to clarify the implementation time frame of the Khavda Phase-II (Parts A to C) along with the details of the implementing agency. CTUIL vide its affidavit dated 26.9.2023 has submitted as under:



(a) The transmission scheme for evacuation of the 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II includes Parts- A, B, C & D and all of them have been planned to be taken up in a similar timeframe. The scheduled COD for Phase-II (Part A to Part D) schemes have been specified as 24 months from the date of SPV's acquisition/NCT allocation in order to ensure the development of the entire scheme in a matching timeframe.

(b) The SPV of the Part A scheme was acquired by the Khavda II-A Transmission Limited (a subsidiary of Adani) on 28.3.2023, and those of Part B & Part C schemes were acquired by the Khavda II-B Transmission Limited & Khavda II-C Transmission Limited (subsidiaries of POWERGRID) respectively, on 21.3.2023. Accordingly, the SCOD of the Part A scheme is 28.3.2025, and the Part B & Part C scheme is 21.3.2025.

(c) The details of the implementation time frame of Khavda Phase-II (Parts A to C) and the implementing agency are as under:

Details of Khavda Phase-II (Parts A to C): Implementation time frame & Implementing agency

Sl. No.	Name of the transmission scheme	Implementing Agency	SCOD
1.	Transmission scheme for evacuation of 4.5GW RE injection at Khavda PS under Phase II Part A 1. KPS2 (GIS) – Lakadia 765 kV D/C line 2. 330 MVar switchable line reactors at KPS2 end of KPS2 (GIS) – Lakadia 765 kV D/C line a. 330 MVar, 765 kV switchable line reactor- 2 nos. b. Switching equipment for 765 kV line reactor- 2 nos. c. 1x110 MVar spare bus reactor available at KPS2 (GIS) to be used as spare. 3. 2 nos. of 765 kV line bays each at Lakadia PS & KPS2 (GIS) for Khavda PS2 (GIS) – Lakadia PS 765 kV D/c line. a. 765 kV line bays (GIS) – 2 Nos. (for KPS2 end) b. 765 kV line bays (AIS) – 2 Nos. (for Lakadia end)	Khavda II-A Transmission Ltd (Subsidiary of Adani)	28.3.2025 [24 months from effective date i.e., 28.3.2023]



2.	Transmission scheme for evacuation of 4.5GW RE injection at Khavda PS under Phase II Part B 1. Lakadia PS – Ahmedabad 765kV D/c line 2. 2 nos. of 765kV line bays at Lakadia PS for Lakadia PS – Ahmedabad 765kV D/c line. a. 765 kV line bays – 2 nos. 3. 240MVA, 765kV switchable line reactor for each circuit at Ahmedabad end of Lakadia PS – Ahmedabad 765kV D/c line. a. 1x240 MVA, 765kV switchable line reactor – 2 nos. (for each circuit at Ahmedabad end of Lakadia PS – Ahmedabad 765kV D/c line) b. Switching equipment for 765 kV line reactor – 2 nos. c. 1x80 MVA spare reactor – 1no. (for Ahmedabad end)	Khavda II-B Transmission Ltd (Subsidiary of POWERGRID)	21.03.2025 [24 months from effective date i.e., 21.03.2023]
3.	Transmission scheme for evacuation of 4.5GW RE injection at Khavda PS under Phase II Part C 1. Establishment of 3x1500MVA, 765/400 kV Ahmedabad S/s with 1x330MVAR 765kV bus reactor and 1x125MVAR 420 kV bus reactor. a. 765/400kV, 3x1500MVA ICT (10x500MVA, including 01 spare unit) b. 765kV ICT bays-03 c. 400kV ICT bays-03 d. 765kV line bays-04 (02 for Lakadia-Ahmedabad 765kV D/c; 02 for Ahmedabad-South Gujarat) e. 400kV line bays - 04 (LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400kV D/c line at Ahmedabad S/s) f. 1x330MVA, 765kV bus reactor-1 (4x110MVA including 01 spare unit) g. 765kV reactor bays - 1 h. 125MVA, 420kV reactor-1 i. 400kV Reactor bays – 1 2. Ahmedabad – South Gujarat/ Navsari (new) 765 kV D/c line with 240 MVA switchable line reactor at both ends. 3. 2 nos. of 765 kV line bays at South Gujarat/Navsari (new) end for Ahmedabad – South Gujarat/Navsari (new) 765 kV D/c line a. 765kV line bays – 2 nos. (GIS) 4. 240 MVA switchable line reactor at both ends of Ahmedabad – South Gujarat/Navsari (new) 765 kV D/c line. a. 1x240 MVA, 765kV switchable	Khavda II-C Transmission Ltd (Subsidiary of POWERGRID)	21.03.2025 [24 months from effective date i.e., 21.03.2023]



	reactor-4 b. Switching equipment for 765 kV line reactor-4		
--	--	--	--

(d) The Commission, *vide* order dated 31.7.2023 in Petition No. 128/TL/2023 had directed CTUIL to amend the TSAs for Parts-A to D to align the SCOD of all the interlinked packages, and the same is under process.

Hearing dated 9.10.2023

11. During the course of the hearing on 9.10.2023, the Commission observed that the Petitioner has superimposed its scope of work under the present Petition with elements of the existing transmission licence, which is not clear. The scope of work of Petitioner needs to be superimposed on the existing elements in light of the scope of work of Petitioner as per the CTUIL's Award letter dated 16.2.2023. Accordingly, *vide* Record of Proceedings for the hearing dated 9.10.20023, CTUIL was directed to clarify the scope of the Petitioner, superimposed on the elements of the existing transmission licensee. CTUIL was further directed to submit within two days a copy of the Concession Agreement executed with the Petitioner, if any, as per the NCT letter dated 16.2.2023.

12. CTUIL, *vide* its affidavit dated 17.10.2023, has submitted as under:

(a) As per the NCT award letter dated 16.2.2023, the Khavda Phase II- Part D scheme includes the LILO of Pirana (PG)-Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad sub-station with twin HTLS conductor along with re-conductoring of Pirana (PG)- Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and bay upgradation work at Pirana (T) and at Pirana (PG) along with requisite FOTE at both the locations. In this regard, TPGL in the present Petition has submitted the following scope of work which includes the additional insertions for providing clarifications w.r.t. TPGL's submissions:



(a) Transmission Lines:

Existing Transmission Lines/ Elements		Proposed Transmission Lines/ Elements
A-(i)	LILO of Gandhar - Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard.	LILO of Gandhar-Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard.
A-(ii)	SUGEN CCPP-Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C line (Twin Moose) 6 KM) (With the above LILO, SUGEN CCPP-Pirana (T) 400kV D/c section & Pirana (PG)-Pirana (T) 400kV D/c section has been formed)	SUGEN CCPP Akhakhhol-Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C line (6 KM): [two circuits with Twin Moose (part of Sugan- Pirana(T) 400kV D/C)] & [two circuits with Twin HTLS (part of Pirana (PG)-Pirana (T) 400kV D/C) along with OPGW]. Reconductoring of balance portion of existing Pirana (PG) – Pirana (T) 400kV D/c line with twin HTLS conductor along with OPGW (~1.6 KM)
A-(iii)	-	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/S with twin HTLS conductor along with OPGW. (~60km)

(b) With regard to the transmission lines work that the subject Khavda Phase II - Part D scheme includes LILO of Pirana (PG)-Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad sub-station with twin HTLS along with re-conductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both mainline and LILO section, it is clarified that with the LILO of SUGEN CCPP-Pirana (PGCIL) 400 kV D/C line at Pirana (TPL) (Sl. No. A-(ii) of above table), SUGEN CCPP-Pirana (T) 400 kV D/C section & Pirana (PG)-Pirana (T) 400 kV D/C section has been formed. Accordingly, as per the specified scope of work, reconductoring of the existing Pirana (PG)- Pirana (T) 400 kV D/C section also needs to be carried out along with the LILO of Pirana (PG)-Pirana (T) at 765/400 kV Ahmedabad sub-station as indicated in the following table:

(b) Sub-station work:

S. No.	Existing Substation Elements	Proposed Substation Elements



B(i)	2 Nos. 400 kV Line bays (2000 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation	2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation and 2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (T) 400/220 kV substation with requisite FOTE at both Pirana (PG) & Pirana (T) ends.@
------	--	--

@Up-gradation at Pirana(T) shall also include up-gradation of 400 kV Bus coupler bay and 400 kV Transfer bus coupler bay along with up-gradation of bus bar by TPGL.

(c) With regard to the sub-station work, the current rating of existing 400 kV line bays is 2000A at both the Pirana (PG) & Pirana (T). Accordingly, the bay up-gradation work includes the 2 bays up-gradation (from a current rating of 2000A to 3150A) at Pirana (PG) and the 2 bays upgradation (from a current rating of 2000A to 3150A) at Pirana (T). Up-gradation at the Pirana(T) shall also include up-gradation of the 400 kV Bus coupler bay and the 400 kV transfer bus coupler bay along with the up-gradation of the bus bar. CTUIL has placed on record a copy of the Schematic Diagram of the scope of work of the Petitioner, superimposed on the elements of the existing transmission licence.

(d) With regard to the Concession Agreement executed with the Petitioner, if any, as per the NCT letter dated 16.2.2023, the Format of the Concession Agreement has been taken up with the Ministry of Power. CTUIL has submitted its inputs regarding the same. The matter is under deliberation. After being notified by the Ministry of Power, a Concession Agreement shall be signed for the projects granted under RTM.

Analysis and Decision

13. We have considered the submissions of the Petitioner and CTUIL. The Petitioner has approached the Commission under Section 18 of the Act to seek an amendment of the transmission licence for implementation of the transmission



scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II-Part-D project as ISTS under RTM mode.

14. The Ministry of Power vide its Notification dated 23.9.2020, notified the 'Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II – Part D' to be implemented under Tariff Based Competitive Bidding which forms a part of the planned transmission for evacuation of the 4.5 GW RE injection from the Khavda complex (Part A to Part D). The scope of work as captured in the minutes of the 10th meeting of the NCT dated 7.11.2022 is as under:

"Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II – Part D

S. No.	Scope of the Transmission Scheme	Scheduled COD (months) in months form Effective Date
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section	24
2.	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T)# 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos @	

The current rating of existing bays is 2000 A

@04 Nos. 400 kV line bays upgradation includes 02 bays upgradation at Pirana (PG) and 02 bays upgradation at Pirana (T). Upgradation at Pirana(T) shall also include upgradation of 400 kV Bus coupler bay and 400 kV Transfer bus coupler bay along with upgradation of bus bar.

Note:

(i) Transmission system for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda is being taken up under Phase-I. Phase-II RE scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda needs to be taken up for evacuation requirement beyond 3 GW from Khavda RE park.

(ii) Implementation of all the transmission packages proposed for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda RE park under Phase-II (Part A to Part D) needs to be taken up in similar timeframe.



(iii) The switching scheme of existing 400 kV Pirana (T) S/S is Double Main and Transfer (DMT) Scheme and current rating of existing Bus Coupler Bay and Transfer Bus Coupler Bay is 2000 A. With upgradation of line bays to 3150 A (to suit the re-conductoring with Twin HTLS conductor), existing 400 kV Bus Coupler Bay and Transfer Bus Coupler (with associated bus bar) shall also be upgraded to 3150 by the TSP."

15. Since, the said Scheme includes re-conductoring of part of the Petitioner's Project i.e., Pirana (PG)-Pirana (T) line, in the 10th meeting of the National Committee on Transmission (**NCT**) dated 7.11.2022, it was agreed that the mode of implementation of the said Scheme would be changed from TBCB to Regulated Tariff Mechanism which would entail de-notifying the said Scheme by the Ministry of Power. The relevant portions of the minutes of the meeting of NCT dated 7.11.2022 are extracted as under:

“3.3 Implementation modalities of Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D

3.3.1 MoP vide Gazette notification dated 23.09.2020 had notified the “Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II - Part D” to be implemented under TBCB route which forms a part of the planned Transmission system for evacuation of 4.5 GW RE injection from Khavda complex (Part A to Part D). Scope of the scheme is detailed below:

Sl. No.	Scope of the Transmission Scheme	Scheduled COD (months) in months from Effective Date
1	LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS along with re-conductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section	24
2	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T)# 400 kV line bays (Bay Upgradation) - 4 Nos@	

The current rating of existing bays is 2000A.

@ 04 Nos. 400 kV line bays upgradation includes 02 bays upgradation at Pirana (PG) and 02 bays upgradation at Pirana (T). Upgradation at Pirana(T) shall also include upgradation of 400 kV Bus coupler bay and 400 kV Transfer bus coupler bay along with upgradation of bus bar.

Note:



(i) Transmission system for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda is being taken up under Phase-I. Phase-II RE scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda needs to be taken up for evacuation requirement beyond 3 GW from Khavda RE park.

(ii) Implementation of all the transmission packages proposed for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda RE park under Phase-II (Part A to Part D) needs to be taken up in similar timeframe.

(iii) The switching scheme of existing 400 kV Pirana (T) S/S is Double Main and Transfer (DMT) Scheme and current rating of existing Bus Coupler bay and Transfer Bus Coupler bay is 2000 A. With upgradation of line bays to 3150 A (to suit the re-conductoring with Twin HTLS conductor), existing 400 kV Bus Coupler bay and Transfer Bus Coupler bay (with associated Bus Bar) shall also be upgraded to 3150 A by the TSP.

3.3.2 The length of Pirana (T)- Pirana (PG) 400 kV line is about 6 km and the LILO portion is around 20 km. The scheme is part of Comprehensive Transmission System for evacuation of 4.5 GW RE Injection at Khavda under Phase-II that was recommended by NCT in its 3rd meeting held on 26th & 28th May, 2020. At that time, NCT worked in line with ToR issued by MoP vide its OM dated 04.11.2019 which did not include formulation of packages, examination of cost and recommendation of the mode of implementation. Therefore, 3rd NCT simply recommended the comprehensive Transmission system to MoP for decision.

3.3.3 Subsequently, MoP vide letter dated 24.08.2020 requested CEA to structure/package the new ISTS schemes approved by 3rd NCT along with suggested mode of implementation and the estimated cost of the packages. Accordingly, CEA vide letter dated 07.09.2020 furnished the package wise segregation of the schemes along with estimated cost and proposed mode of implementation. The packages formulated by CEA inter-alia included the above mentioned "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II - Part D" with an estimated cost of Rs. 117.8 Cr with proposed mode of implementation through RTM route to JV of Torrent & PGCIL. However, MoP vide Gazette dated 23.09.2020 notified the "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II - Part D" for implementation through TBCB route. The scheme is presently under bidding.

3.3.4 The length of Pirana (T)- Pirana (PG) 400 kV line is about 6 km and the LILO portion is around 20 km. The scheme is part of Comprehensive Transmission System for evacuation of 4.5 GW RE Injection at Khavda under Phase-II that was recommended by NCT in its 3rd meeting held on 26th & 28th May, 2020. At that time, NCT worked in line with ToR issued by MoP vide its OM dated 04.11.2019 which did not include formulation of packages, examination of cost and recommendation of the mode of With initiation of bidding, when the BPC i.e. RECPDCL requested owner of Pirana (T) and Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line i.e. Torrent Power Grid Limited



(TPGL) to furnish the tower schedule then Torrent Power Grid Limited (TPGL) vide e-mail dated 30.09.2022 highlighted the following commercial & operational issues in respect of implementation of the subject scheme:

i. Whether the proposed reconductoring and bay work will have any implication on Tariff of TPGL? If yes, we request you to kindly share the methodology for adjustment (Removal/ replacement of bays at Pirana-PG and Pirana-T and Reconductoring)

ii. As existing assets are licensed assets, whether the modification of same requires approval of Hon'ble CERC or not. If yes, we request you to kindly share proposed steps for same?

iii. We also request you to kindly clarify the operational aspects in respect of O&M responsibility after execution of the project due to peculiar situation i.e.

a. Joint Ownership of line between Torrent Pirana to PGCIL Pirana: Towers will be owned by TPGL whereas reconductoring portion will be owned by the successful bidder. Request you to guide for responsibility of carrying out line maintenance and tower maintenance.

b. Joint Ownership: O&M of Bays at Pirana (T) within TPL substation and owned & installed by bidder. Request you to please confirm that the bidder will pay the O&M charges to TPGL as per CERC Regulations as TPGL is paying O&M Charges to PGCIL at PGCIL substation end though same is owned by TPGL.

iv. Further, we request you to share with us the role and responsibility of declaring Availability so as to avoid possible issues and defining the responsibility e.g. in case of conductors snapped or Tower collapsed.

3.3.5 Member Secretary, NCT, stated that TPGL has raised the issue that reconductoring of the Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line another transmission licensee will lead to joint ownership of the line with the transmission towers/accessories being owned by TPGL and the conductors/bay equipments being owned by the new transmission licensee.

3.3.6 CTUIL informed that the existing line bays, bus bar, bus couplers etc. at Pirana (T) also needs to be upgraded after reconductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor. This would lead to several commercial as well as operational issues such as tariff implications for existing asset owner, responsibility of O&M of towers etc. CTUIL further stated that if the work is allocated to the existing owner under RTM, the differential cost for carrying out reconductoring works will be comparatively less, as the value of old scrap conductors would also be significant.

3.3.7 Accordingly, it was proposed that keeping in view the commercial, operational & ownership issues involved in implementation of the reconductoring works by the successful bidder/ new transmission licensee,



and on account of urgency to take up the implementation of the aforesaid scheme (in matching timeframe of Khavda Phase II 4.5 GW schemes), it would be prudent to allocate the scheme through RTM route.

3.3.8 Chairman, NCT, opined that this practice of allocating reconductoring works through RTM route need not be generalised. Consultation with stakeholders may be done and a base paper needs to be prepared for identification of Implementation Modalities for Reconductoring works in order to standardise/simplify decisions in this regard in future. Member (E&C), CEA, also agreed that reconductoring works may not necessarily be taken up under RTM.

3.3.9 After detailed deliberations, it was agreed that considering the apprehensions raised by the existing owner of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line & Pirana (T) S/stn i/e TPGL, the mode of implementation for the "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D" would be changed from TBCB to RTM.

3.3.10 Further, as implementation of all the transmission packages proposed for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda RE park under Phase-II (Part A to Part D) needs to be taken up in similar timeframe, accordingly, the implementing agency under RTM would coordinate with the BPC/SPV of Khavda Phase II (Part A - C) schemes to match the commissioning timeframe. This would entail the following actions:

1. Denotification of the scheme "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D" that was issued by MoP vide Gazette Notification dated 25.09.2020.
2. Allocation of the aforesaid scheme to CTUIL for implementation through RTM route by the respective asset owners i.e.
 - LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor along with reconductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL.
 - Bay upgradation work at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to Powergrid.

3.3.11 Further, as the estimated cost of the scheme is less than Rs. 500 Crores, the same have been allocated to CTUIL by NCT."



16. The NCT, in its 11th meeting held in two sittings dated 28.12.2022 and 17.01.2023, approved the said Scheme with the revised scope of works to be implemented by the Petitioner. The relevant portions of the 11th meeting of the NCT are extracted as under:

"LILO of Pirana (PG)- Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS conductor along with reconductoring of Pirana (PG)- Pirana (T) line with twin HTLS conductor (with OPGW for both main & LILO portion) and Bay upgradation work at Pirana (T) and at Pirana (PG) along with requisite FOTE - to be awarded to TPGL."

17. The Central Transmission Utility of India (CTUIL) vide its letter dated 16.2.2023, conveyed the approval of NCT for said Scheme to be implemented by the Petitioner under the RTM mode. The relevant portions of the said letter dated 16.2.2023 are extracted as under:

"Sub: Implementation of ISTS Transmission Schemes approved by NOT in its 11th meeting held on 28.12.2022 and 17.01.2023 under Regulated Tariff Mechanism (RTM)"

NCT vide letter dated 16.02.2023 has awarded the following ISTS Transmission Scheme for its implementation under RTM mode by implementing agencies as indicated in the table below:

Sl. No.	Transmission Scheme	Implementing Agency
<i>I. Approved ISTS Schemes:</i>		
1.	Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part A	POWERGRID
2.	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D:	TPGL
3.	ICT Augmentation at Navsari (New) associated with integration of additional 7 GW RE power from Khavda RE	POWERGRID
4.	Western Region Expansion Scheme-XXXIII (WRES-XXXIII): Part B1	POWERGRID
5.	Western Region Expansion Scheme-XXXIII (WRES-XXXIII): Part C1	POWERGRID
<i>ii. Modification in the already approved schemes:</i>		
1.	Transmission Network Expansion in Gujarat to increase ATC from ISTS: Part C	POWERGRID



2.	Transmission system for evacuation of power from Rajasthan REZ Ph IV (Part-1) (Bikaner Complex) Part-E (iii) Augmentation with 5x500MVA, 400/220 kV ICTs at Bikaner-II PS:	POWERGRID Bikaner Transmission System Ltd. (PBTSL)
III. Communication schemes approved by NCT:		
1.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Jalandhar (PG) - Kurukshetra (PG) line which is to be LILOed at 400 kV Dhanansu (PSTCL) (229 km)	POWERGRID
2.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Koldam Ludhiana (PG) line which is to be LILOed at 400 kV Ropar (PSTCL) (150 kms)	INDIGRID
3.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Agra - Ballabgarh line (181km) - Replacement	POWERGRID
4.	Supply and Installation of OPGW on existing 400 kV Kishenpur - Wagooora line (183 km) - Replacement	POWERGRID
5.	Redundant communication system for Bhinmal (PG) and Kankroli (PG) ISTS stations.	POWERGRID
6.	Supply and Installation of OPGW on existing 220kV Anta (NTPC) - Bhilwara line (187 km)	POWERGRID

The respective implementing agencies shall enter into a Concession Agreement with CTUIL for implementation of aforementioned Transmission Scheme. However, pending finalization of Concession Agreement, it is requested to initiate necessary actions for implementation of the aforementioned Transmission Schemes.

The earlier letter ref. no. CTUIL/OM/09 dated 14.02.2023 issued on the above subject stands withdrawn.”

18. Section 18 of the Act provides for the amendment of the licence. The provisions of Section 18 relevant to the present case are extracted as under:

“18. Amendment of licence: (1) Where in its opinion the public interest so permits, the Appropriate Commission, may, on the application of the licensee or otherwise, make such alterations and amendments in the terms and conditions of his licence as it thinks fit:

Provided that no such alterations or amendments shall be made except with the consent of the licensee unless such consent has, in the opinion of the Appropriate Commission, been unreasonably withheld.

(2) Before any alterations or amendments in the licence are made under this section, the following provisions shall have effect, namely: -



(a) where the licensee has made an application under sub-section (1) proposing any alteration or modifications in his licence, the licensee shall publish a notice of such application with such particulars and in such manner as may be specified...”

19. Regulation 19 (2) of the Transmission Licence Regulations provides as under:

“(2) The Procedure specified in regulation 7 mutatis mutandis be applicable in case the licensee makes an application for any alternation or modification to the terms and conditions of the licence.”

20. Regulation 7 of the Transmission Licence Regulations read with the order dated 22.1.2022 passed in Petition No.1/SM/2022 [whereby the Commission, in the exercise of ‘Power to Relax’ under Regulation 24 of the Transmission Licence Regulations, modified/amended Clause (4), Clause (7), Clause (9) and Clause (12) and dispensed with Clause (10) of Regulation 7] provides for the procedure for grant of transmission licence as under:

“(1) The application for grant of transmission licence shall be made to the Commission in Form-I appended to these regulations and shall be accompanied by such fees as may be prescribed by the Central Government from time to time.

(2) In case of the person selected for implementation of the project in accordance with the guidelines for competitive bidding, the application shall also contain such additional information, as may be required under these guidelines.

(3) The application shall be supported by affidavit of the person acquainted with the facts stated therein.

(4) Before making an application, the applicant shall submit the original application in electronic form along with annexures and enclosures on the e-filing portal of the Commission so that the same is served electronically on all the long-term customers of the project registered on the e-filing portal of the Commission. Also, a copy of the same be served through e-mail on the long term customers of the project not registered on the e-filing portal of the Commission. Further, the applicant shall also post the complete application along with annexures and enclosures in English and in the vernacular language, on its website.

(5) The application shall be kept on the website till such time the licence is issued or the application is rejected by the Commission.

(6) Immediately on making the application, the applicant shall forward a copy of the application to the Central Transmission Utility.



(7) The applicant shall, within 7 days after filing the application, post the application on the e-filing portal of the Commission and on its website in Form- II attached to these regulations in English language and in Vernacular language of the State or Union Territory where an element of the project or a long-term customer is situated, inviting comments from the general public.

8) As far as possible, within 7 days of receipt of the application the Secretariat of the Commission shall convey defects, if any, if noticed on preliminary scrutiny of the application for rectification and the defects conveyed shall be rectified by the applicant in such time as may be indicated in the letter conveying the defects.

(9) In the notice published on the e-filing portal of the Commission and on the applicant's website under clause (7) it shall be indicated that the suggestions and objections, if any, on the application, may be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, Third Floor, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi-110001 (or the address where the office of the Commission is situated), with a copy to the applicant, by any person, including the long-term customers, within 30 days of publication of the notice.

.....

(10) The Central Transmission Utility shall send its recommendations, if any, to the Commission on the proposal made in the application within a period of thirty days from the date of receipt of application by it:

Provided that copy of the recommendations, if any, made by the Central Transmission Utility shall always be forwarded to the applicant:

Provided further that these recommendations of the Central Transmission Utility shall not be binding on the Commission.

(11) The applicant may file its comments, duly supported by an affidavit, on the recommendations made by the Central Transmission Utility and the suggestions and objections, if any, received in response to the notice posted on the e-filing portal of the Commission and on the applicant's website by him, within 45 days of service of copy of the application on the Central Transmission Utility or publication of notice posted on the e-filing portal of the Commission and on the applicant's website, with an advance copy to the Central Transmission Utility or the person who has filed the suggestions and objections on the proposal made in the application, as the case may be..."

21. The Petitioner has submitted proof of service of copies of the application on the Respondents and CTUIL, and proof of web posting of the complete application. In response to the notice, no objections/suggestions have been received from the general public. The Petitioner has further undertaken to pay the applicable licence fee upon the grant of a transmission licence in terms of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012. The Petitioner has



made the Application as per Form-I and paid the fee of Rs. one lakh as prescribed by the Central Government. As per the direction of the Commission, the Petitioner has served a copy of the Application on the beneficiaries of the transmission project for the Project.

22. The Petitioner has served the copy of the Application on the Central Transmission of Utility of India Limited as required under Section 15(3) of the Act and Regulation 7(6) of the Transmission Licence Regulations. CTUIL, vide its letter dated 24.7.2023, has recommended the modification of the transmission licence granted to the Petitioner company. Relevant portions of the recommendation are extracted as under:

“1. M/s TPGL was granted transmission license for construction, operation and maintenance of the “Transmission system for evacuation of power from 1100MW Sugan Combined Cycle Power Project at Akhakhhol in the State of Gujarat” project, vide CERC order dated 16.05.2007 (amended vide order dated 03.11.2010 (read with corrigendum dated 01.12.2010)).

*2. Subsequently, M/s TPGL has filed a petition under Section 18 of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 19 of the CERC (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Transmission License and other related matters) Regulations, 2009 seeking amendment of its transmission license (No. 2/Transmission/CERC) for implementing **“Transmission scheme for evacuation of 4.5GW RE injection at Khavda PS under Phase II - Part D”** project as ISTS.*

3. As per section 15(3) of the Electricity Act, 2003 and Regulation 7(6) of Transmission License Regulations, 2009, a copy of the application for the grant of amendment of the transmission license, for the above transmission system has been received on 30.06.2023 for recommendation required u/s 15(4) of the Electricity Act, 2003 and Regulation 7(11) of Transmission License Regulations, 2009.

*4. In reference to the Transmission Scheme **“Transmission scheme for evacuation of 4.5GW RE injection at Khavda PS under Phase II - Part D”**, the following is submitted:*

(a) The government of India has set a target for establishing 500GW non fossil generation capacity by 2030, which also includes 30GW RE potential in the Khavda area of Gujarat under ISTS. The subject transmission



scheme, which is a part of Khavda Phase - II project catering to evacuation of 5GW from potential RE zone in Khavda area, involves LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400kV D/c line at Ahmedabad S/s with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section and Bay upgradation works with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) ends.

- (b) The transmission scheme was discussed and agreed in the 1st WRPC(TP) meeting held on 11.01.2020, 2nd WRPC(TP) meeting held on 04.09.2020 and 3rd WRPC(TP) meeting held on 14.06.2021.
- (c) The transmission scheme was also discussed in the 40th WRPC meetings held on 07.06.2021. Pursuant to modification of the transmission scheme in 3rd WRPC(TP) held on 14.06.2021, WRPC's views on the above transmission scheme were sought by CTU vide letter dated 05.10.2021 within 2 months. However, no views had been received from WRPC.
- (d) The transmission scheme was also discussed and agreed in the 3rd NCT meeting held on 26.05.2020 & 28.05.2020 wherein it was decided to implement this transmission scheme through TBCB route. Subsequently, in the 10th NCT meeting held on 07.11.2022, implementation of this transmission scheme was agreed under RTM route instead of TBCB, keeping in view the commercial, operational & ownership issues involved in implementation of the reconductoring works by the successful bidder/new transmission licensee & on account of urgency to take up the implementation of the aforesaid scheme (in matching timeframe of Khavda Phase-II 4.5 GW scheme. The scheme was further discussed in the 11th NCT meeting wherein its scope was revised considering the TPGL's ownership of the 400 kV line bays at Pirana (PG) S/s.
- (e) MoP, vide Gazette notification dated 25.09.2020 had notified the implementation of transmission scheme through TBCB. However, following the deliberations made in the 10th NCT meeting, MoP, vide Gazette notification dated 13.01.2023 had de-notified the implementation of this scheme through TBCB.
- (f) Subsequently, NCT vide letter dated 16.02.2023 awarded this scheme to CTUIL for its implementation under RTM mode by M/s TPGL with implementation timeframe matching with the commissioning timeframe of the other packages of Khavda Phase-II (PartAtoC). CTUIL vide letter dated 16.02.2023 to TPGL forwarded NCT's award letter and informed regarding allocation of this scheme under RTM mode.

5. In respect of the amendment of the Transmission license (No. 2/Transmission/CERC) sought by M/s TPGL, it may be noted that the above Transmission License is valid for a period of 25 Years starting from 16.05.2007. However, the start date and correspondingly the end date of validity of Transmission License sought for elements covered under scope at Annexure-II, would be different from those covered under the aforementioned Transmission



license (No. 2/Transmission/CERC).

6. In line with Section 15(4) of the Electricity Act, 2003 and Regulation 7(11) of Transmission License Regulations, 2009 and based on details furnished by **M/s Torrent Power Grid Ltd.**, CTU recommends the grant of transmission license to **M/s Torrent Power Grid Ltd.** for executing the **“Transmission scheme for evacuation of 4.5GW RE injection at Khavda PS under Phase II - Part D”** project as ISTS with scope as mentioned at Annexure- II.”

23. Further during the course of the hearing of the instant Petition, a representative of Respondent No.1, TPL, affirmed that the Pirana (TPL) sub-station forms part of the distribution system of Respondent No. 1 and as such, the Respondent has no objection to undertaking the upgradation work of the 2 Nos. of 400 kV line bays at Pirana (TPL) by TPL or by the Petitioner.

24. Considering all the materials on record, we are of the view that it is in the public interest to approve an amendment to the transmission licence granted to the Petitioner for incorporation of the revised scope of work of the transmission system proposed by the Petitioner and concurred by the CTUIL as per the details extracted as under:

(a) Transmission Lines:

Existing Transmission Lines/ Elements		Amended Transmission Lines/ Elements
A-(i)	LILO of Gandhar - Vapi 400 kV S/C line at SUGEN CPP Switchyard-26 kms.	LILO of Gandhar-Vapi 400 kV S/C line SUGEN CPP Switchyard-26 kms.
A-(ii)	SUGEN -Pirana (PG) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C line (Twin Moose) 6 KM) (With the above LILO, SUGEN CCPP-Pirana (T) 400kV D/c section & Pirana (PG)-Pirana (T) 400kV D/c section has been formed)	SUGEN CCPP Akhakhhol-Pirana (PGCIL) with LILO at Pirana (TPL) 400kV Substation. (400 kV D/C line 222 KM + M/C line (6 KM): [two circuits with Twin Moose (part of Sugen- Pirana(T) 400kV D/C)] & [two circuits with Twin HTLS (part of Pirana (PG)-Pirana (T) 400kV D/C) along with OPGW]. Reconductoring of balance portion



		of existing Pirana (PG) – Pirana (T) 400kV D/c line with twin HTLS conductor along with OPGW (~1.6 KM)
A-(iii)	-	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/S with twin HTLS conductor along with OPGW. (~60km)

(b) Sub-station work:

S. No.	Existing Substation Elements	Proposed Substation Elements
B(i)	2 Nos. 400 kV Line bays (2000 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation	2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (PG) 400/220 kV substation and 2 Nos. 400 kV Line bays (3150 A) at Pirana (T) 400/220 kV substation with requisite FOTE at both Pirana (PG) & Pirana (T) ends@

@Up-gradation at Pirana(T) shall also include up-gradation of 400 kV Bus coupler bay and 400 kV Transfer bus coupler bay along with up-gradation of bus bar by TPGL.

25. In exercise of our power under Section 18 (1) of the Act and Regulation 19 (1) of the Transmission Licence Regulations, we approve the amendment to the transmission licence and direct that the revised scope of work as approved by us shall be incorporated in the transmission licence granted to the Petitioner vide Licence No. 2/Transmission/CERC issued on 16.5.2007 and further amended by the orders dated 3.11.2010 (read with corrigendum dated 1.12.2010). We direct that necessary endorsement be made on the transmission licence issued to the Petitioner.



26. The licence for additional scope of work to be carried out through RTM mode as approved by us in this order unless revoked earlier, shall remain in force for a period of 25 years from the date of issue of the order.

27. All other terms and conditions specified in the order dated 16.5.2007 which was amended vide order dated 3.11.2010 (read with corrigendum dated 1.12.2010) in Petition No. 10/2010 remain unaltered. The transmission licensee shall comply with the provisions of the Act and the Regulations issued by the Commission from time to time.

28. Let an extract copy of this order be sent to the Central Government in the Ministry of Power and the Central Electricity Authority in terms of sub-section (7) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for their information and record.

29. Petition No. 217/TL/2023 is disposed of in terms of the above.

Sd/-
(P.K. Singh)
Member

sd/-
(Arun Goyal)
Member

sd/-
(I.S. Jha)
Member

sd/-
(Jishnu Barua)
Chairperson



TPGL/ISTS Part-D/PGCIL/2023/5833

March 24th, 2023

To,

✓ **The Executive Director (Engineering),**
Powergrid Corporation of India Limited,
"Saudamini", Plot No.: 02, Sector 29,
GURUGRAM – 122 001
Haryana

Sub: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II, Part D – project cost reg.

Ref: 1. Letter from CTUIL (Ref No.: CTUIL/O&M/09/REV Dt 16.02.2023)

Dear Sir,

This has reference to the letter from CTU No: CTUIL/O&M/09/REV dated: 16-02-2023 attached here with. The following ISTS transmission scheme has been allocated to TPGL for implementation Under RTM mode.

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D.

Sl. No.	Scope of Transmission Scheme
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/S with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section.
2	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos plus 02 Nos Bay (Bus coupler + Bus transfer) along with 02 main buses and transfer bus at Pirana (T).

It is understood that PGCIL is awarded the Ahmedabad S/S under TBCB. It is therefore requested to provide us the coordinates of sub-station along with exact location and orientation of 400 kV bays allotted to this LILO line so that the TL route can be finalised for undertaking survey activity. Further, please also convey the targeted commissioning date of the substation so that implementation schedule of the LILO line can be planned accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Torrent Power Grid Limited,



L. N. Mishra
Authorised Signatory



Encl: Letter from CTUIL (Ref No.: CTUIL/O&M/09/REV Dt 16-02-2023)



TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/5893
May 01st, 2023

To,

Sh. R K Gupta,
CGM (I/c) – Projects, Western Region -II,
Power Grid Corporation of India Limited,
Plot No. 54, Sama-Savli Road,
Vadodara – 390 024, Gujarat.

Sub: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II, Part D – project cost reg.

Ref: 1. Letter from CTUIL (Ref No.: CTUIL/O&M/09/REV, Dt. 16-02-2023)
2. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL/2023/5833, Dt. 24-03-2023)

Dear Sir,

This has reference to the letter from CTU No: CTUIL/O&M/09/REV dated: 16-02-2023 attached here with. The following ISTS transmission scheme has been allocated to TPGL for implementation Under RTM mode.

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D.


Sl. No.	Scope of Transmission Scheme
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/S with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section.
2	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos plus 02 Nos Bay (Bus coupler + Bus transfer) along with 02 main buses and transfer bus at Pirana (T).

It is understood that PGCIL is awarded the Ahmedabad S/S under TBCB. Therefore, PGCIL was requested vide our letter dated 24-03-2023 referred above to provide us the coordinates of sub-station along with exact location and orientation of 400 kV bays allocated to this LILO line as well as the targeted commissioning date of the substation so that route finalisation and implementation schedule of the LILO line can be planned accordingly. However, the above information is still awaited because of which TPGL is not able to initiate any activity. In view of above, your expeditious action is requested.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Torrent Power Grid Limited,**


L. N. Mishra
Authorised Signatory



Encl: 1. Letter from CTUIL (Ref No.: CTUIL/O&M/09/REV, Dt. 16-02-2023)
2. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL/2023/5833, Dt. 24-03-2023)

Copy: 1. The Executive Director (Engineering) - PGCIL, Gurugram (Haryana) - 122 001.
2. The Chief Operation Officer – CTUIL, Gurugram (Haryana) - 122 001.

To,

Sh. R K Gupta,
CGM (I/c) – Projects, Western Region -II,
Power Grid Corporation of India Limited,
Plot No. 54, Sama-Savli Road,
Vadodara – 390 024, Gujarat.

Sub: ISTS Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II, Part D project – Proposed PGCIL's 765kV Ahmedabad SS location reg.

Ref: 1. Letter from CTUIL (Ref No.: CTUIL/O&M/09/REV, Dt. 16-02-2023)
2. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL/2023/5833, Dt. 24-03-2023)
3. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/5893, Dt. 01-05-2023)

Dear Sir,

This has reference to the letter from CTU No: CTUIL/O&M/09/REV dated: 16-02-2023 and our subsequent letters as attached here with. The following ISTS transmission scheme has been allocated to TPGL for implementation Under RTM mode.

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D.

Sl. No.	Scope of Transmission Scheme
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/S with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section.
2	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos plus 02 Nos Bay (Bus coupler + Bus transfer) along with 02 main buses and transfer bus at Pirana (T).

It is understood that PGCIL is awarded the implementation of proposed 765kV Ahmedabad S/S under TBCB package Khavda Ph-II Part-C.


We requested PGCIL vide our letters as referred above to provide us the coordinates of proposed Ahmedabad sub-station along with exact location and orientation of 400 kV bays allocated to this LILO line as well as the targeted commissioning date of the substation so that route finalisation and implementation schedule of the LILO line can be planned accordingly.

However, the above information is still awaited because of which TPGL is not able to initiate any activity. In view of above, your expeditious action is requested.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Torrent Power Grid Limited**,




Dipak Bhajekar
Authorised Signatory

Encl: Above mentioned reference letters

Copy: 1. The Executive Director (Engineering) - PGCIL, Gurugram (Haryana) - 122 001.
2. The Chief Operation Officer – CTUIL, Gurugram (Haryana) - 122 001.
3. Executive Director (Western Region-II), PGCIL

Correspondence address: 5th Floor, PSC Building, Naranpura Zonal Office, Sola Road, Ahmedabad-380013, Gujarat.



TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2024/6271

Dated :03rd January 2024

To,
GM, PESM, Western Region -II,
Power Grid Corporation of India Limited,
Plot No. 54, Sama-Savli Road,
Vadodara – 390 024, Gujarat.

Kind Attn: Shri Pankaj Dalal (GM-PESM)

Sub: Request for under crossing of TPGL 400kV under construction line to proposed 765 kV Ahmedabad-Navsari PGCIL Line between location no 17/4-17/5 and 17/5-18/0 at Bavla, near Jasdan-Ahmedabad Highway, Ahmedabad.

Ref.

- 1) Letter from CTUIL (Ref No.: CTUIL/O&M/09/REV, Dt. 16-02-2023).
- 2) TPGL Letter No TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/6028 dated 24.07.2023.
- 3) TPGL letter No: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/6088 dated 25.08.2023.
- 4) TPGL letter No: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/6186 dated 20.10.2023.
- 5) Letter from PGCIL (WR-II/PESM/2023-24/ANTL/TL01/2639 dated 30.12.2023).

Dear Sir,

This has reference to our discussion had on 23rd October 2023 at POWERGRID – Vadodara office and Letter received from POWERGRID dated 30th December 2023 (ref. 5), regarding under crossing of TPGL's proposed 400kV LILO line between locations 17/4-17/5-18/0 of PGCIL's proposed 765 kV Ahmedabad-Navsari Line, at Bavla near Jasdan-Ahmedabad Highway, Ahmedabad

Based on your request TPGL is ready to bear additional costs to be incurred by POWERGRID due to use of heightened towers for the undercrossing of TPGL's Proposed 400kV LILO Line in the proposed location.

Further we are yet to receive confirmation regarding acceptance of our route which was jointly finalised during our joint site visit on 4th July 2023 and with ref. 3 (TPGL letter dated 25th Aug 2023) regarding slight shifting of route in location No AP-18/0 to AP-18A/0 of POWERGRID's 765 KV Ahmedabad - Navsari Line.

It spites of repeated communications we are yet to receive coordinates for proposed 765kV Ahmedabad substation along with bay positions as a result of which we are not being able to complete survey activities of proposed 400 kV LILO line.

We greatly appreciate your proactive support and consideration in addressing these concerns. Your prompt response to this matter would be highly appreciated.

Thank you for your attention, and we look forward to a favourable resolution.

Thanking you,

For Torrent Power Grid Limited,

Kartik Dave
Assistant General Manager (EHV)

Encl : as above

TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2024/ 6305
 February 8th, 2024

To,

Shri Pankaj Dalal (GM – PESM),
 Western Region -II,
 Power Grid Corporation of India Limited,
 Plot No. 54, Sama-Savli Road,
 Vadodara – 390 024, Gujarat.

Sub: ISTS Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II, Part D project – Proposed PGCIL's 765kV Ahmedabad SS location reg.

Ref: 1. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL/2023/5833, Dt. 24-03-23)
 2. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/5893, Dt. 01-05-23)
 3. TPGL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2023/6216, Dt.: 10-11-23)
 4. TPL Letter to PGCIL (Ref No.: TPGL/ISTS Part-D/PGCIL WR-II/2024/6271, Dt.: 03-01-24)

Dear Sir,

This has reference to the letter from CTU No: CTUIL/O&M/09/REV dated: 16-02-2023 and our subsequent letters as attached here with. The following ISTS transmission scheme has been allocated to TPGL for implementation Under RTM mode.

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D.

Sl. No.	Scope of Transmission Scheme
1.	LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/S with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO section.
2	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation) – 4 Nos plus 02 Nos Bay (Bus coupler + Bus transfer) along with 02 main buses and transfer bus at Pirana (T).

As PGCIL is awarded the implementation of proposed 765kV Ahmedabad S/S under TBCB package Khavda Ph-II Part-C, we requested PGCIL vide our letters as referred above to provide us the coordinates of proposed Ahmedabad sub-station along with exact location and orientation of 400 kV bays allocated to this LILO line as well as the targeted commissioning date of the substation so that route finalisation and implementation schedule of the LILO line can be planned accordingly.

However, the above information is still awaited after several communications and because of which TPGL is not able to initiate any activity. In view of above, your expeditious action is requested.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Torrent Power Grid Limited,



(P.G.Patel)
Authorised Signatory

Encl: Above mentioned reference letters

Copy: 1. The Executive Director (Engineering) - PGCIL, Gurugram (Haryana) - 122 001.
 2. The Chief Operation Officer – CTUIL, Gurugram (Haryana) - 122 001.

Correspondence address: 5th Floor, PSC Building, Naranpura Zonal Office, Ahmedabad-380013, Gujarat.

Annexure P-5

Rajesh Yadav / EHV / Ahmedabad

From: Jayanta Bardhan
Sent: Thursday, April 4, 2024 15:16
To: Rajesh Yadav / EHV / Ahmedabad
Subject: FW: Overall general layout for Ahmedabad SS
Attachments: Ahmedabad OGA Cat-II.pdf

Categories: TPGL LILO

From: Pramod Patel <pramodpatel@TORRENTPOWER.COM>
Sent: Thursday, February 29, 2024 12:28 PM
To: Jayanta Bardhan <JayantaBardhan@torrentpower.com>
Subject: FW: Overall general layout for Ahmedabad SS

FYIP

From: Pramod Patel
Sent: Tuesday, February 20, 2024 3:58 PM
To: Rajnik Prajapati / EHV / Ahmedabad <rainikprajapati@torrentpower.com>
Subject: FW: Overall general layout for Ahmedabad SS

From: Sumit Khare {सुमित खरे} <sumit.khare@powergrid.in>
Sent: Monday, February 19, 2024 4:19 PM
To: Kartik Dave / Transmission-Tppl / Ahmedabad <kartikdave@TORRENTPOWER.COM>
Cc: Pramod Patel <pramodpatel@TORRENTPOWER.COM>; Anand Kumar Saraph {आनंद कुमार सराफ} <anandsaraph@powergrid.in>; Manoj Kumar {मनोज कुमार} <manoj.kumar3@powergrid.in>; S Majumdar {एस. मजूमदार} <s_majumdar@powergrid.in>; Pankaj Narayan Dalal {पंकज दलाल} <pankajdalal@powergrid.in>
Subject: Overall general layout for Ahmedabad SS

[External : Treat content with extra caution.]

Dear Sir,

This has reference to your letter ref TPGL/ISTS/Part-D/PGCIL/WR-II/2024/6305 Dtd 08.02.2024 for location of Proposed 765kV Ahmedabad SS for LILO of 400kV Pirana PG-Pirana Torrent D/C Line .

In this regard please find attached overall general layout (OGA) approved for Ahmedabad ss on 15.02.2024 Coordinates are mentioned in OGA . However , it is requested to reverify the same at our site .

Regards
Sumit khare
Sr. DGM,RHQ-Engg
WRTS-II,POWERGRID

संदर्भ/Ref : CC-ENGG-TB202307-1001941-SC3380-OGA LAY

Date : 15/02/2024

From : S J Lahiri
Chief GM

To : KEC INTERNATIONAL LTD.
247, Park, 502,B Wing, 5th Floor, N Mumbai
400083
400083

Cc :

Subject : 765kV AIS New S/S Package SS01 for establishment of 765/400/220KV Ahmedabad New (AIS) substation including 400kV class Bus Reactor associated with "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-II –Part C" under TBCB route

LOA Ref : TBCB/765KV/KHAVDA/PHASE-II Part C/SS01/G5/NOA-1/23-100318/02 & NOA-2/23-100318/01 Dated 31/03/2023

Please find enclosed following drawings/ documents for necessary action at your end.

Vendor Drg. No. : KEC-SA322-AMD-ESE-305-DRG-001

Orgn. Drg. No. : TB202307-1001941-SC3380-OGA LAY

Revision No. : 00

Drg. Title : AHMEDABAD S/S (NEW)- Overall General Arrangement (OGA) Layout

App. Category : CAT-II

Release Date : 15/02/2024



Scan to verify

Comments : To be submitted after incorporation of the comments noted.

अनुमोदित श्रेणी/App. Category:

- I. फेब्रिकेशन/निर्माण/टाइप टेस्टिंग हेतु जारी।
Approved/released for fabrication/construction.
- II. फेब्रिकेशन/निर्माण/टाइप टेस्टिंग हेतु अनुमोदित/जारी बशर्ते दिए गए टिप्पणियाँ एवं आशोधनों की सम्मिलित किया जाये। कृपया रिवाइज्ड दस्तावेज अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।
Approved/released for fabrication/ construction subject to incorporation of comments and modification as noted. Revised drawing required for approval.
- III. टिप्पणियाँ सम्मिलित करने के उपरांत दस्तावेज को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।
To be resubmitted for approval after incorporating the comments.
- IV. सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु।
For information and record.
- REL-CON निर्माण हेतु जारी।
Released for construction.

नोट/Note:

1. Approval/Comments conveyed herein neither relieve the contractor of his contractual obligations and his responsibilities, weights, quantities, design details assemble fits, performance particulars and conformity of the supplies with the Indian Statutory Laws as may be applicable, nor does it limits the purchaser's right under the contract.
2. The approval conveyed vide this letter does not cover the approval of make for sub-vendor items.


केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम -122001, (हरियाणा) ,दूरभाष: 0124-2571700-719

Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय: बी -9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016. दूरभाष: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, सीआईएन: L40101DL1989GOI038121

Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016. Tel: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121

Website: www.powergridindia.com

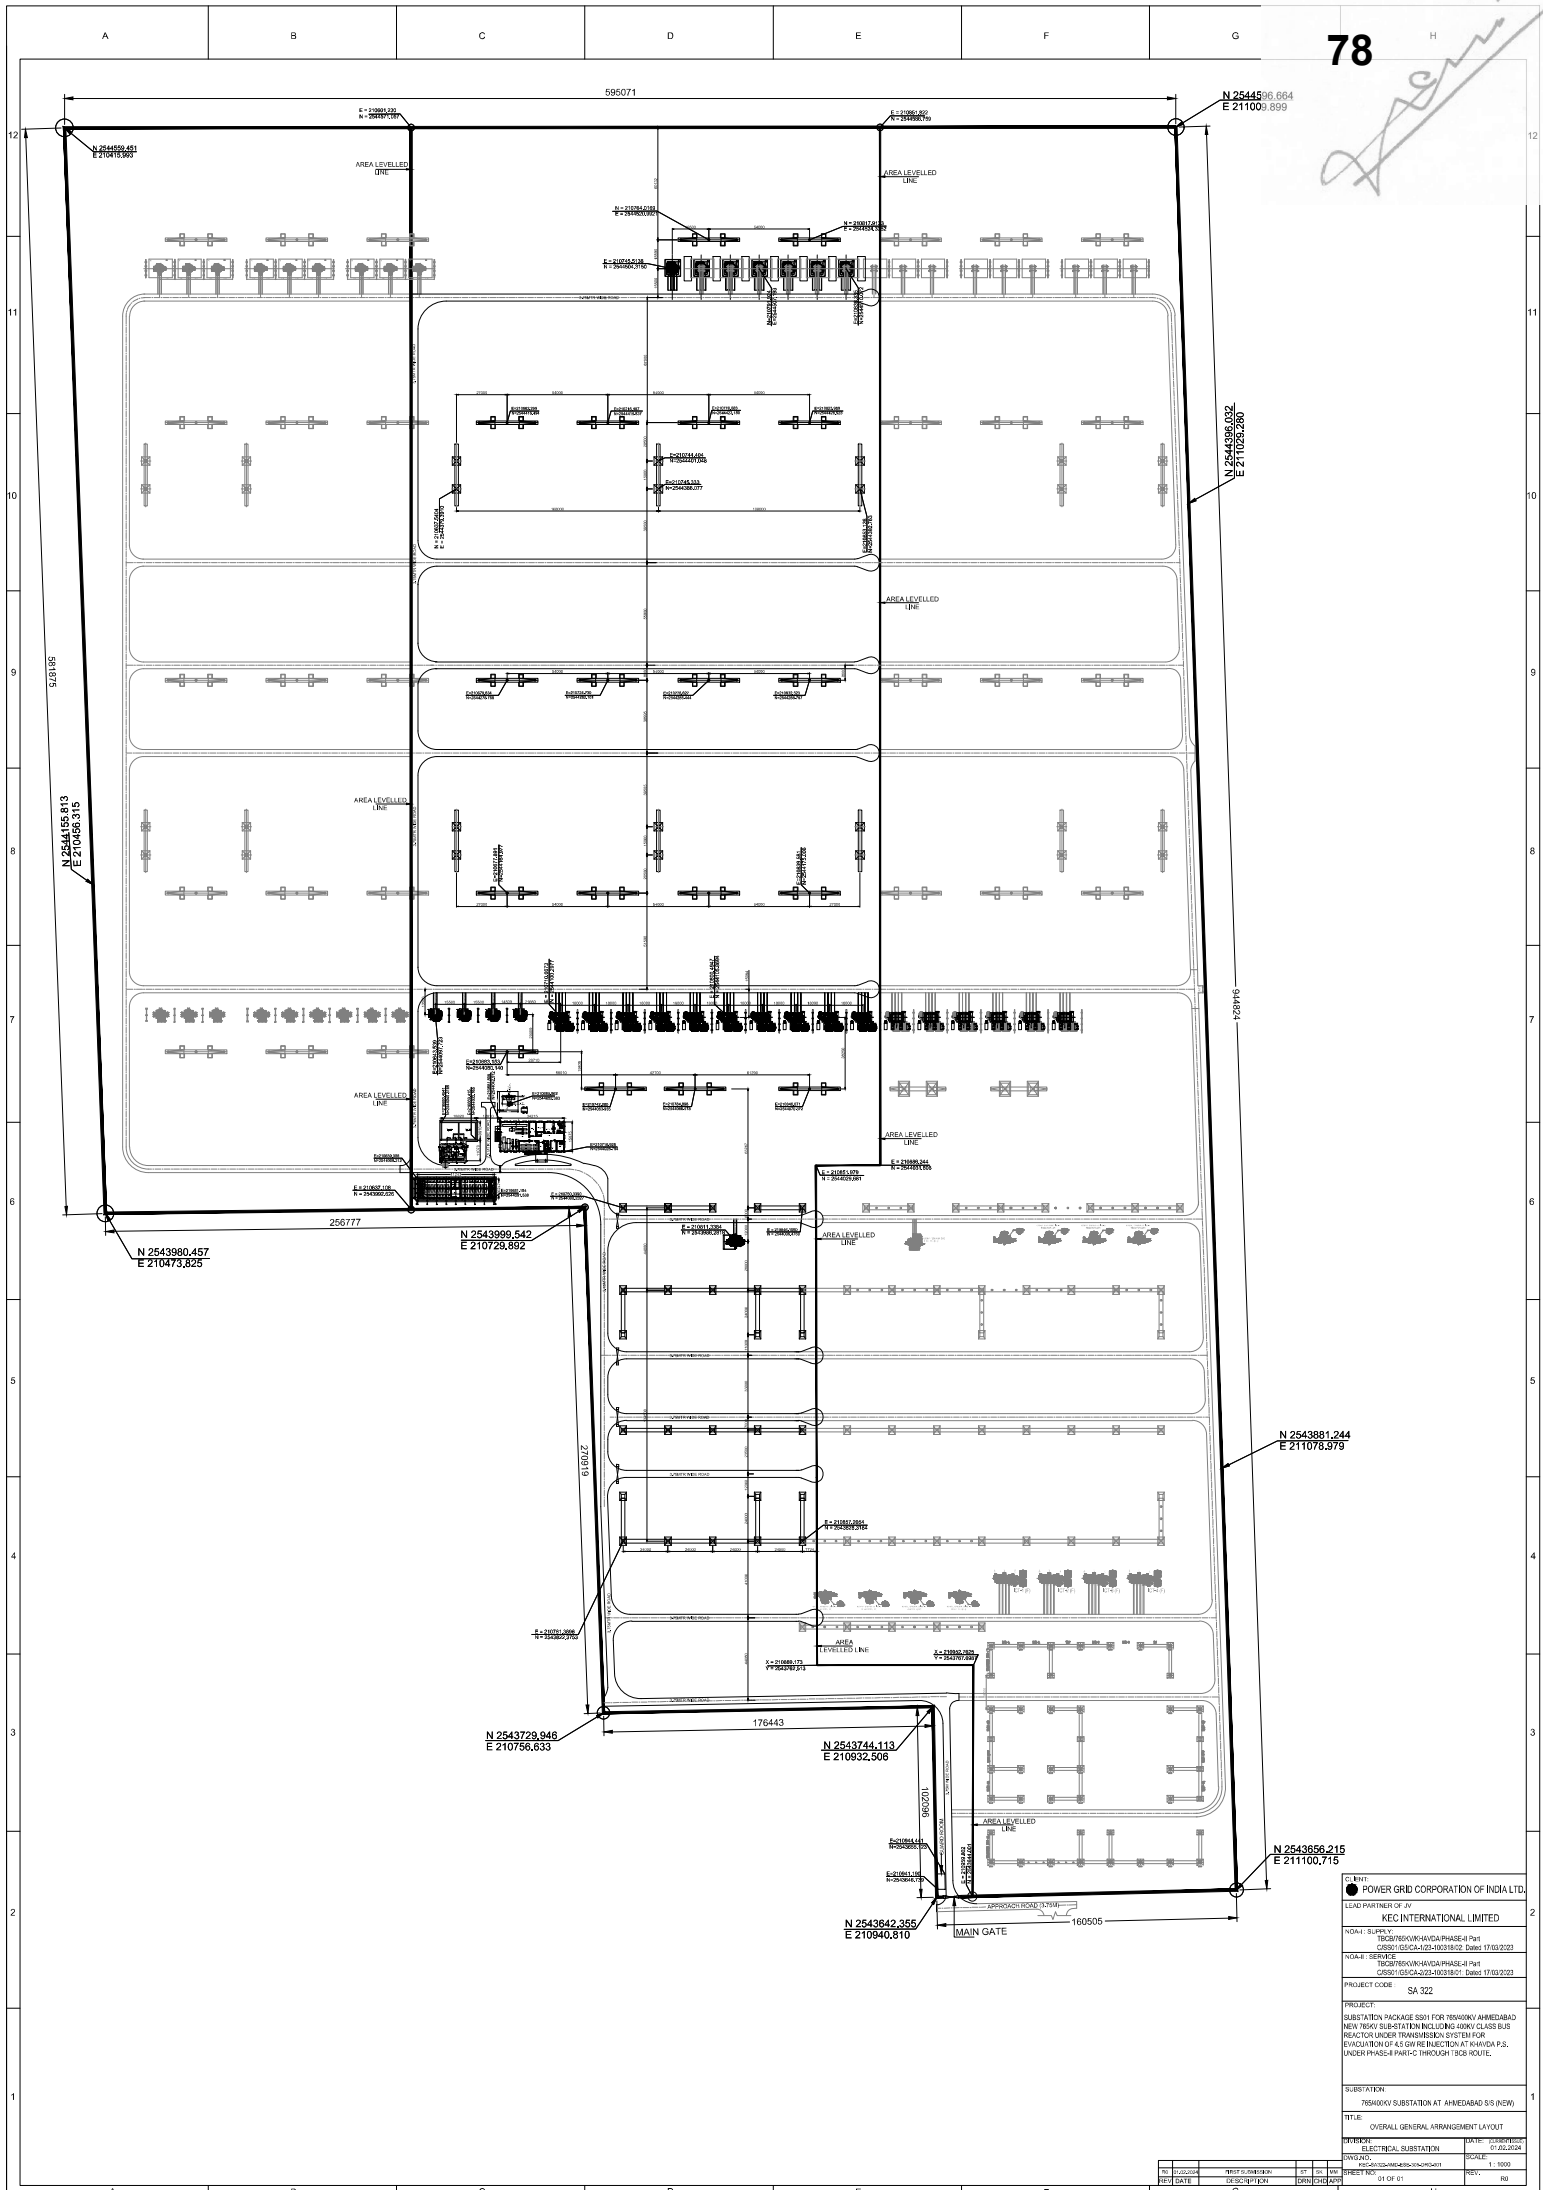

C. INT.		POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.	
LEAD PARTNER OF JV		KEC INTERNATIONAL LIMITED	
NDA-1: SUPPLY		TBS/78500KV-AHMDA PHASE-4 Part	
NDA-2: SERVICE		TBS/78500KV-AHMDA PHASE-4 Part	
PROJECT CODE		SA 322	
SUBSTATION		78500KV SUBSTATION AT AHMEDABAD S/S (NEW)	
TITLE		OVERALL GENERAL ARRANGEMENT LAYOUT	
DRAWN		DATE: 07.02.2024	
CHECKED		SCALE: 1:1000	
REV.		REV.	

NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APP
1	ISSUED FOR PERMIT	01.02.2024	...	...	...

અમદાવાદના મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ


કેસ નં. /૨૦૨૪

અરજદાર : મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬
હેડબ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ : "સમન્વય" ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે તેના
વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર પ્રમોદ જી પટેલ.

વિરુદ્ધ

સામાવાળા : (૦૧) શંખેશ્વર ઈન્ફ્રાકોન પ્રા.લી ના વતી અને તરફથી તેના
ઓર્થોરાઈઝ સીગ્નેટરી કેતનકુમાર કુમુદચંદ્ર શુક્લ
મોબાઈલ નંબર ૯૪૨૬૬૦૦૪૩૪
ઉ.વ આશરે પુખ્ત, ધંધો-વેપાર,
ઠે.ગામ મોજે સરોડા, તા.ધોળકા, જી.અમદાવાદ.
(૦૨) રાયસંગભાઈ ભાવસંગભાઈ પટેરીયા
(૦૩) કુસુમબેન હાજીભાઈ મનસુરી
મોબાઈલ નંબર ૯૯૦૯૪૨૭૩૭૨
(૦૪) ભગવતીબેન તે ઉદેસીહ હરીભાઈ પટેરીયાના વિધવા તથા
અન્ય +૧ મોબાઈલ નંબર ૯૪૨૬૬૦૦૪૩૪
(૦૫) નીતાબેન અમૃતભાઈ પટેલ
(૦૬) કીરીટકુમાર ભાઈલાલભાઈ તથા અન્ય+૪
મોબાઈલ નંબર ૯૯૭૯૮૮૫૨૫૫
(૦૭) કિર્તીકુમાર નારણભાઈ પટેલ તથા અન્ય +૩
મોબાઈલ નંબર ૭૭૭૭૯૯૯૪૭૪
(૦૮) લાલજી મનુભાઈ ઠાકોર
(૦૯) કમળાબેન પરસોત્તમદાસ તથા અન્ય+૨
(૧૦) નિરવકુમાર કિર્તીકુમાર પટેલ તથા અન્ય+૨
મોબાઈલ નંબર ૭૭૭૭૯૯૯૪૭૪
(૧૧) લીલાબેન કાંતીભાઈ ભરવાડ
(૧૨) જામબેન મહાદેવભાઈ કટારીયા તથા અન્ય+૨
(૧૩) મદીનાબેન હાજીભાઈ મનસુરી
મોબાઈલ નંબર ૯૯૦૯૪૨૭૩૭૨
નં ૨ થી ૧૩ પુખ્ત ઉંમરના, ધંધો-ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે સરોડા, તા.ધોળકા,
જી.અમદાવાદ.





(6)

(૧૧) સદર અરજના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટ વાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લાઈન અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજ સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજ કરી દાદ માંગવાની કે :-

(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીન ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમનાં માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામનાં સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળાઓ વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશોજ.

(બી) આ અરજની એકંદરે હકીકત જોતાં આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશોજ.

અમદાવાદ



S.R. No. 2535- /2024

તારીખ :-

25 JUL 2024

NOTARY
25 JUL 2024


ઈકરાર



અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી પટેલ નાઓ આજરોજ શહેર

અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજમાં લખેલ તમામ હકીકત

અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.




BEFORE ME

JIGISHA P. SHAH

NOTARY
GOVT OF GUJARAT

25 JUL 2024



સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૧/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

+વિરૂદ્ધ

સામાવાળા:-

ક્રમ	સર્વે નંબર	કબજેદારો/માલિકનું નામ	રહેઠાણ
૧	૨	૩	૪
૧.	૬૨	મે. શંખેશ્વર ઇન્ફ્રાકોન પ્રાઇવેટ લીમીટેડ વતી તેના ઓથોરાઇઝડ સીગ્નેટરી કેતનકુમાર કુમુદચંન્દ્ર શુક્લ	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨.	૫૬		મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૩.	૪૮+૮૫+૯૦		મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૪.	૮૭		મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૫.	૮૯		મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૬.	૫૯	રાયસંગભાઈ ભાવસંગભાઈ પઢેરીયા	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૭.	૫૮	કુસુમબેન હાજીભાઈ મનસુરી	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૮.	૫૭	ભગવતીબેન તે ઉદેસિંહ હરીભાઈ પઢેરીયા ના વિધવા તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૯.	૫૨	ભગવતીબેન તે ઉદેસિંહ હરીભાઈ પઢેરીયા ના વિધવા તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૦.	૮૦	ભગવતીબેન તે ઉદેસિંહ હરીભાઈ પઢેરીયા ના વિધવા તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૧.	૮૬	નિતાબેન અમૃતભાઈ પટેલ	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૨.	૮૮	કીરીટકુમાર ભાઈલાલભાઈ તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૩.	૯૨	કિર્તીકુમાર નારણભાઈ પટેલ તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૪.	૯૮	કિર્તીકુમાર નારણભાઈ પટેલ તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ

କ୍ଷୁଦ୍ର

[illegible]

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।

* Երևանի Ինտեր ԷՏՃԻ ԼՍԻԼԵ ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՄՈՆՏՈՐՈՒՄԸ

[illegible]

10।123 1023503-12 1222333 '12'12'12'12 1010101010 (12)101010-(12)101010

[illegible][illegible]

કોલમમાં દર્શાવેલ ક્રમ નં. ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૨૦, ૨૧ તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૪ના રોજ હાજર રહેલ હતા તેમજ ક્રમ નં. ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૮ તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૪ના રોજ હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ કરવા સાડ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.



અમારુ નમ્ર પાલો જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે ચાને કે "પબ્લીક એટ લાજ"ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાર્ડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જુન તેમજ જુલાઈ ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય

તેમ છે.કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."



TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા સર્વે નં.૯૯, ૯૨, ૯૮, ૧૦૦, ૧૦૧ ના ખેડુત દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, અમોના ખેતરની ખેતીની જમીન કુલ સ્વતંત્ર માલિકી હકકથી ચાલતી આવેલી છે, અને સદર જમીનમાં અમો સામાવાળાઓ ખેતીવાડી કરી ઉપજ-નિપજ લઈને અમારા કુટુંબ પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. વધુમાં સદર જમીન અમો સામાવાળાઓએ બજાર કિંમત ચુકવીને વેચાણ રાખેલ છે. અને હાલમાં જમીનની માવજતમાં લાખો રૂપિયા ખર્ચેલા છે, અને ઘણી મહેનત કરીને સદર જમીન પાક લાયક બનાવેલ છે. વધુમાં અરજદાર તેમના વિજ હેતુ સારુ ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.) -પીરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં અમો સામાવાળા નંબર: ૧૫ની ખેતીની જમીનોમાં વિજ થાંભલા નાંખી અમારી ખેતીની જમીનની અમુક જગ્યા એકવાચર કરવા માંગે છે. વધુમાં અરજદાર અમારી ખેતીની જમીનમાં જો વિજ થાંભલા નાંખે તો તેથી કરીને અમો સામાવાળાઓને નાણાંથી પણ પુરાય કે ભરપાઈ થાય તેવું પારાવાર નુકશાન થાય તેમ છે, તેમજ અમારી ખેતીની જમીનનો અમુક ભાગ ખેતી લાયક રહેતો નથી, તેમજ વિજ થાંભલાથી અમોને વિજ કરંટનો ભય ઉપસ્થિત થતો રહે છે. વધુમાં અરજદાર હાલમાં જંત્રી મુજબ નાણાં ચુકવવા જણાવે છે, પરંતુ અમો સામાવાળાઓએ સદર જમીન બજાર કિંમત મુજબ ખરીદ કરેલ હોવાથી અમોને નાણાંકીય મોટું નુકશાન થાય તેમ છે. અને વિજ થાંભલા નાંખવાથી અમો સામા વાળાઓને કોઈપણ પ્રકારનો ફાયદો મળતો નથી, જેથી અમારી ખેતીની જમીનની જેટલી જગ્યા વિજ થાંભલા નાંખવામાં જાય તેટલી જગ્યાનું અમોને બજાર કિંમતમાં ચુકવી આપવા તથા જરૂર ન જણાય તો અમારી ખેતીની જમીનમાં કોઈપણ વિજ થાંભલા નાંખવા નહીં. વધુમાં સદર ખેતીની જમીનમાં પ્રાઇવેટ કંપનીએ આવા વિજ થાંભલા નાંખવાનો કોઈપણ પ્રકારનો હકક કે અધિકાર નથી, અને અમો ભવિષ્યમાં અન્ય કોઈપણ શખ્સને વેચાણ ટ્રાન્સફર તબદીલ કરવા માંગતા હોઈએ તો અમારી જમીનોની વેચાણ કિંમત પુરેપુરી મળી શકે તેમ નથી.

તેમજ આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં.૬૨, ૫૬, ૪૮, ૮૫, ૯૦, ૮૭, ૮૯, ૫૭, ૫૭, ૫૨, ૮૦, ૮૬ ના માલિક દ્વારા તેઓની રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, ટોરેન્ટ કંપની દ્વારા અમારી જમીનનો ઉપરોક્ત

કામે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેઓ દ્વારા લગાવવામાં આવેલ થાંભલાઓથી અમારી ઘણી જમીનોનો વિસ્તાર વ્યય થાય તેમ છે અને ભવિષ્યમાં અમારે સદરહુ હાઈપાવર લાઈનના કારણે વાદગ્રસ્ત જમીનો બીનખેતીનો ઉપયોગ કરવામાં તકલીફ પડે તેમ છે તેથી અમારી જમીનમાંથી સદરહુ લાઈન પસાર થાય અને તેના થાંભલાઓ અમારી જમીનમાં નાખવામાં આવે તો અમોને નાણાંથી ન પરવડી શકે તેટલું મોટું ગંભીર નુકશાન થાય તેમ છે જેથી અમો ખેડૂતોનું હિત ધ્યાનમાં રાખી ટોરેન્ટ પાવર કંપનીને અમારી બાજુની જમીનમાંથી કે જે સરકારી પડતર જમીન આવેલ છે તેમાં સદરહુ થાંભલા નાખી વીજલાઈન નાખવાનો યોગ્ય ન્યાયના હિતમાં હુકમ કરી આપવા રજુઆત છે. અમારી માલીકીનીના સદર સરવે નંબરોની બાજુમાં સરકારી પડતર તેમજ નદી તટની કોતરવાળી બીન ઉપજાઉ જમીનો સરકારી પડતર તરીકે પડી રહેલ છે તે આવેલ છે તેનો સરકાર દ્વારા કોઈ ઉપયોગ થઈ શકે તેમ નથી તેથી સદરહુ જમીનમાં વીજપોલ નાખી ટોરેન્ટ પાવર લી. કંપની દ્વારા ૬૦ કી.મી. સુધીની ટાવર લાઈન લગાવી શકાય તેમ છે આમ છતાં તેઓ દ્વારા અમારા સદરહુ સરવે નંબરોની જમીન તેમજ અન્ય ઉપજાઉ જમીનોમાં ટોરેન્ટ ટાવર લાઈન નાખવા અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે જે અમોને નુકશાનકર્તા હોઈ અમો સામાવાળાઓને નાણાંથી ન પરવડી શકે તેટલું નુકશાન થવાનો સંભવ હોઈ બાજુની લાગુ સરવે નંબરોવાળી સરકારી પડતર જમીનમાંથી ટાવર લાઈન નાખી તેઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરે તેવો ન્યાયના હિતમાં હુકમ કરવા રજુઆત છે.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and



- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૫ થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૮૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(જ) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(પ) અરજદારશ્રીની તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ ધોળકા તાલુકાના મોજે. સરોડા ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઈએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છું.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ

વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર કિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ:૧૩, માહે:માર્ચ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ



પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારું.
- (૨) નાયબ કલેક્ટર અને[પ્રાંત અધિકારીશ્રી ધોળકા તરફ જાણ સારું.
- (૩) મામલતદારશ્રી ધોળકા તરફ તરફ જાણ સારું.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.

સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૪/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાણ:-

ક્રમ	સર્વે નંબર	કબજેદારો/માલિકનું નામ	રહેઠાણ
૧	૨	૩	૪
૧.	૬૪	મે. શંખેશ્વર ઇન્ફ્રાકોન પ્રાઇવેટ લીમીટેડ વતી તેના ઓથોરાઇઝડ સીગ્નેટરી કેતનકુમાર કુમુદચંન્દ્ર શુક્લ	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઇ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :- મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદના ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઇ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ : ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે મોજે.સરોડા, તા.ધોળકાના કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઇ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૪ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ ત્યારબાદ

તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૫, તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫, તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૫, તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ હતુ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા સામાવાળા ગેરહાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ કરવા સાડ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પાછો જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન

થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL. hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02. 12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની લેખિત રજુઆત કરવામાં આવેલ નથી.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૬૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

- (૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૬૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૪ થી પરવાનગી માંગેલ છે.

ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરટ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂબરૂ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડૂત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનોનું વળતર જે-તે ખેડૂત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ:૧૩, માહે:માર્ચ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૨૫

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ



- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારું.
- (૨) નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી ધોળકા તરફ જાણ સારું.
- (૩) મામલતદારશ્રી ધોળકા તરફ તરફ જાણ સારું.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઇલે.



અમદાવાદના મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

કેસ નં. /૨૦૨૪

અરજદાર : મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
 એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬
 હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે
 જેની રજીસ્ટર ઓફીસ : "સમન્વય" ૬૦૦ તપોવન,
 નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે તેના
 વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર પ્રમોદ જી પટેલ.

વિરુદ્ધ

- સામાવાળા :
- (૦૧) ડહીબેન તે પસાજી ની વિધવા તથા અન્ય
 મોબાઈલ નંબર ૯૨૬૫૧૮૨૮૩૩
 ઉ.વ આશરે પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
 ઠે.ગામ મોજે કાશીન્દ્રા, તા.દસકોઈ, જી.અમદાવાદ.
 - (૦૨) ભરૂભાઈ અભેસંગ વિગેરે
 મોબાઈલ નંબર ૭૩૫૮૩૬૧૭૧૭
 ઉ.વ આશરે પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
 ઠે.ગામ મોજે કાશીન્દ્રા, તા.દસકોઈ, જી.અમદાવાદ.
 - (૦૩) ધનશ્યામભાઈ હીમતસીંગ વિગેરે..
 મોબાઈલ નંબર ૯૮૨૫૩૮૨૨૮૨
 ઉ.વ આશરે પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
 ઠે.ગામ મોજે સરોડા, તા.ધોળકા, જી.અમદાવાદ.
 - (૦૪) હરનીયા ભરતભાઈ છગનભાઈ
 મોબાઈલ નંબર ૯૪૨૮૪૧૨૦૧૨
 ઉ.વ આશરે પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
 ઠે.ગામ મોજે બદરખા, તા.ધોળકા, જી.અમદાવાદ.
 - (૦૫) દીલીપકુમાર દેવકીદાસ વિગેરે..
 મોબાઈલ નંબર ૮૧૨૮૦૬૮૬૧૮
 - (૦૬) કુબેરભાઈ હીરાભાઈ વિગેરે..
 મોબાઈલ નંબર ૯૮૮૮૩૮૨૪૦૬
 - (૦૭) બચુભાઈ રામાભાઈ
 મોબાઈલ નંબર ૯૮૮૮૭૨૭૨૫૮
 - (૦૮) ખોડાજી છોટાજી ઠાકોર
 મોબાઈલ નંબર ૯૮૭૪૮૫૦૮૭૮
 - (૦૯) કમલેશકુમાર ગાંવિદભાઈ વિગેરે..
 મોબાઈલ નંબર

(2)

(૧૦) કેલાશબેન તે ચંદુભાઈ ગોવિંદભાઈની વિધવા વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર

(૧૧) દીનેશજી નાનુજી અને અન્ય

મોબાઈલ નંબર ૮૭૮૦૭૨૦૧૬૩

(૧૨) શૈલેષકુમાર રવિશંકર વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર ૮૮૮૮૬૩૫૭૨૨

(૧૩) મણીલાલ બબાભાઈ ભોઈ

મોબાઈલ નંબર ૮૫૫૮૫૩૧૬૪૮

(૧૪) મણાજી બબાભાઈ ભોઈ

મોબાઈલ નંબર ૮૫૫૮૫૩૧૬૪૮

(૧૫) ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર ૮૮૮૮૮૮૮૨૦૮

(૧૬) નરેન્દ્રસીંહ ભીખુભા વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર

(૧૭) ભુપતસીંહ ઉદેસીંહ વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર

(૧૮) વસંતભાઈ બાલુભાઈ પટેલ

મોબાઈલ નંબર ૮૪૨૮૩૩૦૦૪૭

(૧૯) અરવિંદભાઈ રાવજીભાઈ વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર

(૨૦) અરવિંદભાઈ કેશવલાલ વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર ૮૮૭૪૮૫૩૩૨૮

(૨૧) વિહાજી બુધાજી ઠાકોર

મોબાઈલ નંબર

(૨૨) ગોવિંદજી ગેલાજી ઉર્ફે જેણાજી બેચરજી ઠાકોર વિગેરે..

(૨૩) જેશંગજી મથુરજી વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર ૬૩૫૬૮૧૩૪૮૧

નં ૫ થી ૨૨ પુખ્ત ઉંમરના, ધંધો-ખેતી,

સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે ચલોડા, તા. ધોળકા,

જી.અમદાવાદ.

(૨૪) રાકેશ રમેશચંદ્ર પટેલ વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર ૮૮૭૮૫૮૧૫૬૩

રહેવાસી : ગામ મોજે જુવાલ -રૂપાવટી, તા. બાવળા,

જી.અમદાવાદ

(૨૫) નિલેષ દ્વારકાદાસ વિગેરે..

મોબાઈલ નંબર ૮૪૨૮૫૨૨૩૪૪

રહેવાસી : ગામ મોજે જુવાલ -રૂપાવટી, તા. બાવળા,

જી.અમદાવાદ

(3)

બાબત :-ધી ટેલીગ્રાફ ઓક્ટ-૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ-૧૬(૧)મુજબની અરજી.

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે :-

- (૧) અમો અરજદાર કંપની એ કંપનીઝ ઓક્ટ-૧૮૫૬ ઓક્ટ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાંટ ના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.
- (૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની દ્વારા ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી- કંડક્ટરીંગ કરવા સારૂ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી ઓક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ ઓક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.
- (૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી- કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર

(4)

લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા.૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રતીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્સર-બી, એનેક્સર-સી તથા એનેક્સર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

- (૪) અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફસ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે “પબ્લીક એટ લાર્જ”ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્સર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

(5)

- (પ) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંસાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે
- (દ) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નં. ૭ ની નકલો એનેક્સર-એ/૧ થી એ/૩૨ થી સામેલ રાખેલ છે.
- (૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજૂ. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જુન જુલાઈ તેમજ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજૂ. એ. ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે

(6)

માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાંખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરુ કરવામાં મોડુ થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલા સમય મર્યાદામાં પુર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દુર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

- (૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.
- (૯) પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઈલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ અને ધી ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મેળવેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભુ કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.
- (૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાંખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ-૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટ વાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લાઈન અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજ સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજ કરી દાદ માંગવાની કે :-

(એ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીન ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમનાં માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામનાં સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળાઓ વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશોજી.

(બી) આ અરજની એકંદરે હકીકત જોતાં આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશોજી.

અમદાવાદ

તારીખ :-

X  

ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી પટેલ નાઓ આજરોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

અમદાવાદ

તારીખ :-

X  

સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૨/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાજ:-

ક્રમ	સર્વે નંબર	કબજેદારો/માલિકનુ નામ	રહેઠાણ
૧	૨	૩	૪
૧	૨૫૬	કલ્પેશકુમાર રમેશભાઈ પંચાલ	મોજે.કાશિનદ્રા, તા.દસકોઈ, જિ.અમદાવાદ
૨	૨૬૨	ભુરભાઈ અભેસિંહ તથા અન્ય	મોજે.કાશિનદ્રા, તા.દસકોઈ, જિ.અમદાવાદ
૩	૩૭૮ પૈકી	ઘનશ્યામભાઈ હિંમતસિંહ તથા અન્ય	મોજે.સરોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૪	૩૫૯ પૈકી ૧૯	હરણિયા ભરતભાઈ છગનભાઈ	મોજે.બદરખા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૫	૧૬૨૪	દિલીપકુમાર દેવકીદાસ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૬	૧૫૬૧	કુબેરભાઈ હીરાભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૭	૧૫૬૨	કુબેરભાઈ હીરાભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૮	૧૫૨૫	બચુભાઈ રામાભાઈ	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૯	૧૪૭૭	ખોડાજી છોટાજી ઠાકોર	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૦	૧૫૦૨	કમલેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૧	૧૫૦૩	કમલેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૨	૧૫૦૧	કૈલાસબેન ચંદુભાઈ ગોવિંદભાઈના વિધવા તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૩	૧૪૭૯	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૪	૧૪૮૧	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૫	૧૩૯૯	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૬	૧૪૮૪	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૭	૧૪૮૩	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૮	૧૨૬૪	દિનેશજી નાનુજી તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૯	૧૨૬૫	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૦	૧૨૮૨	કમલેશકુમાર ગોવિંદભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ

૨૧	૧૩૦૬	શૈલેષકુમાર રવિશંકર તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૨	૧૧૫૮	મણીલાલ બબાભાઈ ભોઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૩	૧૧૫૭	મણાજી બબાજી ભોઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૪	૮૮૦	ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૫	૨૧૩૪	નરેન્દ્રસિંહ ભીખુભા તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૬	૮૮૩	ભુપતસિંહ ઉદેસંગ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૭	૮૯૩	વસંતભાઈ બાલુભાઈ પટેલ	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૮	૯૪૪	અરવિંદભાઈ રાવજીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૯	૯૫૯	અરવિંદભાઈ કેશવલાલ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૩૦	૯૬૫	વિહાજી બુધાજી	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૩૧	૯૬૬	ગોવીંદજી ગેલાજી ઉર્ફે ઝેણાજી બેચરજી ઠાકોર તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૩૨	૯૬૭	જેસંગજી મથુરજી તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૩૩	૪૩૨	રાકેશ રમેશચંદ્ર પટેલ તથા અન્ય	મોજે.જુવાલ-રૂપાવટી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૩૪	૪૩૧	નલિનીબેન દ્રારકાદાસ ની પત્ની તથા અન્ય	મોજે.જુવાલ-રૂપાવટી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :- ઉક્ત કોલમમાં ક્રમ નં.૨ માં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ : ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે મોજે.સરોડા, તા.ધોળકાના કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો

હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૪ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદત માટે તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૪ના રોજ ત્યારબાદ તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૪ના રોજ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં. ૨ થી ૮, ક્રમ નં. ૧૦ થી ૧૭, ક્રમ નં. ૧૯ થી ૩૪ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૪ ના રોજ હાજર રહેલ હતા. તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં. ૨ થી ૭, ક્રમ નં. ૯ થી ૩૩ તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૪ના રોજ હાજર રહેલ હતા.

વધુમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ થયેલ SCA-2211/2025 અન્વયે તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૫ ના રોજ થયેલ હુકમની વિગતે,

The petitioner has purchased the land in question from the erstwhile owner who was issued notice and has filed the written reply to the notice under Section 16(1). The learned counsel submits that she will not press the present Special Civil Application and she will approach the respondent No.4 Collector by filing an appropriate application for being heard in the proceedings initiated under Section 16(1) of the Telegraph Act. She submits that the application may be considered by the learned Collector. Considered the submissions. The petitioner is a purchaser of the subject land. If the petitioner files an application for being joined as party to the Section 16(1) proceedings in place of the erstwhile owner, the said application shall be heard and adjudicated by the respondent No.4 Collector on its own merits and in accordance with law. The Collector shall pass a reasoned order adjudicating the contentions raised by the petitioner herein. જે હુકમ પરત્વે તથા શ્રી કલ્પેશકુમાર રમેશભાઈ પંચાલની તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૫ની રજુઆતની વિગતે અરજદારશ્રી ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી. તરફથી અત્રે રજુ થયેલ અરજીમાં દર્શાવેલ મોજે.કાસીન્દ્રા, તા.દસકોઈ, જિ.અમદાવાદના સર્વે નં.૨૫૬ વાળી જમીન શ્રી ડઈબેન પસાજીની વિધવા તથા અન્ય પાસેથી શ્રી કલ્પેશકુમાર રમેશભાઈ પંચાલએ વેચાણ રાખેલ હોઈ તેઓનું સદરહુ જમીનમાં હિત સમાયેલ હોઈ ત્રાહિત પક્ષકાર તરીકે જોડવા અંગે રજુઆત કરેલ, જેથી શ્રી કલ્પેશકુમાર રમેશભાઈ પંચાલને પ્રથમ મુદત માટે તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૫ ત્યારબાદ તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૫, તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૫, તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેવા

જણાવેલ જે મુદતમાં અરજદાર તેમજ સામાવાળા હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી જ.પ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સાડ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરકુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો

ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે “પબ્લીક એટ લાઈ”ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાર્ડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જુલાઈ તેમજ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા દ્વારા તેઓની લેખિત રજૂઆતમાં જણાવેલ છે કે, અમો સામાવાળાને એવી માહિતી મળેલ છે કે, અમારી માલિકીના સર્વે નંબરો સાથે બીડેલ છે.તાલુકા-ચલોડા(ધોળકા)

અમદાવાદની જમીન માંથી આ કામના અરજદાર અમોને કોઈપણ પ્રકારનું વળતર ચૂકવ્યા સિવાય કાયદાની જોગવાઈઓની ઉપરવટ જઈને અમારી જમીનમાં ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટીસર્કીટ ટાવર લાઈન પસાર કરવા માટે ટાવર ઉભા કરવા માંગે છે. અને/અથવા અમારી જમીનમાંથી ૪૦૦ કે.વી. વિદ્યુત પ્રવાહવાળી ઓવરહેડ લાઈન પસાર કરવા માંગે છે. અને તે અનુસંધાને અમોએ આપની સમક્ષ મૌખિક રજૂઆત કરેલ .

આ કામના અરજદાર ટેલિગ્રાફ એક્ટની જોગવાઈઓ મુજબ કદાપિ અમારી માલિકીની જમીન ઉપર આવેલા નથી. અને અમાએ તેમની કાર્યવાહીમાં હેલો, હરકત કે અંતરાય કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયેલ નથી. આ સંજોગોમાં આ કામના અરજદારએ આપની સમક્ષ જે અરજી કરેલી છે તે અપરિપક્વ એટલે કે પ્રી-મેચ્યોર છે.

વધુમાં આપને જણાવવાનું કે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટની ડીવીઝન બેંચે જયસિંહ પુરસોત્તમભાઈ પટેલના કેસમાં પેરા ૬૩ માં સ્પષ્ટપણા એ જણાવેલું છે કે, પ્રથમ તબક્કામાં ઇલેક્ટ્રિકસીટી કંપનીએ જંત્રી મુજબની કિંમત ગણી અને નુકશાન વળતર તરીકેની રકમ ખેતરમાંથી પસાર કરતા પહેલા ચૂકવવી જોઈએ અને તે હકીકત ટેલિગ્રાફ એક્ટની કલમ ૧૦(ડી) ના પાવર વાપરતા પહેલા મૂળભૂત જરૂરીયાત છે. વધુમાં સુંદર પેરાના છેલ્લા વાચમાં સ્પષ્ટપણે જણાવેલું છે કે જો પૂરેપૂરું વળતર અથવા ઓછામાં ઓછું નુકશાન અનુસરવામાં ન આવે તો અરજદાર ની તમામ કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર છે.

અમો સામાવાળા વધુમાં જણાવીએ છીએ કે, ઉપર જણાવેલ ડીવીઝનનું બેંચ જજમેન્ટ, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટએ ગોમતીબેન કેશવભાઈ પટેલ ના કેસમાં માન્ય રાખી ને પ્રથમ તબક્કે વળતર ચૂકવેલ ન હોવાને કારણે એવું નક્કી કરેલું છે કે, ડીસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટએ ટેલિગ્રાફ એક્ટની કલમ ૧૦ સાથે કલમ ૧૬ વાંચતા તેની જોગવાઈઓનું પાલન કરેલું નથી. અને મહેરબાન કલેક્ટરશ્રીએ કાયદાની જોગવાઈઓનું ભંગ કરેલ છે અને તે સંજોગોમાં કલેક્ટરશ્રીનો હુકમ રદ કરેલો છે.

આપશ્રીને જણાવવાનું કે, કેન્દ્ર સરકાર એ તારીખ ૧૪.૦૬ ૨૦૨૪ ના રોજ ટ્રાન્સમીશન લાઈન માટે વળતર ચુકવવા અંગે ગાઈડલાઈન બહાર પાડેલ છે. જેમાં કલોઝ નંબર ૨માં જણાવેલું છે કે, ડીસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ / ડીસ્ટ્રીક્ટ કલેક્ટર કોમ્પેનશન નક્કી કરવા અંગેની સક્ષમ અધિકારી રહેશે. કલોઝ નંબર - ૩ માં જણાવેલું છે કે, સામાન્ય રીતે વળતર જંત્રી રેટ મુજબ ગણાશે પરંતુ, જો બજાર કિંમત જંત્રી કિંમત કરતા વધારે હોય તો કલેક્ટરશ્રીએ બજાર કિંમત નક્કી કરવાનો રહેશે. અને જે બજાર કિંમત નક્કી કરવામાં આવે, તે વળતર ચુકવણી માટે મૂળભૂત કિંમત ગણવામાં આવશે. અને તે હકીકતની જાણ ઇલેક્ટ્રિકસીટી કંપનીને કલેક્ટરશ્રીએ કરવાની રહેશે. વધુમાં જે જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું હોય તે જમીનની જે કિંમત

આવે તેના ૨૦૦ ટકા રકમ ચૂકવવાનું છે જ્યારે રાઈટ ઓફ વે ના કોરીડોર માટે ૩૦ ટકા લેન્ડ વેલ્યુ ચૂકવવાનું હોય છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, અમારા ખેતરમાંથી અરજદાર જે વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રસાર કરવા માટે લાઈન નાખવા માંગે છે, તે ૪૦૦ કે.વી. હાઈવોલ્ટેજ છે, એટલે કે એના બંને તરફ ૨૩ – ૨૩ મીટર જગ્યા નો ઉપયોગ થઈ શકે નહિ અને તે પ્રમાણે લંબાઈ અને પહોળાઈ ગણી અને ટોટલ જમીનનું માપ લેવું પડે.

અમો જણાવીએ છીએ કે, કેન્દ્ર સરકારએ આપશ્રીને ટેલિગ્રાફ એક્ટની કલમ ૧૦(ડી) મુજબ તાત્કાલિક વળતર ચૂકવવા અંગેની, તે વળતરની રકમ નક્કી કરવા માટે આપશ્રી ને અધિકૃત કરેલ છે. અને કેન્દ્ર સરકારએ કેવી રીતે વળતર નક્કી કરવું અને વળતરની ચૂકવણી કેવી રીતે કરવું તેની વિગત પણ જણાવેલ છે.

અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ ટેલિગ્રાફ એક્ટની કલમ ૧૦(ડી) મુજબ વળતર ચૂકવવાની જવાબદારી જે ઉપસ્થિત થાય તે વળતર ની રકમ ટેલિગ્રાફ એક્ટની કલમ ૧૬ ની કાર્યવાહી કરતી વખતે નક્કી કરવાની છે તેમ સ્પષ્ટ જણાવેલ છે. અને ખેતર માં પ્રવેશતી વખતે સદર વળતર ની રકમ વિદ્યુત કંપની એ જમીન માલિકને આપવાની હોય છે.

અમો સામાવાળા વધુમાં જણાવીએ છીએ કે, ગુજરાત સરકાર, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના જજમેન્ટ વિરુદ્ધ કાયદાકીય જોગવાઈઓ વિરુદ્ધ, તેમજ કેન્દ્ર સરકારની જોગવાઈઓ વિરુદ્ધ વળતર ચૂકવવા અંગે અથવા વળતર મોડું ચૂકવવા અંગે અથવા હમેથી ચૂકવવા અંગે કોઈ સુચના બહાર પાડી શકે નહિ. અને આવી જો સુચના બહાર પાડવામાં આવી હોય તો તેવી સુચના ને કોઈ કાયદાકીય પ્રોટેક્શન ન હોવાને કારણે આપશ્રીને બંધન કરતા નથી.

અમો સામાવાળા જણાવીએ છીએ કે, આ કામના અરજદારએ તારીખ ૩૦.૧૦.૨૦૨૪ ના રોજ વળતર ગણતરી અંગેના પત્રો અમુક ખેડૂતોને મોકલેલા છે. હકીકતએ ઉપર જણાવ્યા મુજબ આ કામના અરજદારને આવા કોઈ વળતર નક્કી કરવા અંગેની કાયદામાં કોઈ જોગવાઈ નથી અને સદર પત્ર કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધનો છે.

કુદરતી ન્યાયનાં સિદ્ધાંતો મુજબ જે વ્યક્તિએ વળતર ચૂકવવાનું હોય તે વ્યક્તિ વળતર ચૂકવણીની રીત, અંદાજીત નુકશાન અને નુકશાન ચૂકવણીનો સમય જો જાતે નક્કી કરે તો તે વ્યક્તિ પોતાના જ કેસ ની અંદર ન્યાયાધીશ બને છે. કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત મુજબ કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના જ કેસમાં ન્યાયાધીશ બની શકે નહિ અને તે સંજોગોમાં જ ઉપર જણાવ્યા મુજબ, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેમજ કેન્દ્ર સરકાર એ પણ વળતર નક્કી કરવાની સત્તા અંગે, નિર્ણય લેવાની સત્તા આપશ્રીને

આપેલ છે. તેમજ જમીનની અંદર કોઈપણ જાતનો પ્રવેશ કરતા પહેલા તે રકમ ચુકવવા માટેનો આદેશ આપેલ છે. ઉપરના સંજોગોમાં આ કામના અરજદારએ તારીખ ૩૦,૧૦,૨૦૨૪ ના રોજ અમો સામાવાળા તથા અન્યને લખેલ પત્ર ગેરકાયદેસરનો અને સત્તા બહારનો હોય તે પુત્રનો આધાર રાખી શકાય નહિ.

કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત મુજબ કોઈપણ વળતરની રકમ નક્કી કરવાની હોય, ત્યારે બંને પક્ષકારને સાંભળ્યા બાદ જ અને પુરાવાનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ જ વળતર નક્કી કરવાનું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જણાવવાનું કે, જ્યારે લેન્ડ એક્વીઝિશન એક્ટ નીચે જમીન એકવાયર કરવાની હોય, ત્યારે બંને પક્ષકારોને સાંભળી અને પુરાવાનું મૂલ્યાંકન કરીને જમીનની કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે મોટર અકસ્માતના કેસ કે વર્કમેન કોમ્પેન્સેશનના કેસ કે કરાર ભંગ ના કેસ વિગેરે પ્રકારના દરેક કેસમાં જ્યારે પણ વળતર નક્કી કરવાનું હોય છે, ત્યારે વળતર બંને પક્ષકારોને સાંભળી, પુરાવાનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરીને વળતર નક્કી કરવામાં આવે છે. તેમજ વળતર નક્કી કરવાની સત્તા કોઈ પક્ષકારને આપવામાં આવતી નથી, પરંતુ સદર સત્તા ન્યાયિક કે અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થાને આપવામાં આવે છે કે જે સંસ્થાને તકરારની મિલકત અંગે કોઈ હિત સમાયેલું હોતું નથી.

ઉપરના સંજોગોમાં આપશ્રીને જણાવવાનું કે, અરજદારની અરજી અપરિપક્વ હોય તેને રદ કરશો અથવા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ના કાયદાકીય જોગવાઈઓ તેમજ કેન્દ્ર સરકારના આદેશો મુજબ વળતરની રકમ નક્કી કરી, તેની ચુકવણી અમોને થાય ત્યારબાદ આ કામના અરજદારને અમારી માલિકીની જમીન માં પ્રવેશ કરવાની પરવાનગી આપવા મહેરબાની કરશો.

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં. ૮ દ્વારા લેખિતમાં જણાવેલ છે કે, અમારી રોડ ટર્ચિંગ ખેતીની જમીનમાથી પસાર થવાથી અમારી જમીનનું અવમુલ્યન થઈ રહેલ છે. ભવિષ્યમાં ખેતી કે અન્ય કોઈ ઉપયોગમાં લેવા સારું અવમુલ્યન થઈ રહેલ છે. જેથી અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા રજુઆત કરેલ છે.

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ શ્રી કલ્પેશકુમાર રમેશભાઈ પંચાલ દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે,

દસ્કોઈ તાલુકા ખાતે મોજે કાસીન્દ્રા ગામમાં સર્વે નંબર- ૨૫૬ થી ખેતીની જમીન ડઈબેન તે પશાજીની વિધવા પત્ની વિગેરે ધારણ કરતા હતા.

સર્વે નંબર- ૨૫૬ ની જમીન અમો સામાવાળાએ સદર જમીનના માલિક ડઈબેન તે પશાજીની વિધવા પત્ની વિગેરેને વેચાણ અવેજની રકમ ચુકવીને વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચાણ રાખેલ છે જે વેચાણ દસ્તાવેજ મે. સબ-રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરીમાં અનુક્રમ નંબર- ૧૨૧૨ તારીખ ૭-૨-૨૦૨૫ ના રોજથી

નોંધાયેલ છે. સદર વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ રેવન્યુ દફતરે ફેરફાર નોંધ નંબર- ૧૪૪૫૨ થી કરવામાં આવેલ છે. આમ સદર જમીનમાં અમો સામાવાળાનું હીત રહેલું હોવાથી અમો સામાવાળાએ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશીયલ સીવીલ એપ્લીકેશન નંબર- ૨૨૧૧/૨૦૨૫ દાખલ કરેલ હતી જેમાં નામદાર હાઈકોર્ટ અમો સામાવાળાની અરજીને સાંભળીને તારીખ ૧૮-૨-૨૦૨૫ ના રોજ નિકાલ કરેલ છે. અમો સામાવાળા સદર કામે ઈન્ટેસ્ટેડ પર્સન હોઈ અમોને સુંદર કામે ત્રાહિત પક્ષકાર તરીકે દાખલ કરવા સાડ, અમોને રજુઆત કરવાની તક આપવા, સાંભળીને સદર કામે યોગ્ય હુકમ કરવો તેવો ડાયરેક્શન આપતો હુકમ કરવામાં આવેલ છે. સદર હુકમ પક્ષકારોને તથા નામદાર આયોરીટીને બંધનકર્તા હોવા છતાં અમોને ત્રાહિત પક્ષકાર તરીકે દાખલ કરવામાં આવેલ નથી કે અમોને રજુઆત કરવાની તક આપવામાં આવેલ નથી કે સાંભળવામાં આવેલ નથી. અને અરજદારની અરજી મા સુધારો કરવામાં આવેલ નથી.

અમારા સર્વે નંબર-૨૫૮ ની બાજુમાં સરકારી ખરાબા/ ગૌચરની જમીનના સર્વે નંબર- ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૬૬, ૨૪૮ તથા ૨૫૪ આવેલા છે અને તેનો કોઈપણ જાતનો ઉપયોગ સરકારશ્રી કે કોઈપણ સંસ્થા દ્વારા હાલ સુધી કરવામાં આવેલ નથી જેથી ગુજરાત સરકારશ્રી, ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ દ્વારા ઠરાવ ક્રમાંક નંબર- જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૮૮-ક થી ટ્રાન્સમીશન લાઈન કે ટ્રાન્સમીશન ટાવર ઉભા કરવા અંગેની માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવેલ છે જેમાં મુદા નંબર-૨ માં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવેલ છે કે, "વધુમાં લાઈનના માર્ગ નક્કી કરતા પહેલા સ્થાનિક વહીવટી સત્તામંડળો સાથે જરૂરી પરામર્શ કરવો અપેક્ષીત છે. અને જ્યાં ખરાબાની કે ગૌચર જમીન ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં તકનીશી ચકાસણી કરી ટ્રાન્સમીશન લાઈન શક્ય હોય ત્યાં સુધી ખેતીની જમીનમાંથી ઓછામાં ઓછી રીતે પસાર થાય તેની તકેદારી રાખવાની રહેશે." સરકારશ્રીનો ઉપર મુજબના સ્પષ્ટ ઠરાવ હોવા છતાં આ બાબતે ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમીટેડ કંપની દ્વારા આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવેલ નથી કે કામગીરી કરેલ હોવા અંગેના આધાર પુરાવા રજુ કરવામાં આવેલ નથી.

Section 68. (Provisions relating to Overhead lines):

- (1) An overhead line shall, with prior approval of the Appropriate Government, be installed or kept installed above ground in accordance with the provisions of sub-section
- (2). The provisions contained in sub-section (1) shall not apply-(a) in relation to an electric line which has a nominal voltage not exceeding 11 kilovolts and is used or intended

to be used for supplying to a single consumer; (b) in relation to so much of an electric line as is or will be within premises in the occupation or control of the person responsible for its installation; or (c) in such other cases, as may be prescribed.

(3) The Appropriate Government shall, while granting approval under subsection (1), impose such conditions (including conditions as to the ownership and operation of the line) as appear to it to be necessary.

(4) The Appropriate Government may vary or revoke the approval at any time after the end of such period as may be stipulated in the approval granted by

(5) Where any tree standing or lying near an overhead line or where any structure or other object which has been placed or has fallen near an overhead line subsequent to the placing of such line, interrupts or interferes with, or is likely to interrupt or interfere with, the conveyance or transmission of electricity or the accessibility of any works, an Executive Magistrate or authority specified by the Appropriate Government may, on the application of the licensee, cause the tree, structure or object to be removed or otherwise dealt with as he or it thinks fit.

(6) When disposing of an application under sub-section (5), an Executive Magistrate or authority specified under that sub-section shall, in the case of any tree in existence before the placing of the overhead line, award to the person interested in the tree such compensation as he thinks reasonable, and such person may recover the same from the licensee. Explanation. - For the purposes of this section, the expression "tree" shall be deemed to include any shrub, hedge, jungle growth or other plant.

ઉપર મુજબ તેઓએ યોગ્ય સરકાર પાસે જરૂરી મંજૂરી લીધા બાદ આ કામ શરૂ કરવાનું હોય છે. પરંતુ અરજદાર દ્વારા આવી કોઈ મંજૂરીઓ કે આધાર પુરાવા રજૂ કરવામાં આવેલ નથી જે ધ્યાને લેતા આ તમામ પ્રક્રિયા મુળથી જ ખોટી હોઈ રહેને પાત્ર છે.

અરજદાર દ્વારા અમારા સર્વે નંબરની બાજુમાં ખરાબાની નંબરોવાળી જમીન આવેલ છતાં ખોટી રજૂઆત કરીને અમારા જમીન ઉપર ટ્રાન્સમીશન લાઈન કે ટ્રાન્સમીશન ટાવર ઉભા કરવા માંગે છે. સદર બાબતે અરજદાર દ્વારા અમારી સાથે કે કોઈ સ્થાનિક સત્તામંડળો સાથે કોઈપણ પ્રકારની ચર્ચા-વિચારણા કે પરામર્શ કરવામાં આવેલ નથી કે સદર જમીનને તથા તેમાના પાકને ઓછું નુકશાન થાય તે બાબતે કોઈ તકેદારી લેવામાં આવેલ નથી કે તે અંગેનો કોઈપણ પ્રકારનો અહેવાલ રજૂ કરેલ નથી તથા અમો પક્ષકારને થનાર નુકશાન બાબતે વળતર ભરપાઈ કરવા અંગેનો કોઈ પ્રારંભિક માહિતી કે તે બાબતનો રીપોર્ટ રજૂ

કરવામાં આવેલ નથી. આ બાબતે અમો દ્વારા જરૂરી આર.ટી.આઈ. પણ કરવામાં આવેલ છે પરંતુ આર.ટી.આઈ. હેઠળની માહિતી અમોને આપવામાં આવેલ નથી કે કોઈ જવાબ આપવામાં આવેલ નથી.

વધુમાં જણાવવાનું કે અરજદાર દ્વારા અમારી બાજુમાં ખરાબાની જમીન હોવા છતાં અને તેનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તેમ હોવા છતાં અમારા સર્વે નંબર- ૨૫૬ ની જમીનમાંથી ટ્રાન્સમીશન લાઈન કે ટ્રાન્સમીશન ટાવર ઉભા કરવા અંગેની રજુઆત કરેલ છે તે અંગેની તેઓની માંગણી સ્વિકારી શકાય તેમ નથી અને તે બાબતે અમારો સખત વાંધો છે અને તે બાબતે અમોને નાણાંમાં ભરપાઈ ના થઈ શકે તેવું નુકશાન થાય તેમ છે તેમ છતાં જો અમારી જમીન સંપાદન કરવાની થાય તો અમોની જમીનની બાજુમાં આવેલ સર્વે નંબર ૮૫૬ કે જે તારીખ ૧૦-૩-૨૦૨૫ ના રોજ રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ નંબર ૨૧૨૪ થી વેચાયેલ છે અને જેમાં ભાવ ૧૨૦૦૦/- પ્રતિ ચોરસમીટર હોઈ તે ભાવ ન્યુનતમ બજાર કિંમત ગણી જમીન સંપાદનની જોગવાઈઓ મુજબ The Right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act-2013 (જમીન સંપાદન, પુનઃસ્થાપન અને પુનઃવસવાટમાં વ્યાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૧૩) ની કલમ- ૨૬ થી ૩૦ કે જે આ બાબતે ખુબજ અગત્યની છે.

તેથી અમારી દલીલો તથા તમામ કાયદાકીય જોગવાઈઓ તથા પરિબળોને ધ્યાને લેતા સર્વે નંબર- ૨૫૬ ની જમીન અંગે પરવાનગી આપવી જોઈએ નહીં અને જો તેમ છતાંય પરવાનગી આપવામાં આવે તો પણ સદર ગામના અન્ય સર્વે નંબર ૮૫૬ કે જે તારીખ ૧૦-૩-૨૦૨૫ ના રોજ રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ નંબર ૨૧૨૪ થી વેચાયેલ છે અને જેમાં ભાવ ૧૨૦૦૦/- પ્રતિ ચોરસમીટર હોઈ તે ભાવ ન્યુનતમ બજાર કિંમત ગણી જમીન સંપાદનની જોગવાઈઓ મુજબ અમોને વળતર ચુકવવું જોઈએ એવી અમો સામાવાળાની રજુઆત છે.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૫થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(૪) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(૫) અરજદારશ્રીની તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૫ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળા (૧) મોજે ગામ : સરોડા, બદરખા, ચલોડા, તા.ધોળકા (૨) મોજે ગામ : જુવાલ-રૂપાવટી, તા.બાવળા (૩) મોજે ગામ : કાશીન્દ્રા, તા.દસકોઈ નાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરટ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઈએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત

ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનુ રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર કિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનુ રહેશે.

આજ તારીખ:૦૯, માહે:એપ્રિલ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૦૯/૦૪/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ



નકલ રવાના:-

- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.
- (૨) નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી ધોળકા / દસકોઈ તરફ જાણ સારૂ.
- (૩) મામલતદારશ્રી ધોળકા / બાવળા / દસકોઈ તરફ તરફ જાણ સારૂ.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.

અમદાવાદના મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

અરજદાર :

કેસ નં. /૩૦૨૪

મે. દીરેન્ડ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે
જેની રજીસ્ટરેડ ઓફીસ : "સામન્વય" ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે તેના
વતી અને તરફથી ફીરકટર પ્રમોટ જી પટેલ.

વિરૂધ્ધ

સામાવાળા :

(૧) કેતનકુમાર મોહનદાસ પટેલ

ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,

ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,

જીલ્લો-અમદાવાદ.

મો.નં.

(૨) ભરતભાઈ સારાભાઈ તથા અન્ય

ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,

ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,

જીલ્લો-અમદાવાદ.

મો.નં.

(૩) જશભાઈ કાશીભાઈ કુલાભાઈ પટેલ

ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,

ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,

જીલ્લો-અમદાવાદ.

મો.નં.

(૪) ભરતભાઈ શંકરચંદ પ્રજાપતિ તથા અન્ય

ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,

ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,

જીલ્લો-અમદાવાદ.

મો.નં.


(૫) ચીનુપ્રસાદ સુકુન્દરાય તથા અન્ય

ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,

ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,

જીલ્લો-અમદાવાદ.

મો.નં.



(2)

- (દ) સત્યેન્દ્ર છોટાલાલ તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૭) મુક્તાબેન ચીમનલાલ મણીલાલના વિધવા તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૮) શેલેષકુમાર રવિશંકર તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૯) મણીલાલ બબાભાઈ ભોઈ તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૦) ચંચળબેન લક્ષ્મણભાઈ કરશનભાઈની વિધવા તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૧) ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૨) નરેન્દ્રસિંહ ભીખુભા તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૩) ગોપાલજી રમતુજી તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા. ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.



(3)

- (૧૪) પ્રહલાદજી આતાજી તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા.ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૫) રમણભાઈ રામાભાઈ તળશીભાઈ તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા.ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૬) અરવિંદભાઈ રવજીભાઈ તથા અન્ય
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા.ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.
- (૧૭) વિહાજી બુધાજી ઠાકોર
ઉમર વર્ષ પુખ્ત, ધંધો-ખેતી,
ઠેકાણું :- મોજે ગામ - ચલોડા, તા.ધોળકા,
જિલ્લો-અમદાવાદ.
મો.નં.

બાબત :- ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ-૧૬(૧)

મુજબની અરજી.

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે :-

- (૧) અમો અરજદાર કંપની એ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ એક્ટ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાંટ ના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.
- (૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની

(4)

લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ કરવા સારું તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

(૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રતીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્સર- બી, એનેક્સર-સી તથા એનેક્સર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

(૪) અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી



(5)

એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે “પબ્લીક એટ લાઈ”ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્ષર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

(૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંસાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે

(૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નં. ૭ ની નકલો એનેક્ષર-એ/૧ થી એ/૩ થી સામેલ રાખેલ છે.

(૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્ષર-એ માં

(6)

જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી.પોસ્ટ દ્વારા સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી.કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાંખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરુ કરવામાં મોડુ થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલા સમય મર્યાદામાં પુર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દુર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઈલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ અને ધી ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ - ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મેળલ



(૭)

સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભુ કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ-૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટ વાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લાઈન અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે :-

(એ) એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીન ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમનાં માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામનાં સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળાઓ વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશોજી.




(8)

(બી) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતાં આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશોજી.

અમદાવાદ

તારીખ :-


મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર પ્રમોદ જી પટેલ

ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી પટેલ નાઓ આજરોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

અમદાવાદ

તારીખ :-

મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર પ્રમોદ જી પટેલ

SOLEMNLY AFFIRMED
BEFORE ME

S.C. Sharma

SHEFALI C. SHARMA
NOTARY
GOVT. OF INDIA

30 SEP 2024



સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૩/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમિટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા:-

ક્રમ	સર્વે નંબર	કબજેદારો/માલિકનું નામ	રહેઠાણ
૧	૨	૩	૪
૧	૮૭૯	જયેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨	૮૮૦	ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૩	૮૯૦	પ્રહલાદજી આતાજી તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૪	૮૯૨	રમણભાઈ રામાભાઈ તળશીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૫	૮૯૭	ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૬	૮૯૮	ગોપાલજી રમતુજી તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૭	૮૯૯	ગોપાલજી રમતુજી તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૮	૯૧૬	ગોપાલજી રમતુજી તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૯	૯૪૨	રમણભાઈ રામાભાઈ તળશીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૦	૯૪૫	અરવિંદભાઈ રાવજીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૧	૯૬૦	રમણભાઈ રામાભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૨	૯૬૩	વિહાજી બુઘાજી ઠાકોર	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૩	૧૨૪૨	મણીલાલ બબાભાઈ ભોઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૪	૧૨૯૨	ચિનુપ્રસાદ મુકુન્દરાય તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૫	૧૨૯૪	સત્યેન્દ્રભાઈ છોટાલાલ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૬	૧૨૯૫	મુક્તાબેન ચીમનલાલ મણીલાલના વિધવા તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૭	૧૩૦૫	શૈલેષકુમાર રવિશંકર તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૮	૧૪૭૬	ભરતભાઈ શંકરચંદ પ્રજાપતિ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૧૯	૧૫૨૩	જસભાઈ કશીભાઈ કુલાભાઈ પટેલ	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૦	૧૫૬૩	ભરતભાઈ સારભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ



૨૧	૧૬૩૧	કેતનકુમાર મોહનદાસ પટેલ	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૨	૨૧૩૫	ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
૨૩	૨૧૩૬	નરેન્દ્રસિંહ ભીખુભા તથા અન્ય	મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :- મોજે.ચલોડા, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદના ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ : ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે મોજે.સરોડા, તા.ધોળકાના કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૪ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૪ ત્યારબાદ તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ, જેમાં અરજદાર તથા ઉક્ત સામાવાળા હાજર રહેલ હતા કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૮૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના

તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સારૂ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગર્વમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પણ જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે “પબ્લીક એટ લાર્જ”ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ

૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાર્ડિ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજુ. પોસ્ટ દ્વારા સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજુ.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસિમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમા નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

- (૧) પેપરમાં જાહેરાત આપી તેમાં ફક્ત ગામ ચલોડાનો ઉલ્લેખ છે.
- (૨) પેપરમાં કોઈ ખેડૂતનું નામ છે. સર્વે નંબર આપેલ નથી.
- (૩) ખેડૂતની જમીનમાં કેટલા ચો.વાર. જમીનનું માપ કે થાંભલાનું માપ જણાવેલ નથી. ગુગલથી માપણી કરેલ હોઈ આશરો બતાવવામાં આવે છે. ચોક્કસ ચો.વારનું માપ જોઈએ.



- (જ) જાહેરાત એક વર્ષ પહેલાં આપેલ છે. અને ૨૦૧૧ ની જંત્રીના રૂપિયા ચુકવવાનું જણાવે છે.
- (પ) ટોરેન્ટ પાવર વાળા જ્યારે કામ કરશે ત્યારે કઈ સાલમાં કામ કરવાના છે. તે સાલની જંત્રીના પચાસ ગણા રૂપિયા ચુકવવાની તજવીજમાં રહે.
- (ડ) જ્યાં સુધી કોર્ટ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી કામ ન કરે હાલની તારીખમાં ટોરેન્ટ પાવર વાળા ખેડુતને ધમકી આપે છે કે તમે પોલ(થાંભલા) નહીં નાંખવા દો તો બી.એસ.એફ. કે એસ.આર.પી. અથવા પોલીસ બંદોબસ્તથી અમે કામ કરીશું. માલીક ખેડુત છે. ખેડુતની મંજૂરી સિવાય કામ ન જરૂર.
- (ઢ) ખેડુતને કાર્ડ દ્વારા પૈસા મંજૂર કરવામાં આવે પછી ખેડુતના ખાતામાં રૂપિયા પુરેપુરા આપે પછી જ કામ શરૂ કરવું.
- (ઠ) ખેડુતનું હિત હશે તો જ આગળ વધવું ખેડુતની જમીન જે રેશા(વાયર) જેટલા ચો.મી.માં પડે તે જગ્યા ભવિષ્યમાં ટી.પી. માં ૪૦% માં સમાવવી જરૂરી છે.
- (ઁ) ખેડુતની જમીનની હાલની જંત્રીની બજાર કિંમત પ્રમાણે વળતરના ૫૦ ગણા ચુકવા નહીંતર ટોરેન્ટ પાવર વાળા ખેડુતની જમીન બજાર કિંમત પ્રમાણે વેચાણ લઈ લે.
- (૧૦) જંત્રીના પચાસ ગણા ન ચુકવવા હોય તો ખેડુતને દર વર્ષે પોલ(થાંભલા)નું ભાડુ તથા રેશાનું ભાડુ ચુકવવું.
- (૧૧) રેશા તથા થાંભલાથી ખેડુતને નુકશાન થશે કે કોઈ માનવજાન હાનિ થશે તેની તમામ જવાબદારી ટોરેન્ટ પાવર વાળાની રહેશે.
- (૧૨) ખેડુતને ટોરેન્ટ પાવર વાળાએ જવાબદારી પત્ર કોર્ટ દ્વારા લેખિતમાં આપવાનું રહેશે.
- (૧૩) ખેડુતની જમીનમાં પાક કરેલ હશે તો તેનું વળતર ચુકવવાનું સ્થળ ઉપર રહેશે.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૫ થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

- (૪) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.
- (૫) અરજદારશ્રીની તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડૂત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ ધોળકા તાલુકાના મોજે. ચલોડા ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજુર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એકટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઘએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડૂત

ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનુ રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર કિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનુ રહેશે.

આજ તારીખ:૧૩, માહે:માર્ચ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

(૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.

(૨) નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી ધોળકા તરફ જાણ સારૂ.

(૩) મામલતદારશ્રી ધોળકા તરફ તરફ જાણ સારું.

(૪) સિલેક્ટ ફાઇલે.




અમદાવાદના મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

કેસ નં. /૨૦૨૪

અરજદાર : મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ : "સમન્વય" ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે તેના
વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર પ્રમોદ જી પટેલ.

વિરુદ્ધ

સામાવાળા : (૦૧) વેદપ્રકાશ દેવકીનંદન તથા અન્ય
મો. નંબર ૮૮૨૪૦૪૫૮૮૦-૮૮૨૫૦૨૩૪૮૭
(૦૨) પીપલજ ગોપાલક સામુદાયક સહકારી ખેતી મંડળી
મોબાઈલ નંબર ૮૮૭૪૦૦૦૦૦૦
(૦૩) કમોડ પછાત વર્ગ સામુદાયક સહકારી ખેતી મંડળી
મોબાઈલ નંબર ૬૩૫૪૨૧૭૦૩૮
(૦૪) જીગર કમલેશભાઈ પટેલ તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર
(૦૫) સુમરીબેન કેશુભાઈ મોઢવાડીયા તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર
(૦૬) સેમ્યુલ મલુભાઈ કીશ્ચિયન
મોબાઈલ નંબર
(૦૭) કેયુર સુભાષચંદ્ર મહેતા
મોબાઈલ નંબર
(૦૮) જશમીનભાઈ મુકેશભાઈ ગાજીપરા તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર
(૦૯) આશીષભાઈ હાવડભાઈ કીશ્ચિયન તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર
નં ૧ થી ૮ પુખ્ત ઉંમરના, ધંધો-ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે કમોડ, તા.વટવા,
જી.અમદાવાદ.
(૧૦) જયકુમાર જયાનંદભાઈ તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર
(૧૧) માવજીભાઈ મગનભાઈ દેસાઈ
મોબાઈલ નંબર ૮૮૧૩૮૩૦૮૨૩



(2)

- (૧૨) કૈશીકભાઈ રાયચંદભાઈ પટેલ
મોબાઈલ નંબર ૯૦૧૬૧૯૦૮૨૫
- (૧૩) બાબુભાઈ ફીલીપભાઈ ક્રીશ્ચિયન તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર ૯૦૧૬૧૯૦૮૨૫
- (૧૪) દલસુખભાઈ મહાદેવભાઈ પ્રજાપતિ
મોબાઈલ નંબર
- (૧૫) યોએલ તિમોથીભાઈ
મોબાઈલ નંબર ૭૯૯૦૪૫૦૩૩૭
- (૧૬) અજરૂદીન કાલુભાઈ મલેક તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર ૭૯૯૦૪૫૦૩૩૭
- (૧૭) નરેશભાઈ મોતીભાઈ
મોબાઈલ નંબર
- (૧૮) રમીલાબેન ગેરસોમભાઈ તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર ૯૮૨૪૦૩૮૨૭૦
- (૧૯) પઠાણ સમીરખાન અમ્માઉલ્લાખાન
મોબાઈલ નંબર ૭૮૭૮૬૦૩૦૦૩
- (૨૦) સાહીનબીબી ડોસુમીયા (સાહીન બાનુ) તે સમીરખાન
અમ્માઉલ્લાખાન પઠાણ ની પત્ની
મોબાઈલ નંબર ૭૮૭૮૬૦૩૦૦૩
- (૨૧) હીતેષકુમાર વાલજીભાઈ વાદી તથા અન્ય
મોબાઈલ નંબર
નં ૧૦ થી ૨૧ પુખ્ત ઉંમરના, ધંધો-ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે બાકરોલ-બાદરાબાદ,
તા. વેજલપુર, જી. અમદાવાદ.

બાબત :- ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ-૧૬(૧)

મુજબની અરજી.

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે :-

- (૧) અમો અરજદાર કંપની એ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ એક્ટ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાંટ ના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.

(3)

(૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એર્નજી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ કરવા સારૂ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

(૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા.૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્ષર- બી, એનેક્ષર-સી તથા એનેક્ષર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.



(4)

- (૪) અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે ‘‘પબ્લીક એટ લાર્જ’’ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્ષર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.
- (૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંસાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે
- (૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નં.૭ ની નકલો એનેક્ષર-એ/૧ થી એ/૩૨ થી સામેલ રાખેલ છે.
- (૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર



(5)

ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી.પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જુલાઈ, સપ્ટેમ્બર તેમજ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી.કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાંખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરું કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલા સમય મર્યાદામાં પુર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દુર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

- (૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.
- (૯) પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઈલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ અને ધી ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં



(6)

જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મેળવ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાંખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ-૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટ વાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લાઈન અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે :-

(એ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળી જમીન ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમનાં માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામનાં સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળાઓ વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશોજ.

સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૫/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમિટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા:-

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧	૨	૩	૪
૧	૨૬૩	વેદપ્રકાશ દેવકીનંદન	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		ઈન્દ્રચંદ ગુમાનમલ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		નિર્મલકુમાર મંગળચંદ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૨	૨૬૪ પૈકી	વેદપ્રકાશ દેવકીનંદન	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		નિર્મલકુમાર મંગળચંદ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		ઈન્દ્રચંદ ગુમાનમલ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		નિર્મલકુમાર મંગળચંદ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૩	૨૫૭ પૈકી	વેદપ્રકાશ દેવકીનંદન	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		ઈન્દ્રચંદ ગુમાનમલ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		નિર્મલકુમાર મંગળચંદ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૪	૨૫૮	પિંપળજી ગોપાલક સામુદાયિક સહકારી ખેતી મંડળી	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
			ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૫	૨૫૬	સહકારી ખેતી મંડળી કમોડ પછાત વર્ગ સામુદાયિક	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
			ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૬	૨૫૫	કમોડ પછાત વર્ગ સામુદાયિક સહકારી ખેતી મંડળી	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
			ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૭	૨૫૩	કમોડ પછાત વર્ગ સામુદાયિક સહકારી ખેતી મંડળી	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
			ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૮	૨૫૪	કમોડ પછાત વર્ગ સામુદાયિક સહકારી ખેતી મંડળી	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
			ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૯	૨૦૪	કમલેશભાઈ ગંગારામ પટેલ ની પત્ની	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		જસ્મીનબેન કમલેશભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		જીગર કમલેશભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		ખ્યાતીબેન કમલેશભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		સવિતાબેન તે કાળાભાઈ પરમારની દીકરી	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧૦	૨૦૩	સુમરીબેન કેશુભાઈ મોઢવાડીયા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		નીરબેન કેશુભાઈ મોઢવાડીયા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		શોભનાબેન કેશુભાઈ મોઢવાડીયા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૧૧	૨૦૨	સેમ્યુલ મલુભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૧૨	૧૯૯	કેયુર સુભાષચંદ્ર મહેતા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૧૩	૨૦૦	જસ્મીનભાઈ મુકેશભાઈ ગાજીપરા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		ભરતકુમાર ગોરધનભાઈ સોજીત્રા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		મધુભાઈ શંભુભાઈ પટોળીયા	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		ધર્મેન્દ્ર હિંમતલાલ પટેલ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૧૪	૨૦૧	રુક્સભાઈ પ્રતાપભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		પાઉલભાઈ પ્રતાપભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		બાર્નાલાસ પ્રતાપભાઈ	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
		આશિશભાઈ હાવડેભાઈ કિશ્વિયન	ગામ.કમોડ તા.વટવા જિ.અમદાવાદ
૧૫	૪૨૪	જયકુમાર જયાનંદભાઈ તથા અન્ય માવજીભાઈ મગનભાઈ દેસાઈ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		બાબુભાઈ ફીલીપભાઈ કિશ્વિયન તથા અન્ય	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૧૬	૪૨૭ અ	દલસુખભાઈ મહાદેવભાઈ પ્રજાપતિ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૧૭	૪૨૭/બ/પૈકી ૧	યોએલભાઈ તિમોથીભાઈ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૧૮	૪૨૭/બ/પૈકી ૨	અજરુદ્દીન કાલુભાઈ મલેક	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		વસીમઅહમ્મ કાલુમિયા મલેક	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		ફારુકમીયા લાલુમીયા મલેક	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		સમીર લાલુમીયા મલેક	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૧૯	૪૨૮/ પૈકી ૧	નરેશભાઈ મોતીભાઈ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૨૦	૪૨૮/પૈકી ૨	નરેશભાઈ મોતીભાઈ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૨૧	NA 99 સર્વે નં. ૪૨૯	રમીલાબેન ગેરસોમભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૨૨	૪૩૦/પૈકી ૧	પઠાણ સમીરખાન અમાનુષાખાન	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૨૩	૪૩૦/પૈકી ૨	પઠાણ સમીરખાન અમાનુદાયખાન	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૨૪	૪૩૧	શાહીનબીબી ડોસુમીયા (શાહીનબાનું) તે સમીરખાન	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		અમાનુદાયખાન પઠાણની પત્ની	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
૨૫	૪૩૪/અ	હીતેશકુમાર વાલજીભાઈ વાદી	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		અંશુલ દીનેશભાઈ ખેતાણી	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		સોનીકભાઈ વલ્લભભાઈ પટોળીયા	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		હર્ષિત ચતુરભાઈ રામજીભાઈ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ
		અક્ષિલ પ્રફુલભાઈ	ગામ.બાકરોલ-બાદરાબાદ તા.વેજલપુર જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧)

અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :- ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ: ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૪ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ ત્યારબાદ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૫, તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫, તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૫, તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેવા જણાવવામાં

આવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ ક્રમ નં. ૧ થી ૩ તથા ક્રમ નં. ૨૧, ૨૨ ના જમીનના ખાતેદાર તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેલ હતા. સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ થી ૩, ૧૫, ૧૮, ૨૨, ૨૩, ૨૪ તા. ૦૬/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. તથા સામાવાળા ક્રમ નં. ૨૨, ૨૩, ૨૪ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ કરવા સારૂ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગર્વમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પાણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે “પબ્લીક એટ લાર્જ”ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જુન તેમજ જુલાઈ, સપ્ટેમ્બર તેમજ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્ષર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્ષર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના

તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL. hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં. ૨૨, ૨૩ ના ખેડુત દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, ટોરેન્ટ પાવર કંપનીની ન્યુઝ પેપરની જાહેરાત બાબતે અમો તથા ગામના અન્ય ખેડુતોને કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી ન હતી. ટોરેન્ટ પાવર કંપનીની જાહેરાતમાં કોઈપણ સર્વે નંબર કે માલિકોના નામનો ઉલ્લેખ નથી. જેથી ખેડુતો તેમના જે તે સમયે વાંધા રજુ કરી શક્યા નથી.

ટોરેન્ટ પાવર કંપનીનો હાઈટેન્શન લાઈન બાબતનો સર્વે ખેતીની જમીનના સર્વે નંબર ઉપર થયેલો છે. પરંતુ હકીકતમાં છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી અહીંયા ટી.પી. ૪૦૧ (અ) (બાકરોલ - બાદરાબાદ - કમોડ) જાહેર થયેલ છે. જેમાં સરકાર દ્વારા ૪૦% જમીન કપાતમાં મેળવેલ છે. અને રોડ રસ્તાનો આયોજન કરેલ છે. આમ અમો ખેડુતોએ અમારી કુલ જગ્યાના ૪૦% જગ્યા સરકારશ્રીને આપી દીધેલ છે. અમારી જગ્યા રેસીડેન્ટ ઝોનમાં આવેલ છે તેમજ તેના ફાઈનલ પ્લોટ ઈશ્યુ થઈ ગયેલ છે તેમજ જગ્યા એન.એ. પણ થઈ ગયેલ છે. જેથી ટોરેન્ટ પાવર કંપની જો આ જગ્યામાં હાઈટેન્શન લાઈન નાંખશો તો આ જગ્યા ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો બાંધકામ થઈ શકે નહિં. આમ અમો જમીન માલિકો તેમજ ખેડુતો ને ખુબજ મોટો આર્થિક નુકશાન થઈ શકે તેમ છે.

અમારી જમીન ટી.પી. ૪૦૧ (અ) (બાકરોલ - બાદરાબાદ - કમોડ) ટી.પી. માં આવેલ છે. પરંતુ જમીનનો સર્વે તેમજ અમારી જમીનનું જે વળતરની રકમ ની ગણતરી કરવામાં આવેલ છે તે નોન ટી.પી. વિસ્તારની લેવામાં આવેલ છે. હકીકતમાં અમારી જમીન રેસીડેન્સ ઝોનમાં આવેલ છે. જેથી અમોને કંપની દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ વળતર કબુલ-મંજૂર નથી. અમોએ ટોરેન્ટ કંપનીના અધિકારીઓ પાસે અમારા ખેતરમાં હાઈટેન્સન લાઈન કઈ જગ્યામાંથી પસાર થાય છે તેના નકશા માંગેલા પરંતુ અમોને હજીસુધી આ નકશા કંપનીના અધિકારીઓએ આપેલ નથી.

જેથી અમો સામાવાળા આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર રજુઆત કરીએ છીએ કે, ટોરેન્ટ પાવરની હાઈટેન્શન લાઈન અમારા ખેતરમાંથી ન નીકળે તેમજ ટી.પી.ને ધ્યાનમાં રાખીને રોડ - રસ્તાની લાઈનદોરીમાં લાઈન સેટ થાય જેથી અમો તથા અમારા આસપાસના તમામ ખેડુતોને નુકશાન ન થાય. ન્યાયના હિતમાં ટોરેન્ટ પાવરની અરજી ના મંજૂર કરી અમારી રજુઆતમાં હુકમ કરવા મહેરબાની કરશોજી.

સામાવાળા ક્રમ નં. ૨૩ તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે,

It is submitted that the signatory below - Vaishaliben Pinkesh Shah and Falguniben Ankit Shah has by way of registered sale deed no. 8175 dated 29.11.2023 has purchased land

bearing revenue survey no. 429 (old survey no. 560/A/9), T.P. Scheme No. 401/A and F.P. No. 136 total admeasuring 1-27-48 Sq. Mtrs, situated at Bakrol Badarba, Taluka - Vejalpur and District - Ahmedabad and currently is the owner and occupant of the said land.

It is further submitted that the notices and public notice in the newspaper for the passing of the 400 K.V. multi circuit tower line from the said land are being published in the name of the previous owners of the said land, against which we have objection, as the previous owners have sold the said land to the present applicant/objector here by way of registered sale deed, so take note of the same and rectify the same, as we are only entitled to receive the compensation amount.

It is further submitted that the said land has by order dated 17.06.2023 passed by Collector, Ahmedabad in Non-agricultural application no. 60719202303161 converted into Non-agricultural land for multipurpose use, after paying a huge amount of premium.

It is further submitted that the said land falls in T.P. Scheme No. 401/A and F.P. No. 136 and comes under Residential (RAH) Scheme. It is submitted that public notice has been issued for passing of the 400 K.V. multi circuit tower line of Torrent Power Grid Limited from the said land and the owners of the said land have strict objections against the same as we will be unable to develop or construct on the said land after the passing of the said line from our land as this will render our land to be useless and we will suffer huge financial loss for the same.

We have objections against the compensation amount declared by the company as the same is not properly evaluated by any valuation authority/committee or based on any valuation report and the said multi circuit tower line is for the benefit of a private company being Torrent Power Grid Limited for earning profit and has no public benefit of the same. Hence, we should be compensated according to the market value of our land and the loss we have to suffer at the hand of a private company. Request is for conducting proper enquiry in the area of land to be affected of the objector here and the market value of the same and the compensation should be paid accordingly.

સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ થી ૩ દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે,

અમો સામાવાળાઓ જણાવીએ છીએ કે, તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ ના રોજ અરજદાર ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લિમિટેડ દ્વારા ન્યૂઝ પેપરમાં જાહેર નોટીસ આપી જણાવેલ છે કે 400 કિલો વોટ મલ્ટી સર્કિટ ટાવર


લાઈન લગભગ ૬૦ કિલોમીટર સાથે રીકંડક્ટ રિંગ તથા તેના સમારકામની યોજના માટે નીચે જણાવેલ ગામો માંથી આ લાઈન પસાર કરવામાં આવશે. જેથી અરજદારો દ્વારા તારીખ ૧૬.૦૯.૨૦૨૪ ના રોજ અમો સામાવાળા ને નોટિસ પાઠવી હતી. જેની નકલ તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ તથા તારીખ ૧૬.૦૯.૨૦૨૪ નોટિસ આ સાથે બીડાણ ૨ કરેલ છે.

ઉપરોક્ત નોટિસ મળ્યાં બાદ અમો સામાવાળાઓ દ્વારા તારીખ ૧૫.૧૦.૨૦૨૪ ના રોજ અમો સામાવાળાઓ દ્વારા લીગલ નોટિસ વકીલ શ્રી મારફ્ટે મોકલવામાં આવેલ હતી, જેમાં મુખ્યત્વે જણાવેલ હતું કે, અરજદારો દ્વારા ટેલિગ્રામ એક્ટ ૧૯૮૫ અને ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ ની કોઈપણ જોગવાઈ નું પાલન કરવામાં આવેલ ન હતું. જેની નકલ તારીખ ૧૫.૧૦.૨૦૨૪ બીડાણ ૩ કરેલ છે.

અરજદારો દ્વારા આપવામાં આવેલ નોટિસમાં કોઈપણ જરૂરી વિગતો દર્શાવવામાં આવેલ નથી અને કઈ દિશામાં થી કેટલી લાઈન અને કેટલા કિલો વોટ ની લાઈન પસાર થવાની છે તેની કોઈપણ વિગતો અરજદારો દ્વારા આપવામાં આવેલ નથી વધુમાં અરજદારો દ્વારા કોઈપણ પ્લાન રજૂ કરવામાં આવેલ નથી કે તેની કોઈ જાણ પણ કરવામાં આવેલ નથી અને કયા ખેતરમાંથી ક્યાં સુધી લાઈન પસાર કરવામાં આવશે તેની પણ કોઈ માહિતી અમો સામાવાળાઓ ને આજદીન સુધી આપવામાં આવેલ નથી.

૫. સદર પોલ અથવા થાંભલા ઇન્સ્ટોલ કરવાના કારણે અમો સામાવાળાઓ ને સખત વાંધો અને વિરોધ છે કારણ કે ભવિષ્યમાં પરિવાર ના સભ્યો વચ્ચે વિભાજન કરવા માટે સામાવાળાઓને ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે તેમ છે અને અમોસામાવાળાઓને ભારે આર્થિક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. જેથી સદર-થાંભલા પોલ કે ટાવર ઇન્સ્ટોલ કરવા સામે અમો સામાવાળાઓ ગંભીર વાંધો હોય નોટિસ પાછી ખેંચી લેવા અરજદારો ને વિનંતી કરેલ છે અને આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર અરજ છે.

અમો સામાવાળા ની મુખ્ય રજૂઆત એ છે કે, અમો સર્વે નંબર ૨૫૭ પૈકી તથા ૨૬૪ પૈકી ૨૬૩ પૈકી ૨૭૧ પૈકી ૨૬૧ પૈકી અને ૨૬૨ પૈકીની જમીન ધારણ કરીએ છીએ જેની ટોટલ કુલ જમીન ૧૮ વીધા છે, જે પૈકી અરજદારો દ્વારા સર્વે નંબર ૨૬૩, ૨૬૪ પૈકી અને ૨૫૭ પૈકી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન/ પોલ કે થાંભલા પસાર કરવા માંગણી કરેલ છે. જેનો અમો સામાવાળાઓ સખત વાંધો અને વિરોધ હોય અમો સામાવાળાઓ જણાવીએ છીએ કે, અમો ની ટોટલ કુલ જમીન ૧૮ વીધા છે જેમાંથી ૨૬૩, ૨૬૪ પૈકી અને ૨૫૭ પૈકી મળીને કુલ ૧૩ વીધા જમીન માં ઇલેક્ટ્રીક થાંભલા / પોલ નાખવાની અરજદારો દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવેલ છે જેથી અમો ની સદરહુ કિમતી જમીન તદ્દન નાશ પામે તેમ છે અને બાકીના પાંચ વીધા



જમીન કોઈપણ રીતે ખેતીલાયક ઉપયોગ થઈ શકે તેમ નથી કે અન્ય કોઈપણ રીતે સાદરું જમીનનો વપરાશ થઈ શકે તેમ શક્ય નથી. આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર અરજ છેકે અરજદારોની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી શકાય તેમ નથી.

અમો સામાવાળાઓ હાલ ખેતી કરતા હોય ખેતીમાંથી અમો ગુજરાન ચલાવતા હોય અમો સામાવાળાઓ ને નાણાથી પણ ભરપાઈ ન થાય તેવું નુકશાન થાય તેમ છે. વધુમાં અમો હાલ ખેતી કરેલ પાકને પણ નુકસાન થાય તેમ છે અને ખેતીલાયક ફળદ્રુપ જમીનને પણ નુકસાન થાય તેમ છે જેથી અમો ખેડૂતો ખેતી કરી શકે તેવું શક્ય રહી શકે નહીં.

વધુમાં અમો સામાવાળાઓ ની રજૂઆત છે કે અરજદારો દ્વારા "વર્ક ઓફ લાઈસન્સીસ" રુલ્સ ૨૦૦૬ ના નિયમ ૩ હેઠળ સમાવિષ્ટ જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્નમાં જમીનના માલિક એટલે કે સામાવાળાની સંમતિ મેળવ્યા વિના ઓવરહેડ વીજળીની લાઈનો નાખવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી શકે નહીં અધિનિયમની કલમ ૬૭ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાઓ જે અન્ય બાબતોની સાથે એવી જોગવાઈ કરે છે કે લાઈસન્સ ધારક માલિક ની સંમતિ વિના કામ કરી શકે નહીં કે કોઈ પણ ચોક્કસ ઇમારત અથવા જમીનના કબ્જા માટે માલિકીની સંમતિ લીધા વિના કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકે નહીં.

અમો સામાવાળાઓની મુખ્ય રજૂઆત એવી છે કે, અરજદારો દ્વારા આજ દિન સુધી પ્રત્યક્ષ રીતે અમારા ખેતરમાં ક્યાંથી ક્યાં સુધી લાઈન જશે તેની કોઈ પણ માહિતી આપવામાં આવેલ નથી અને વળતર અંગેની કોઈપણ માહિતી આપવામાં આવેલ નથી કે કોઈ જાણ કરવામાં આવેલ નથી.

અરજદારો દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર, – ગેર વ્યાજબી અને ભારતના બંધારણની કલમ ૧૪, ૧૯ (૧) ગ અને ૨૧ ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરનારી છે.

અરજદારો દ્વારા કરેલ એક્શન ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ, ૨૦૦૩ અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો તેમજ ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ જોગવાઈઓની વિરુદ્ધ છે. આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર અરજ છેકે અરજદારોની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી શકાય તેમ નથી. જે મુજબ લેખિત રજૂઆત કરેલ છે.

તારણો

- (૧) સદરું કામે ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.


Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that –

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૪ થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.



ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(જ) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(પ) અરજદારશ્રીની તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૪ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો,પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગોહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ વટવા તાલુકાના મોજે. કમોડ તથાવેજલપુર તાલુકાના બાકરોલ-બાદરાબાદના ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરટ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહી તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહી અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછું ગુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક ગુકસાન કે અન્ય ગુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ:૧૩, માહે:માર્ચ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.
- (૨) પ્રાંત અધિકારી અને સીટી ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રી પુર્વ/પશ્ચિમ તરફ જાણ સારૂ.
- (૩) મામલતદારશ્રી વટવા/વેજલપુર તરફ તરફ જાણ સારૂ.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.

અમદાવાદ મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

કેસ નંબર: /૨૦૨૪

અરજદાર:


મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ ૧૯૫૬,
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ: “સમન્વય”, ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે
તેના વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ

વિરુદ્ધ


સામાવાળા:

- (૦૧) કાળુભાઈ મુમણભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૭૮૭૪૮ ૬૯૬૩૯
- (૦૨) રણછોડભાઈ નટવરલાલ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૦૩) અજયભાઈ સુરાભાઈ ભરવાડ અને અન્ય
મો. નંબર: ૭૯૨૬૬ ૯૨૩૯૨
- (૦૪) ભાનુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ
મો. નંબર: ૯૮૨૫૬ ૩૩૨૬૦
- (૦૫) યોગીનીબેન કિરીટભાઈ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૦૬) મંજુલાબેન કનૈયાલાલ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૦૪૪ ૪૪૪૭૯ / ૯૯૦૯૨ ૯૪૫૯૪
- (૦૭) ધીરુભાઈ અરજણભાઈ
મો. નંબર: ૯૭૨૬૬ ૯૨૩૯૨
- (૦૮) જયંતિભાઈ જીવણભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૭૨૬૬ ૯૨૩૯૨
- (૦૯) જયંતિભાઈ કાનાભાઈ ભરવાડ
મો. નંબર: ૯૯૦૯૦ ૭૭૧૫૦
- (૧૦) વાઘાભાઈ પોપટભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૭૨૬૬ ૯૨૩૯૨
- (૧૧) અરવિંદકુમાર વસંતલાલ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૦૯૨ ૯૪૫૯૪ / ૯૩૨૮૨ ૪૬૨૦૪
- (૧૨) જયેશભાઈ વિનોદભાઈ મિસ્ત્રી અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૧૩) હિતેન્દ્રસિંહ મદારસિંહ ગોહિલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૨૫૮ ૭૬૦૭૭





- (૧૪) રાજેન્દ્રસિંહ મદારસિંહ ગોહિલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૨૫૮ ૭૬૦૭૭
- (૧૫) કાનજીભાઈ લાલાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૧૬) દેવાભાઈ ગાંડાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૧૭) નાગજીભાઈ પસાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૧૮) કિશોરભાઈ પસાભાઈ
મો. નંબર:
- (૧૯) સવિતાબેન મેરાભાઈ વાણીયા અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૨૦) બળદેવભાઈ પસાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૨૧) કાળુભાઈ છનાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૨૨) હુસેનખાન જીવામીયા અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૨૩) નિવાજખાન હેમતમીયા સિપાઈ
મો. નંબર: ૯૯૭૪૧ ૪૬૧૮૦
નંબર ૧ થી ૨૩, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે બાવળા, તા. બાવળા,
જી. અમદાવાદ.
- (૨૪) રામસંગ હરિભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૯૮૯ ૭૧૨૫૩
- (૨૫) ગગુભાઈ કરશનભાઈ
મો. નંબર: ૯૯૯૮૯ ૭૧૨૫૩
- (૨૬) રેખાબેન માધવસંગ
મો. નંબર: ૯૯૯૮૧ ૭૫૪૪૪ / ૯૮૨૫૪ ૮૮૦૨૪
- (૨૭) માધવસિંહ સાહુભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૯૮૧ ૭૫૪૪૪ / ૯૮૨૫૪ ૮૮૦૨૪
- (૨૮) દેવુભાઈ શીભાઈભાઈ ચૌહાણ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૯૮૮ ૩૫૧૨૯
- (૨૯) વિરસંગભાઈ અમરસંગભાઈ પટેરિયા
મો. નંબર: ૯૯૯૮૪ ૯૩૦૩૯ / ૯૯૨૪૨ ૬૫૫૫૪
- (૩૦) પૃથ્વીરાજસિંહ ખુમાનસિંહ ચાવડા
મો. નંબર: ૯૭૨૫૧ ૭૦૭૬૭
- (૩૧) હેમુભાઈ હરીભાઈ પટેરીયા અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૯૮૮ ૬૪૪૮૨




- (૩૨) માધવસિંહ સાહુભાઈ
મો. નંબર: ૯૯૯૮૧ ૭૫૪૪૪ / ૯૮૨૫૪ ૮૮૦૨૪
- (૩૩) દિલીપસિંહ કેહુભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૯૮૬ ૪૫૨૫૨
- (૩૪) રેણુકાબેન અનિરુદ્ધસિંહ ચૌહાણ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૯૮૧ ૬૪૬૫૮
- (૩૫) રામસિંગભાઈ કાનજીભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૩૬) લખમાણભાઈ ચુંથાજી ઠાકોર અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૩૭) જીતેન્દ્રસિંહ મૂળુભા પટેરીયા
મો. નંબર:
- (૩૮) વર્ષા કેતન શાહ
મો. નંબર:
- (૩૯) મોડ હરેશભાઈ ઈશ્વરદાન
મો. નંબર: ૯૯૨૪૮ ૮૩૬૭૮
નંબર ૨૪ થી ૩૯, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે આદરોડા, તા. બાવળા,
જી. અમદાવાદ.

બાબત:- ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ ૧૬ (૧) મુજબની

અરજી

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે:-

- (૧) અમો અરજદાર કંપનીએ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાન્ટના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.
- (૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લી.ને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.) - પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ.કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સાથે તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ ૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપનીને આપવામાં આવેલ છે. જે તારીખ: ૨૧-૦૨-



૨૦૨૪ના રોજ ભાગ-૨ના ખંડ-૩થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

(૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)-પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકસાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તારીખ ૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આવશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્ષર-બી, એનેક્ષર-સી અને એનેક્ષર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

(૪) અમારું નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા, ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈનવાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણના (CEA)થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્ષર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

(૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે



સંશાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.

(૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્સર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.

(૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એમાં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબરવાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબરવાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશિષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળામાંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી. તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકોને નોટીસ રજૂ. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ સપ્ટેમ્બર તેમજ નવેમ્બર ૨૦૨૪ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એક થી રજૂ કરીએ છીએ, જે નોટીસો રજૂ. એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબરવાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટવાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાંખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાંખવાનો તેમજ તેમના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો ના થાય તો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીલ એકમોને પૂરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-


(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

(બ) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

અમદાવાદ

તારીખ:

[Signature]




ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ નામો આજ રોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

અમદાવાદ

તારીખ: 21 NOV 2024

[Signature]



SOLEMELY AFFIRMED
BEFORE ME




[Signature]
JIGISHA P. SHAH
NOTARY
GOVT. OF GUJARAT

21 NOV 2024

SR. No. 41/24/2024

NOTARY

21 NOV 2024



સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૬/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરટ્રીડ લીમિટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા :-

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧	૪૧૩	કાળુભાઈ મુમ્તાઝભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		કુંકુબેન કાળુભાઈ ભરવાડ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨	૪૧૯	રણછોડભાઈ નટવરલાલ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		કનુભાઈ સાંકળચંદ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		જનકકુમાર જગદીશચંદ્ર તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		શારદાબેન બળદેવભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ ના વિધવા તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		રેખાબેન પ્રવિણકુમાર ના પત્ની તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		કિર્તીકુમાર પ્રહલાદભાઈ ઉર્ફે પ્રવિણકુમાર તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		નીરવ મહેશભાઈ દેસાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩	૪૧૫	અજયભાઈ સુરાભાઈ ભરવાડ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૪	૩૩૭	ભાનુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૫	૩૩૮	યોગીનીબેન કિરીટભાઈ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૬	૩૩૪	મંજુલાબેન કનૈયાલાલ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		ઉર્મિલાબેન વસંતલાલ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		યોગીનીબેન કિરીટભાઈ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પટેલ ઉમેશ નવીનચંદ્ર તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૭	૩૨૫	ધીરુભાઈ અરજણભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૮	૩૨૨	જયંતિભાઈ જીવણભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		જતીનભાઈ ભલુભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		સંજયભાઈ મનુભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		કનુભાઈ અરજણભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૯	૩૨૩	જયંતિભાઈ જીવણભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		રાકેશભાઈ ભલુભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૦	૩૦૨/૧	જયંતિભાઈ કાનાભાઈ ભરવાડ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૧	૩૦૨/૨	વાઘાભાઈ પોપટભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
		રમણભાઈ કાનાભાઈ ભરવાડ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		સુરેશભાઈ ગેલાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		મીનાબેન મુકેશભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		ચિરાગ કમલેશભાઈ ભરવાડ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૨	૩૪૧	અરવિંદકુમાર વસંતલાલ પટેલ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૩	૩૪૨	જયેશભાઈ વિનોદભાઈ મીસ્ત્રી	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		શૈલેષભાઈ વસંતભાઈ પટેલ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		અરવિંદકુમાર વસંતલાલ પટેલ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૪	૨૫૯	હિતેન્દ્રસિંહ મદારસિંહ ગોહિલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૫	૨૯૯	રાજેન્દ્રસિંહ મદારસિંહ ગોહિલ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૬	૨૭૭	કાનજીભાઈ લાલાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પ્રવિણકુમાર ભાનુભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		વાલીબેન દુધાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પીતાંબરભાઈ પશાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		હીતેશભાઈ થોભણભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૭	૨૯૨	દેવાભાઈ ગાંડાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		આલાભાઈ ની વિઘવા ઓરત	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પ્રકાશકુમાર કાંતીલાલ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પ્રવીણ નરસિંહભાઈ વાણીયા તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		સુરેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ વાણીયા તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૮	૨૯૫	નાગજીભાઈ પસાભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૧૯	૨૯૬	કિશોરભાઈ પસાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૦	૨૯૭	સવિતાબેન મેરાભાઈ વાણીયા તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૧	૨૯૮	બળદેવભાઈ પસાભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૨	૨૭૬	નાનીબેન છનાભાઈ ની વિઘવા તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		ધીરુભાઈ મહાદેવભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		રણછોડભાઈ રઘુભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૩	૨૭૮	હુસેનખાન જીવામીયા તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		આરીશખાન ગુલામખાન તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૪	૨૭૯	નિવાજખાન હેમતમીયા સીપાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૫	૨૭૩	કાનજીભાઈ લાલાભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પ્રવિણકુમાર ભાનુભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		વાલીબેન દુધાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		પીતાંબરભાઈ પશાભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		હીતેશભાઈ થોભણભાઈ	ગામ.બાવળા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૨૬	૬૦૩	રામસંગભાઈ હરિભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		મનુભાઈ જીવાભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		કીરીટસિંહ રુપસંગભાઈ તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૭	૬૦૪	ગગુભાઈ કરશનભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૮	૬૦૦	રેખાબેન માધવસંગ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૨૯	૫૯૧	માધવસિંહ સારુભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		મદારસંગ સારુભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૦	૫૫૪	દેવુભાઈ શીભાઈભાઈ ચૌહાણ તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૧	૫૨૫	વિરસંગભાઈ અમરસંગભાઈ પટેરીયા	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૨	૫૨૮	વિરસંગભાઈ અમરસંગભાઈ પટેરીયા	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૩	૪૩૨	પૃથ્વીરાજસિંહ ખુમાનસિંહ ચાવડા	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૪	૪૬૯	હેમુભાઈ હરિભાઈ પટેરીયા તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૫	૪૫૩	માધવસિંહ સારુભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૬	૩૬૬	દીલીપસિંહ કેહુભાઈ તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		મહેન્દ્રકુમાર કાળુભાઈ પટેરીયા	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		મદારસંગ સાહુભાઈ પટેરીયા તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૭	૩૫૫	વ્યોમેશ વિનોદરાય પટેલ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		રેણુકાબેન અનિરુદ્ધસિંહ ચૌહાણ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૮	૩૧૮	રામસીંગભાઈ કાનજીભાઈ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		અમૃતબેન ફતેસિંહના વિઘવા	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
		ગજરાબેન સોમાભાઈ તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૩૯	૨૯૮	લખમણભાઈ ચુંથાજી ઠાકોર તથા અન્ય	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૪૦	૨૯૯	જીતેન્દ્રસિંહ મુળુભા પટેરીયા	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૪૧	૨૯૭	વર્ષા કેતન શાહ	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ
૪૨	૨૪૩	મોડ હરેશભાઈ ઈશ્વરદાન	ગામ.આદરોડા તા.બાવળા જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોય માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :-ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-

કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ: ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ ત્યારબાદ તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૫, તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં. ૪, ૫, ૬, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૪૦ ના જમીનના ખાતેદાર તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેલ હતા. સામાવાળા ક્રમ નં. ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૪૦ના જમીનના ખાતેદાર તા. ૦૬/૦૨/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેલ હતા તથા સામાવાળા ક્રમ નં. ૪ તથા ક્રમ નં.૨૬ થી ૪૧ ના જમીનના ખાતેદાર તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઈલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ કરવા સાથે તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઈલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા

ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગર્વમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાઈ"ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ સપ્ટેમ્બર તેમજ નવેમ્બર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્ષર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્ષર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર

વાળા ઇસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કરછ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02. 12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW &

balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા મોજે. આદ્રોડા, તા.બાવળાના ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં નીચે મુજબ જણાવે છે.

અમો તમામ સામાવાળાઓને મે. ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમીટેડ નાઓએ એક નોટીસ આપી જણાવેલ છે કે, અમારા તમામ સામાવાળાઓના સર્વે નં.૬૦૩, ૬૦૪, ૬૦૦, ૫૯૧, ૫૫૪, ૫૨૫, ૫૨૮, ૪૩૨, ૪૯૯, ૪૫૩, ૩૯૯, ૩૫૫, ૩૧૮, ૨૯૮, ૨૯૯, ૨૯૭, ૨૪૩ વિગેરે સર્વે નંબરોમાંથી ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમીટેડ નાઓ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કી.મી. ટાવર નાંખવા તેમજ હયાત ટાવર લાઈનના એસ.ટી.એલ.એસ. કન્ડક્ટર ફી કરવાના પ્રોજેક્ટ અન્વયે કામ કરવાની પરવાનગી અને અમારી જમીનમાં તેના ટાવર લાઈન ઉભી કરવા બાબતે અમોને નોટીસ આપી જણાવેલ છે તે નોટીસ સામે અમે તમામ સામાવાળા આ નોટીસનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ.

અમારી આ જમીન મોજે આદ્રોડા, તાલુકા-બાવળા, જિલ્લો-અમદાવાદ મુકામે આવેલ છે. જેમાં હાલમાં પણ ડાંગર તથા ઘઉંની ખેતી કરવામાં આવે છે. સદર જમીન ઉપજાવ તથા ફળદ્રુપ છે આ જમીનમાં જો ટોરેન્ટ પાવર થાંભલાઓ નાંખે તો અમો ખેડુતોને પૈસાથી પણ ભરપાઈ ના થાય તેવું મોટું નુકશાન થાય તેમ છે. અમો તમામ ખેડુતો ખેતી કરી અમારૂં ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. ખેતી સિવાય અમો ખેડુતો પાસે ઘર ચલાવવાની અને કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવાનું કોઈ આવક નથી. જો આ ટોરેન્ટ પાવર દ્વારા ૪૦૦ કે.વી. લાઈન પસાર કરવામાં આવે તો અમો તમામ ખેડુતો નિરાધાર થઈ ખુબ જ મુશ્કેલીમાં આવી જઈએ અને કુટુંબ સાથે આપઘાત કરી જીવન ટુકાવવા સિવાય અમારો કોઈ રસ્તો રહેતો નથી.



સદર ૪૦૦ કે.વી. વીજલાઈન પસાર કરવામાં આવે તેવી નોટીસ બાબતે અમો આદરોડા ગ્રામ પંચાયત નાઓએ ઠરાવ નં.૪૩/૨૦૨૫ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ ઠરાવ કરી ખેડુતોને મોટાપાયે ગુકશાન થાય તેમ હોય અને આ વીજલાઈન બાબતે ગ્રામ પંચાયત પણ સખતમાં સખત વાંધો દર્શાવેલ છે જે બાબતે ઉપરોક્ત નંબરથી ઠરાવ કરી ઠરાવની નકલ આ સાથે રજુ કરીએ છીએ જે ધ્યાને લઈ આ વીજલાઈનની મંજૂરી રદ કરવા મે. કરશોજી.

સદર ૪૦૦ કે.વી. વીજલાઈન બાબતે આદરોડા ગ્રામ પંચાયતની ખાસ ગ્રામ સભા મળી ગામના તમામ ખેડુતો ભેગા મળી સદર ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડની આ વીજલાઈન પસાર ન થાય તે બાબતે તમામ ખેડુતોએ માન્ય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ઉર્જા મંત્રીશ્રી અને દેશના વડાપ્રધાનશ્રીને પણ પત્ર લખી તમામ ખેડુતોએ વિરોધ નોંધાવેલ છે. ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશનના કર્તાઓએ જે નોટીસ આપેલ છે તે નોટીસનો સખત વિરોધ દર્શાવીએ છીએ અને આપ સાહેબને અમો ખેડુતો વતીથી એક નમ્ર અરજ છે કે, આ વીજલાઈન પસાર કરવા દેવામાં ન આવે તેવી અમારી માંગણીને ધ્યાને લઈ સદર ૪૦૦ કે.વી. વીજલાઈનની અરજદારની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે તેવી અમારી અરજ છે.

સદર અરજી બાબતે પ્રથમ મુદતે અમોએ ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમીટેડ નાઓને જણાવેલ કે, આ વીજલાઈન ક્યાંથી ક્યાં પસાર થઈ રહી છે તેની અમોને એક માહિતી અને નકશો આપવામાં આવે તો તેવી અમારી આર.ટી.આઈ. ની અરજી પણ ટોરેન્ટ પાવર નાઓએ પરત કરેલ છે પરંતુ આપ સાહેબશ્રીને કેસમાં રજુઆત કરતા એક નકશાનો ચોથો ભાગ રજુ કરેલ છે જેમાં અમુક સર્વે નંબરો બચાવવા માટેનો કારસો કરેલ હોઈ તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. નકશો જોવામાં આવે તો વચ્ચેના નકશામાં સીધી લાઈન બતાવવામાં આવે છે જ્યારે લાઈન પુરી થાય અને લાઈન ચાલુ થાય ત્યાં ત્રણ પ્રકારના વળાંકો આપવામાં આવેલ છે જે બાબત સ્પષ્ટ કરે છે કે, અમુક લાગવગ ધરાવનાર વ્યક્તિઓની લાગવગ ધ્યાને લઈ વીજલાઈન ક્રોસ કરવામાં આવેલ છે. અને નબળા અને ગરીબ ખેડુતોની જમીનને ટારગેટ કરવામાં આવેલ હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. અમો સામાવાળાઓએ વીજલાઈન ક્યાંથી શરૂ થઈ અને ક્યાં પુરી થાય છે ત્યાં સુધીના નકશાઓની માંગણી કરેલ છે પરંતુ આવા કોઈ નકશા અમોને ટોરેન્ટ પાવર લીમીટેડ નાઓએ આપેલ નથી. જેથી તે બાબત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, ટોરેન્ટ પાવર પોતાની મનમાનીથી પોતાને યોગ્ય લાગે તેવા ખેતરોમાં પોતાની લાઈન નાંખી નબળા અને ગરીબ ખેડુતોને ગુકશાન કરી રહ્યા છે જે તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ અરજદારની અરજી નામંજૂર કરવી જોઈએ.

સદર અરજી ટોરેન્ટ પાવરની ૪૦૦ કે.વી. લાઈન બાબતે અમો તમામ સામાવાળાઓનો સખતમાં સખત વિરોધ દર્શાવીએ છીએ અને જે વિરોધ બાબતની દેશની સુપ્રિમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયા આઈ.એ.નં. ૮૫૬૧૮/૨૦૨૦ પીટીશન નં. ૮૩૮/૨૦૧૯ ના જજમેન્ટની નકલ આ સાથે રજુ કરીએ છીએ જે પણ આપ સાહેબશ્રી ધ્યાને લઈ સદર મોજે આદરોડા, તાલુકા-બાવળા, જીલ્લો-અમદાવાદમાંથી પસાર થતી ટોરેન્ટ પાવરની ૪૦૦ કે.વી. લાઈન પસાર કરવાની જે નોટીસ આપી છે તે નોટીસ રદ કરી આવી કોઈ વીજલાઈન કે વીજલાઈનના થાંભલાઓ અમારી ફળદ્રુપ અને ખેતીલાયક જમીનમાંથી પસાર ન કરે અને બળપ્રયોગ કે પોલીસની સહાય લઈ નિર્બળ ખેડુતોને દબાવવાનો પ્રયાસ ન કરે અને અમે અમારી ખેતીલાયક જમીન ટોરેન્ટ પાવરને કોઈપણ સંજોગોમાં આપવા તૈયાર નથી અને અમોને કોઈપણ ભાવ આપવામાં આવે તેવી કોઈપણ અમારી માંગણી નથી. અમારી ફળદ્રુપ જમીન સામે પૈસાની કિંમતને અમો કશું ગણતા નથી અમારૂં જીવન નિર્વાહ અને અમારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવા સારૂ આ એકમાત્ર ખેતી જ અમારૂં સાધન છે જેથી અમારી જીવાદોરી છીનવાઈ ના જાય તે ધ્યાને લઈ અરજદારની અરજી નામંજૂર કરી ટોરેન્ટ પાવરની ૪૦૦ કે.વી. લાઈન ખેડુતોની મંજૂરી સિવાય ન નાંખવા અને કોઈ પ્રોસીજર આગળ ન કરવા સુચના આપવા તથા આ અરજી રદ કરવા મે.કરશોજી.

મોજે. બાવળા, તા.બાવળાના સર્વે નં. ૨૯૫, ૨૯૭, ૩૩૪, ૩૩૮, ૩૪૧, ૩૪૨, ૨૭૯, ૩૯૯, ૨૫૯, ૨૯૮ ના જમીન માલિકોએ તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, સદરજુ જમીન અમોની વડીલોપાર્જિત જમીન છે. અમારી પાસે અન્ય કોઈ જમીન આવેલી નથી. જો આ જમીનમા વીજપોલ ઉભા કરવામાં આવશે તો અમને ખુબ નુકસાન થાય તેમ છે. જેથી આ લાઈન ન નાખવા દેવા અમોની વિનંતી છે.

તારણો

- (૧) સદરજુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;



- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં સંદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૪થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-૩ ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(જ) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(પ) અરજદારશ્રીની તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ બાવળા તાલુકાના મોજે. બાવળા તથા આઢ્રોડા ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહી તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહી અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનુ રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં

આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.


હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ: ૧૩, માહે: માર્ચ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ
તારીખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૨૫

સહી/-
(સુજીત કુમાર)
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત


મામલતદાર(એન.એ.)
અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.
- (૨) પ્રાંત અધિકારી અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, ધોળકા તરફ જાણ સારૂ.
- (૩) મામલતદારશ્રી બાવળા તરફ તરફ જાણ સારૂ.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.



અમદાવાદ મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

182

અરજદાર:

કેસ નંબર: /૨૦૨૪

મે. ટોરેન્ટ પાવર-મીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ ૧૯૫૬,
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ: "સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે
તેના વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ

વિરુદ્ધ

સામાવાળા:

- (૦૧) રવિ (હાંસોલ) નોન ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન ના ચેરમેન
જશવંતભાઈ લક્ષ્મીચંદ શાહ
મો. નંબર: ૯૮૯૮૦ ૩૯૮૯૮
નંબર ૧, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- વેપાર,
રહેવાસી : ગામ મોજે મેલાસણા, તા. સાણંદ,
જી. અમદાવાદ.
- (૦૨) દિનુભા ભાનુભા વાઘેલા
મો. નંબર:
- (૦૩) સાગરભાઈ દેવશીભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૭૦૯૬૭ ૧૫૬૩૯
- (૦૪) અમરતભાઈ કેશાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૦૫) નવઘણભાઈ અંબારામ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૦૪૬ ૭૨૪૫૯
- (૦૬) ભુરાભાઈ ગાંડાભાઈ મગનભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૭૧૪૫ ૭૧૭૪૧
- (૦૭) જીતુભાઈ દશરથભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૭૧૪૩ ૨૬૩૯૮
- (૦૮) બાલાભાઈ માવુભાઈ
મો. નંબર: ૯૫૭૪૦ ૮૬૧૪૧
- (૦૯) ગીતાબેન રમેશભાઈ સોલંકી અને અન્ય
મો. નંબર: ૭૦૪૬૪ ૪૫૭૯૬
- (૧૦) અમીબેન અમરભાઈ સોલંકીના દિકરી તે કુંજલભાઈ
રમેશભાઈ મકવાણાના પત્ની અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૬૨૪૪ ૫૨૧૯૬ / ૮૪૦૧૯ ૫૮૫૩૮
- (૧૧) કાળુભાઈ રામાભાઈ છગનભાઈ
મો. નંબર: ૮૧૫૩૯ ૭૦૬૫૮



- (૧૨) શકરાભાઈ અલુભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૬૩૫૬૩ ૨૭૫૪૪
- (૧૩) કીર્તિભાઈ ડાહ્યાજી ઠાકોર અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૫૮૬૪ ૬૪૬૯૪/ ૯૬૬૨૪ ૧૬૦૫૮
નંબર ૨ થી ૧૩, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે મેલાસણા, તા. સાણંદ,
જી. અમદાવાદ.
- (૧૪) ગટોરભાઈ અભેસંગ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૨૪૯ ૩૬૩૦૮
- (૧૫) લીલાબેન કનુભાઈ મકવાણા અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૭૫૦ ૩૧૧૭૩
નંબર ૧૪ થી ૧૫, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે મખીયાવ, તા. સાણંદ,
જી. અમદાવાદ.
- (૧૬) સોનલબેન પ્રવિણભાઈ કો. પટેલ
મો. નંબર: ૮૭૮૦૭ ૯૧૬૪૮
- (૧૭) કાળુભાઈ બબાભાઈ કો. પટેલ
મો. નંબર: ૯૭૨૫૮ ૭૨૪૪૨/ ૯૬૬૪૯ ૨૮૪૧૯
- (૧૮) પ્રતાપભાઈ કાળુભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૬૩૫૧૨ ૮૪૫૮૪/ ૯૦૯૯૩ ૨૯૪૭૫
- (૧૯) બાબુભાઈ લાલજીભાઈ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૯૮૪ ૧૪૦૮૭/ ૯૧૦૬૬ ૮૩૫૬૪
- (૨૦) સામંતસિંહ ભીખુભા ઝાલા અને અન્ય
મો. નંબર: ૮૨૦૦૦૨૬૪૧૦
- (૨૧) કૃપાબા પ્રધુમનસિંહ વાઘેલાની દિકરી તે કુલદિપસિંહ
જાડેજાના પત્ની અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૨૫૩ ૬૫૮૪૯
નંબર ૧૬ થી ૨૧, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે બકરાણા, તા. સાણંદ,
જી. અમદાવાદ.
- (૨૨) શાંતિભાઈ મણીલાલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૬૨૪૮ ૪૭૫૨૯
- (૨૩) ભયરામભાઈ નરશીભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૧૧૩૨ ૫૪૪૮૭
નંબર ૨૨ થી ૨૩, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે ઝોલાપુર, તા. સાણંદ,
જી. અમદાવાદ.

બાબત:- ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ ૧૬ (૧) મુજબની

અરજી

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસાહે નમ્ર અરજ એ છે કે:-

- (૧) અમો અરજદાર કંપનીએ કંપનીઝ એક્ટ-૧૮૫૬ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાન્ટના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.
- (૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લી.ને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.) - પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ.કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સાથે તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ ૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપનીને આપવામાં આવેલ છે. જે તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ના રોજ ભાગ-૨ના ખંડ-૩થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.
- (૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)-પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકસાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તારીખ ૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આવશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્ષર-બી, એનેક્ષર-સી અને એનેક્ષર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

(૪) અમારું નમ્ર પાણી જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખોદવા તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા, ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈનવાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણના (CEA)થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્ષર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

(૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંશ્લાઘન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.

(૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે /બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્ષર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.

(૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એમાં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબરવાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબરવાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાર્ડ્સ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશિષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળામાંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી. તેઓને કંપનીએ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકોને નોટીસ રજૂ. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ ડિસેમ્બર ૨૦૨૪ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્ષર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ, જે નોટીસો રજૂ. એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો

સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરજી લાઇનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબરવાળા ઇસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરજી પ્રોજેક્ટવાળી લાઇનનું કામકાજ બંધ કરવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઇન નાખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઇનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઇન નાખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોડું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઇન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટવાળી લાઇન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઇલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઇનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઇન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઇન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઇન નાખવાનો તેમજ તેમના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો ના થાય તો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉઘોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પૂરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની ઓનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-

(અ) ઓનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

(બ) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

અમદાવાદ

તારીખ:



ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ નાઓ આજ રોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

S.R. No. 11707/12024

અમદાવાદ

30 DEC 2024

તારીખ:

NOTARY
30 DEC 2024



BEFORE ME
JIGISHA P. SHAH
NOTARY
GOVT. OF GUJARAT
30 DEC 2024



સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૭/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા : -

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧	૫૫	રવિ (હાંસોલ) નોન ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન નાં ચેરમેન જશવંતભાઈ લક્ષ્મીચંદ શાહ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨	૫૬૨	દિનુભા ભનુભા વાઘેલા	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૩	૫૭૦	સાગરભાઈ દેવશીભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		રણજીતસિંહ માનસંગ વાઘેલા	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૪	૫૬૯	અમરતભાઈ કેશભાઈ તથા અન્ય	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૫	૫૭૨	નવધણભાઈ અંબારામ તથા અન્ય	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		હર્ષદભાઈ કુંવરાભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		સુરેશભાઈ મણિલાલ કોળીપટેલ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૬	૫૫૦	ભુરાભાઈ ગાંડાભાઈ મગનભાઈ તથા અન્ય	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૭	૫૩૮	જીતુભાઈ દશરથભાઈ, જનકબેન તે દશરભાઈ નાથુભાઈના વિધવા તથા અન્ય	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૮	૫૩૯	બાલાભાઈ માવુભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૯	૫૩૨	અમીબેન અમરભાઈ સોલંકીના દિકરી તે કુંજલભાઈ રમેશભાઈના મકવાણાના પત્ની	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૦	૫૩૨	ગીતાબેન રમેશભાઈ સોલંકી	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		કેશીબેન તળસીભાઈ સોલંકી	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૧	૫૧૭	કાળુભાઈ રામાભાઈ છગનભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૨	૩૭૮	શકરાભાઈ અલુભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		મનસુખભાઈ અલુભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		વિમલભાઈ અલુભાઈ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૩	૩૭૪	કિર્તીભાઈ ડાહ્યાજી ઠાકોર	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		જાયમલભાઈ ડાહ્યાભાઈ ચૌહાણ	ગામ.મેલાસણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૪	૧૧૨૧	ગટોરભાઈ અભેસંગ	ગામ.મખીયાવ તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		નારણભાઈ બચુભાઈ	ગામ.મખીયાવ તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૫	૧૧૦૮ પૈકી	લીલાબેન કનુભાઈ મકવાણા	ગામ.મખીયાવ તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		મહેશ કનુભાઈ મકવાણા તથા અન્ય	ગામ.મખીયાવ તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧૬	૧૧૦૯	લીલાબેન કનુભાઈ મકવાણા	ગામ.મખીયાવ તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
		મહેશ કનુભાઈ મકવાણા	ગામ.મખીયાવ તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૭	૪૪૨ પૈકી ૧	સોનલબેન પ્રવિણભાઈ કો.પટેલ	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૮	૪૪૨ પૈકી ૨	કાળુભાઈ બબાભાઈ કો.પટેલ	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧૯	૩૫૮	કાળુભાઈ બબાભાઈ પટેલ	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨૦	૩૫૫/૧.	પ્રતાપભાઈ કાળુભાઈ તથા અન્ય	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨૧	૩૫૧ પૈકી	બાબુભાઈ લાલજીભાઈ પટેલ તથા અન્ય	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨૨	૩૪૨	સામંતસિંહ ભીખુભા ઝાલા	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨૩	૩૨૮/૧/૧ પૈકી	દિગ્વીજયસિંહ મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા કૃપાબા તે પ્રદ્યુમનસિંહ વાઘેલાના દિકરી તે કુલદીપસિંહ ના પત્ની તથા અન્ય	ગામ.બકરાણા તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨૪	૮૬૬	શાંતિભાઈ મણીલાલ તથા અન્ય	ગામ.ઝોલાપુર તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૨૫	૪૯૨ પૈકી	ભઈરામભાઈ નરસીભાઈ તથા અન્ય	ગામ.ઝોલાપુર તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧)

અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :-ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ: ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ ત્યારબાદ તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૫, તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫, તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં. ૩, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૨,

૨૩, ૨૪ ના જમીનના ખાતેદાર તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેલ હતા. સામાવાળા ક્રમ નં. ૩, ૫, ૬, ૭, ૧૦ થી ૧૪, ૧૭, થી ૧૯, ૨૩ના જમીનના ખાતેદાર તા. ૦૬/૦૨/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેલ હતા તથા સામાવાળા ક્રમ નં. ૩, ૫, ૬, ૭, ૧૦ થી ૧૪, ૧૭ થી ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪ના જમીનના ખાતેદાર તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. સામાવાળા ક્રમ નં.૧૭ તથા ૧૮ તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ કરવા સાડ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.



અમારુ નમ્ર પાલો જાણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે ચાને કે "પબ્લીક એટ લાજ"ના હિતમાં છે. વધુમાં જાણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાર્ડિ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ ડિસેમ્બર ૨૦૨૪ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસિમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કરછ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના

તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.



સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા મોજે. બકરાણા, તા.સાણંદના સર્વે નં.૩૨૮/૧/૧ પૈકીના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા જણાવેલ છે કે, સદરહુ લાઇન જમીનમાથી વચ્ચેથી નીકળે છે જેથી અમોને મોટુ નુકસાન થાય તેમ છે. તેમજ વળતરની રકમ માર્કેટ રેટ કરતા ઘણી ઓછી છે. જેથી માર્કેટ રેટ મુજબ વળતર ચુકવવા રજુઆત કરેલ છે. સર્વે નં.૩૫૮ ના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા જણાવેલ છે કે, કંપની દ્વારા યોગ્ય વળતર આપવામાં આવતુ નથી.જેથી વધુ વળતર ચુકવવા અમોની રજુઆત છે. સર્વે નં.૪૪૨/૧, ૪૪૨/૨ ના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા જણાવેલ છે કે, અમોની જમીનમાં ડાંગરની પિયત ખેતી થાય છે તેમજ વર્ષમાં ત્રણ પાક લેવામાં આવે છે. કંપની દ્વારા જે વળતર આપવામાં આવે છે જે બજારકિંમત કરતા ખુબ ઓછુ છે. જેથી અમોને યોગ્ય વળતર ચુકવવા વિનંતી છે.

મોજે. બકરાણા, તા.સાણંદના સર્વે નં.૩૫૫/૧, ૩૪૨ ના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે,

The present Responded herein have submitted their formal objections individually and asked for details about layout plan as well as how much compensation they will get. That this Hon'ble Court have directed the applicant officer who was personally present to provide all the details. The applicant officer have also agreed to provide all the details. However the applicant have not provided the plan for layout of tower nor the transmission lines neither the amount of compensation.

The above is NECESSARY especially in light of the fact that the notices received are ONLY qua those persons on whose land the towers are to be installed. No details or notices to those persons upon whose lands the lines are passing is issued and hence the applicant is surely attempting something which is not disclosed any this point of time for reasons best known to the applicant office.

The Applicant be directed to supply all documents and maps and everything which shows the location of the tower and the passing of the transmission line, which was NOT supplied earlier.

That the Jantri Rates for these concerned villages are different and all these villages are adjoining to each other. The applicant company is required to minimum considered the average of highest rates in the villages which are situated side by side.

Important to note, the RECENT SALE DEED of village Bakrana is registered at Serial No. 13907/2024 executed on 13/06/2024 before the Sub-Registrar Office at Sanand is

pertaining to sale of land admeasuring 37,029 sq. meters and the same was sold at Rs.82,78,00,000/-. Thus the value of land per square meter would be Rs.22,355/ - approximately. A copy of the said deed is produced herewith for ready reference.

Last but not the least, the land have been acquired for the sub-station at the rate of Rs.52,00,000/- per vigha. That since the government itself have valued the land at that rate, for all the purposes the valuation would remain the same. The applicant company SHALL considered the base rate of Rs.2,187/sq.meter, as per the above acquisition. A copy of the entry mutated in revenue record for the said acquisition, is produced herewith, for ready reference.

FURTHER the respondents are going to install the transmission line in the YEAR 2025 and they are referring to or relying upon a Jantri value of 2011 which was published based on the data taken before year 2011. That data is 15 years old, which is doubled on a temporary basis, until the NEW JANTRI is finalized. Furthermore, there have been a new survey which have changed to a great extent and the rates are more than 4 time the current rate, as per the oral information received. The same is expected to be finalized soon by the Government of Gujarat. It is therefore required to be considered from Rs.2,187/sq.meter at present OR sale deed Rs.22,355/sq.meter OR subject to the New Jantri rates which will be implemented in the current year, WHICHEVER IS HIGHER.

The Right To Fair Compensation and Transparency In land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 Being section 26 to 30 are reproduced. Thus in light of the provisions as stated in The Right To Fair Compensation and Transparency In land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013, unless the applicant and/or the end user company, pays just and fair compensation to the land owner, the present proceedings deserves to be quashed and set aside.

It is therefore requested that to consider all the above points apart from the written and oral submissions made herein before, in the interest of justice and oblige.

મોજે.ઝોલાપુર, તા.સાણંદના સર્વે નં. ૮૬૬ ના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા તેઓની રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, સદરહુ લાઇન જમીનમાથી વચ્ચેથી નીકળે છે જેની આજુબાજુ પણ અમોની જમીન આવેલ છે જે પડતર રહે તેમ છે. અમોની જમીનની કિંમત ઉંચી છે જેથી પણ નુકસાન થાય તેમ છે. જેથી યોગ્ય વળતર આપવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.



અમો ઉપરોક્ત સામાવાળની સંયુક્ત માલીકીની મોજે ગામ મેલાસણ તા.સાણંદના, જી.અમદાવાદની સામાવાળા નં.૩ ના સર્વે/બ્લોક નં. ૫૭૦ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં. ૧૫૭ પૈકી) (૨) સામાવાળા નં.૫ ના સર્વે/બ્લોક નં. ૫૭૨ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં.૧૫૭ પૈકી) સામાવાળા નં.૬ ના સર્વે/બ્લોક નં. ૫૫૦ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં.૨૬૩) સામાવાળા નં.૭ ના સર્વે/બ્લોક નં.૫૩૮ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં.૨૪૯ પૈકી) સામાવાળા નં.૧૦ ના સર્વે/બ્લોક નં. ૫૩૨ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં.૨૫૨ પેઢી) સામાવાળા નં.૧૧ ના સર્વે/બ્લોક નં. ૫૧૭ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં.૨૫૨ પૈકી) તથા સામાવાળા નં.૧૨ ના સર્વે/બ્લોક નં. ૩૭૮ (જુનો સર્વે/બ્લોક નં.૪૦૧)વાળી ખેતીની જમીન આવેલ છે અને તેમાં અમો ખેતી કરી અમારૂં તથા અમારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ.અને એકમાત્ર સદરહુ ખેતીની જમીન જ અમારી આજીવિકાની જમીન હોઈ અને તેમાં અમો ખેતી કરી અમારુ ગુજરાન ચલાવતા હોઈ જો મે.ટોરેન્ટ પાવરટ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા લાઈન નાંખવામાં આવે તો અમોને ખેતીમાંથી થતી ઉપજની નુકસાની થાય છે અને અમારા આજીવીકાનું અન્ય કોઈ સાધન ન હોઈ તેમજ સદરહુ જમીનમાં ખેતીની ઉપજ સારી થતી હોઈ જે વળતરની રકમ અમોને ચુકવવાની જે લેખિતમાં જાણ કરેલ છે તે રકમ ખુબ જ ઓછી છે તથા જે જંત્રી ની ગણતરી કરેલ છે તે ખોટી કરેલ છે હાલમાં સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક એસટીપી-૧૨૨૦૨૩ -૨૦-૬.૧ સચિવાલય ગાંધીનગર તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૩ થી ગુજરાત રાજ્યમાં જંત્રી દરો તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૩ થી બે ગણા નક્કી કરેલ છે અને તે મુજબ જે તે સર્વે/બ્લોક નંબરના જે જંત્રી દરો છે તેના બે ગણા ગણી ઓછામાં ઓછા તેના ૪.૪ લેખે જે રકમ થાય તે રકમ તથા જે તે સમયે ઉપરોક્ત અરજદાર દ્વારા ઉપરોક્ત જમીન પર લાઈન નાખવાનું ચાલુ થાય ત્યારે અથવા વળતર ચુકવવામાં આવે ત્યારે સરકાર જો નવી જંત્રી અમલમાં લાવે તો તે જંત્રીના ઓછામાં ઓછા ૪.૪ ગણા લેખે જે કિંમત થાય તે કિંમતમાંથી બંનેમાંથી જે રકમ વધારે રકમ હોય તે રકમ અમો વાઘેદારોને કોઈપણ શરત સિવાય વળતર તરીકે ચુકવવા હુકમ કરશોજી અન્યથા સદરહુ સર્વે/બ્લોક નંબરોમાં ઉપરોક્ત લાઈન નાંખવી નહીં.

ઉપરોક્ત સદરહુ જમીન અમો સામાવાળા એ વેચાણ દસ્તાવેજ થી રાખેલ છે અને સદરહુ જમીન વેચાણ માર્કેટ વેલ્યુ થી વધુ અવેજ ચુકવી ને વેચાણ રાખેલ તથા વેચાણ રાખવા માટે અમો ની જીવન ભરની કમાણી તેમજ બચત ભેગી કરી ને રાખેલ છે. વેચાણ રાખી ત્યારથી સદરહુ જમીન અમો સામાવાળા નાઓ દ્વારા ખેડી તથા પોતાનું તથા પોતાના પરિવાર નું ગુજરાન ચલાવતા આવેલ છીએ.

સદરહુ જમીન ખેતી ની જુનીશરત ની જમીન હોવાથી અમો વર્ષો થી તેમાં વિવિધ પ્રકાર ના પાક અમો સામાવાળા ઉગાડતા આવેલ છીએ. વધુ માં સદરહુ જમીન પર નિયમિત પાક લેવામાં આવતો હોઈ જમીન ની

ફળદ્રુપતા ખેતી કરી ને પાક લેવા માટે યોગ્ય અને સારી છે. અને અમો ના જીવન નિર્વાહ માટે ના એક માત્ર સાધન છે.

જો સદર જમીન માં ટાવર લાઈન લગાડવા માં આવે તો સદર જમીન માંથી ઉત્પન્ન થતી આવક માં વર્ષોતર વર્ષ તેમાં ઘટડો થશે. જે નુકશાન કોઈ કાળે ભરાઈ શકે તેમ નથી. પરંતુ આ કામ ના અરજદાર સદરહુ જમીન પર ટાવરલાઈન પસાર કરવા માંગતા હોઈ અમારા ખેતર ના પાક ને નુકસાન થાય એમ હોઈ અમો ને ટાવરલાઈન પ્રસ્થાપિત કરવા અંગે સખત વાંધો છે. વધુ માં સદરહુ ટાવરલાઈન લાઈન થી અમારા ખેતર ના ચારેબાજુ ના વાતાવરણ તથા તેમાં આવતા વિજપ્રવાહ ના કારણે ગરમી નુ પ્રમાણ વધતા આગ લાગવાના તથા કાર્બનડાયોક્સાઈડ ના પ્રમાણ માં વધારો થવાથી ત્યાંનુ વાતાવરણ શ્વાછોશ્વાસ ની ક્રિયા માં તકલીફ કરે તેમ હોઈ ખેતર મા કામ કરવુ માણસો માટે અનુકુળ નથી. વધુમાં વાતાવરણ ની અનુકુળતા ન હોવાને કારણે તથા તેવા વાતાવરણ માં ખેતર ના ઉભા પાક ને નુકશાન થતુ હોઈ સદરહુ ટાવરલાઈન સામે અમોને વાંધો છે.

વધુ માં સદરહુ લાઈન ના કારણે ભવિષ્ય માં અમો સામાવાળા સદર જમીન નો હેતુકેર કરવા માગીએ તો આવો સદર જમીન નો હેતુકેર કરાવવા વધુમાં અમારી લેખિત સંમતી સિવાય અમારી જમીનમાંથી કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી નહી કરવા અમારી અરજ છે.

વધુ માં સદરહુ લાઈન ના કારણે ભવિષ્ય માં અમો સામાવાળા સદર જમીન નો હેતુકેર કરવા માગીએ તો આવો સદર જમીન નો હેતુકેર કરાવવામાં તકલીફ પડતી હોઈ તથા અમો ને જમીન ના વળતર માં નુકસાન થતુ હોઈ સદરહુ ટાવરલાઈન સામે અમોને વાંધો છે. વધુ માં સદર ટાવરલાઈન અમો ના ખેતર ની વચ્ચે થી પસાર થતી હોઈ સદર ટાવરલાઈન થી અમો ના ખેતર ને ભાગ માં વહેચાઈ જાય છે. તથા જો ટાવરલાઈન ખેતર ની જગ્યા એ રોડ-રસ્તા ની બાજુ માંથી પસાર થાય તો ખેતી ની જગ્યા અને ખેતી કરતાં ખેડુતો નો બચાવ થાય તેમ છે. વધુ માં આપ સાહેબ ને જણાવવા નું કે સમય જતાં અમો ની જમીન ની બજાર કિંમત દિન પ્રતિ દિન ખુબ વધી રહી છે અને હાલમાં પણ સદર જમીન ની બજાર કિંમત અરજદાર નાઓ દ્વારા આંકવા માં આવેલ છે તેના કરતાં હકીકત માં બજાર કિંમત ખુબ જ વધારે છે. અને દિન પ્રતિ દિન સદર જમીન ની બજાર કિંમત વધવા ની જ છે અને સદર ટાવર લાઈન ના કારણે અમો સામાવાળા ની જમીન ની બજાર કિંમત માં ઘટાડો થશે જેથી તે નુકશાન પણ ખુબ મોટું થાય તેમ છે. ભવિષ્ય ના નુકશાનને ધ્યાને લઈને વળતર આપવા માં આવેલ નથી જેથી સદરહુ ટાવરલાઈન સામે અમોને વાંધો છે.

અમો આ કામ ના સામાવાળાને મોજે મખીયાવ તાલુકા સાણંદ ના જિલ્લા અમદાવાદ ના રેવન્યુ સર્વે નંબર ૧૧૨૧ વાળી જમીન માથી પસાર થતી ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંગે ની અરજદાર



ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમીટેડ ની વાંધા અરજી સંદર્ભે અમો સામાવાળા ને તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ ની નોટીસ મળેલ જે માં વાંધા હોવા નોટીસ (જેને હવે પછી થી આ લેખિત જવાબ મા "સદરહુ નોટીસ" એ રીતે સંબોધેલ છે) અંગે ની રજુઆત આ લેખિત જવાબ દ્વારા નીચે મુજબ છે. અમો આ કામ ના સામાવાળાને મોજે મખીયાવ તાલુકા સાણંદ ના જિલ્લા અમદાવાદ ના રેવન્યુ સર્વે નંબર ૧૧૨૧ વાળી જમીન માથી પસાર થતી ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંગે ની અરજદાર ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમીટેડ ની વાંધા અરજી સંદર્ભે અમો સામાવાળા ને તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ ની નોટીસ મળેલ જે માં વાંધા હોવા નોટીસ (જેને હવે પછી થી આ લેખિત જવાબ મા "સદરહુ નોટીસ" એ રીતે સંબોધેલ છે) અંગે ની રજુઆત આ લેખિત જવાબ દ્વારા નીચે મુજબ છે. સદરહુ નોટીસ માં ઉલ્લેખ કરેલ સર્વે નં. ૧૧૨૧ કે જે મોજે ગામ મખીયાવ, તાલુકા સાણંદ ના જિલ્લા અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે (જેને હવે પછી થી આ લેખિત જવાબ મા "સદરહુ જમીન" એ રીતે સંબોધેલ છે) તે અમો સામાવાળા ના કબજા ભોગવટા હેઠળ ચાલે છે. જેમાં સદર કામ ના અરજદાર દ્વારા ૪૦૦ કીલોવોટ ની મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન લગાવવા તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા (ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાની કામગીરી હાથ ધરેલ. ઉપરોક્ત સદરહુ જમીન અમો સામાવાળા એ વેચાણ દસ્તાવેજ થી વેચાણ રાખેલ છે. અને સદરહુ જમીન વેચાણ રાખવા માટે અમો ની જીવન ભરની કમાણી તેમજ બચત ભેગી કરી ને રાખેલ છે. વેચાણ રાખી ત્યારથી સદરહુ જમીન અમો સામાવાળા નાઓ દ્વારા ખેડી તથા પોતાનું તથા પોતાના પરિવાર નું ગુજરાન ચલાવતા આવેલ છીએ.

સદરહુ જમીન ખેતી ની જુનીશરત ની જમીન હોવાથી અમો વર્ષો થી તેમાં વિવિધ પ્રકાર ના પાક અમો સામાવાળા ઉગાડતા આવેલ છીએ. વધુ માં સદરહુ જમીન પર નિયમિત પાક લેવામાં આવતો હોઈ જમીન ની ફળદ્રુપતા ખેતી કરી ને પાક લેવા માટે યોગ્ય અને સારી છે. અને અમો ના જીવન નિર્વાહ માટે ના એક માત્ર સાધન છે. જો સદર જમીન માં ટાવર લાઈન લગાડવા માં આવે તો સદર જમીન માંથી ઉત્પન્ન થતી આવક માં વર્ષોતર વર્ષ તેમાં ઘટડો થશે. જે નુકશાન કોઈ કાળે ભરાઈ શકે તેમ નથી.

પરંતુ આ કામ ના અરજદાર સદરહુ જમીન પર ટાવરલાઈન પસાર કરવા માંગતા હોઈ અમારા ખેતર ના પાક ને નુકસાન થાય એમ હોઈ અમો ને ટાવરલાઈન પ્રસ્થાપિત કરવા અંગે સખત વાંધો છે. વધુ માં સદરહુ ટાવરલાઈન લાઈન થી અમારા ખેતર ના ચારેબાજુ ના વાતાવરણ તથા તેમાં આવતા વિજપ્રવાહ ના કારણે ગરમી નુ પ્રમાણ વધતા આગ લાગવાના તથા કાર્બનડાયોક્સાઈડ ના પ્રમાણ માં વધારો થવાથી ત્યાંનુ વાતાવરણ શ્વાછીશ્વાસ ની ક્રિયા માં તકલીફ કરે તેમ હોઈ ખેતર મા કામ કરવું માણસો માટે અનુકુળ નથી.

વધુમાં વાતાવરણ ની અનુકૂળતા ન હોવાને કારણે તથા તેવા વાતાવરણ માં ખેતર ના ઉભા પાક ને નુકશાન થતુ હોઈ સદરહુ ટાવરલાઈન સામે અમોને વાંધો છે.

વધુ માં સદરહુ લાઈન ના કારણે ભવિષ્ય માં અમો સામાવાળા સદર જમીન નો હેતુફેર કરવા માગીએ તો આવો સદર જમીન નો હેતુફેર કરાવવા સદરહુ નોટીસ માં ઉલ્લેખ કરેલ સર્વે નં. ૧૧૨૧ કે જે મોજે ગામ મખીયાવ, તાલુકા સાણંદ ના જિલ્લા અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે (જેને હવે પછી થી આ લેખિત જવાબ મા "સદરહુ જમીન" એ રીતે સંબોધેલ છે) તે અમો સામાવાળા ના કબજા ભોગવટા હેઠળ ચાલે છે. જેમાં સદર કામ ના અરજદાર દ્વારા ૪૦૦ કીલોવોટ ની મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન લગાવવા તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા (ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાની કામગીરી હાથ ધરેલ. વધુ માં સદર ટાવરલાઈન અમો ના ખેતર ની વચ્ચે થી પસાર થતી હોઈ સદર ટાવરલાઈન થી અમો ના ખેતર બે ભાગ માં વહેચાઈ જાય છે. તથા જો ટાવરલાઈન ખેતર ની જગ્યા એ રોડ-રસ્તા ની બાજુ માંથી પસાર થાય તો ખેતી ની જગ્યા અને ખેતી કરતાં ખેડુતો નો બચાવ થાય તેમ છે.

વધુ માં આપ સાહેબ ને જણાવવા નું કે સમય જતાં અમો ની જમીન ની બજાર કિંમત દિન પ્રતિ દિન ખુબ વધી રહી છે અને હાલમાં પણ સદર જમીન ની બજાર કિંમત અરજદાર નાઓ દ્વારા આંકવા માં આવેલ છે તેના કરતાં હકીકત માં બજાર કિંમત ખુબ જ વધારે છે. અને દિન પ્રતિ દિન સદર જમીન ની બજાર કિંમત વધવા ની જ છે અને સદર ટાવર લાઈન ના કારણે અમો સામાવાળા ની જમીન ની બજાર કિંમત માં ઘટાડો થશે જેથી તે નુકશાન પણ ખુબ મોટું થાય તેમ છે. ભવિષ્ય ના નુકશાનને ધ્યાને લઈને વળતર આપવા માં આવેલ નથી જેથી સદરહુ ટાવરલાઈન સામે અમોને વાંધો છે. જેથી અમો ની નમ્ર અરજ છે કે સદરહુ ટાવરલાઈન અન્ય માર્ગે થી પ્રસ્થાપિત કરવા અમો ની નમ્ર અરજ છે.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;

- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૫થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(૪) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(૫) અરજદારશ્રીની તા. તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ સાણંદ તાલુકાના મોજે. મેલાસણા, ઝોલાપુર, બકરાણા, મખિયાવ ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરટ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં

આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફી કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ:૧૩, માહે:માર્ચ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.
- (૨) પ્રાંત અધિકારી અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, સાણંદ તરફ જાણ સારૂ.
- (૩) મામલતદારશ્રી સાણંદ તરફ તરફ જાણ સારૂ.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.



અમદાવાદ મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

કેસ નંબર: /૨૦૨૫

અરજદાર:

મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ ૧૯૫૬,
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ: “સમન્વય”, ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે
તેના વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ

વિરુદ્ધ

સામાવાળા:

- (૦૧) ગોપાલભાઈ પુનાજી અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૪૨૭૮ ૯૧૭૩૦
- (૦૨) રાકેશકુમાર ઈશ્વરભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૮૮૪૯૭ ૮૧૫૨૮
નંબર ૧ અને ૨, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે જુવાલ -રૂપાવટી, તા. બાવળા,
જી. અમદાવાદ
- (૦૩) નટવરભાઈ સોમાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૫૩૭૭ ૯૮૬૬૨
- (૦૪) પ્રવિણભાઈ બબાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૫૩૭૭ ૯૮૬૬૨
નંબર ૩ અને ૪, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે સાલજડા, તા. બાવળા,
જી. અમદાવાદ.
- (૦૫) જુબેદાબેન મુસાભાઈ વ્હોરા અને અન્ય
મો. નંબર: ૭૨૨૭૮ ૬૦૫૦૪, ૮૪૦૧૭ ૧૬૮૯૭
- (૦૬) ચંદનબેન ભગવાનભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૮૪૦૧૦ ૪૫૦૯૦
- (૦૭) બચુભાઈ ગુલામભાઈ વ્હોરા અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૯૮૨ ૦૬૩૪૮
નંબર ૫ થી ૭, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે રૂપાલ, તા. બાવળા,
જી. અમદાવાદ.
- (૦૮) હીરાભાઈ નારણભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર: ૬૩૫૧૮ ૮૬૩૬૬/ ૯૯૨૪૩ ૦૮૮૩૩





(૦૯) રમેશભાઈ ઉજમસીભાઈ અને અન્ય

મો. નંબર: ૬૩૫૨૬ ૬૦૯૧૧

નંબર ૮ અને ૯, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,

સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે સાંકોડ, તા. બાવળા,

જી. અમદાવાદ.

બાબત:- ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ ૧૬ (૧) મુજબની

અરજી

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે:-

(૧) અમો અરજદાર કંપનીએ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાન્ટના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.

(૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લી.ને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.) - પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ.કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સાડ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ ૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપનીને આપવામાં આવેલ છે. જે તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ના રોજ ભાગ-૨ના ખંડ-૩થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

(૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)-પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઇ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન

બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકસાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તારીખ ૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આવશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્સર-બી, એનેક્સર-સી અને એનેક્સર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

(૪) અમારું નમ્ર પાણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખોંચવા તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા, ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈનવાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણના (CEA)થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્સર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

(૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંશાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પાણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.

(૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્સર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.

(૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એમાં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબરવાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબરવાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની

ભરપૂર કોશિષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળામાંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી. તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકોને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ તેમજ જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ, જે નોટીસો રજી. એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઇનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબરવાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટવાળી લાઇનનું કામકાજ બંધ કરવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઇન નાખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઇનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઇન નાખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઇન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટવાળી લાઇન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઇલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઇનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઇન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઇન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઇન નાખવાનો તેમજ તેમના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા

વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો ના થાય તો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પૂરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-

(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

(બ) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

અમદાવાદ

તારીખ:


Torrent Power Grid Ltd.
Ahmedabad

ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ નાઓ આજ રોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

S. P. No. 510/2025

અમદાવાદ

NOTARY

21 JAN 2025



Torrent Power Grid Ltd.
Ahmedabad

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

NOTARY
J. P. SHAH
AHMEDABAD DIST
GUJARAT STATE
REGD. No. 1515/2002

207

સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૮/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમિટેડ
"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા :-

ક્રમ નં.	સર્વે.નં.	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧	૮૭	પરબેન પુનાજી ઠાકોર તથા અન્ય	ગામ.જુવાલ-રૂપાવટી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૨	૮૫	રોકિશકુમાર ઇશ્વરભાઈ તથા અન્ય	ગામ.જુવાલ-રૂપાવટી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૩	૮૫	નટવરભાઈ સોમાભાઈ તથા અન્ય	ગામ.સાલજડા, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૪	૮૬	પ્રવીણભાઈ બબાભાઈ તથા અન્ય	ગામ.સાલજડા, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૫	૩૮૪	બચુભાઈ મુસાભાઈ વ્હોરા તથા અન્ય	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૬	૩૮૩ ૪૨૮ ૮૩૭	ચંદનબેન ભગવાનભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		કપિલાબેન બુદ્ધિસાગર ભગવાનભાઈના વિધવા	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		રોહીતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		મધીબેન ભગવાનભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		રઘુભાઈ બાબુભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		વિરસગભાઈ બબાભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		જગદીશભાઈ રમણભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		મેલાજી કેશાભાઈ ઠાકોર	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
		મોનાબેન ભીખાભાઈ	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૭	૪૪૮	બચુભાઈ ગુલામભાઈ વ્હોરા તથા અન્ય	ગામ.રૂપાલ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૮	૧૮૮	હીરાભાઈ નારણભાઈ તથા અન્ય	ગામ.સાંકોડ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
૯	૧૮૧	રમેશભાઈ અમશીભાઈ તથા અન્ય	ગામ.સાંકોડ, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા

(પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં

કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧) અન્વયે

ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :-ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટરથી

રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૫ ત્યારબાદ તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૫, તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં.૧ થી ૪ તા.૨૬/૦૩/૨૫, સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ થી ૪, ૬, ૭ તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૫ના હાજર રહેલ હતા. જે દરમિયાન કંપનીના અધિકારીશ્રી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી-કંડકટીંગ કરવા સારૂ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી-કંડકટીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા

કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રતીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગર્વમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારું નમ્ર પલે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે ચાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ તેમજ જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં

જાણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કરછ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL. hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02. 12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં:૧ તથા ૨ ના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા જણાવેલ છે કે, જંત્રી ૨૦૧૧ મુજબ બતાવેલ છે અને ગણતરી ૨૦૨૪ મુજબ કરેલ છે જે ખોટું છે. અમોને સને ૨૦૨૪ મુજબની જંત્રીના દસ ગણા ભાવ ચુકવવા અરજ છે. અમારી સને ૨૦૨૪ મુજબની જંત્રી અને બજારકિંમત વચ્ચે ઘણો તફાવત છે જે મંજૂર નથી. ટોરેન્ટ પાવર વાળા અમો ખેડુતોને ધાક ધમકી આપે છે અને કહે છે કે નહીં નાખવા દો તો પોલીસ બોલાવી કામ શરૂ કરીશુ. રો કોરીડોરનું વળતર જંત્રી મુજબ ચુકવેલ નથી જે વળતર જંત્રીના દસ ગણા ચુકવવા અરજ છે.

સામાવાળા ક્રમ નં:૭ દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, સદરહુ ટાવર પોલ, તાર નાખવાથી અમોની જમીનમાં ખુબ મોટું નુકસાન થશે. અમો સંયુક્ત કુટુંબ ખેતી કરી ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. અમારા મોલનું મોટું નુકસાન થશે. અમો ગરીબ ખેડુતને સદર નુકસાનીમાં સરકારમાથી જે નવો પરીપત્ર થયેલ છે તે મુજબ પુરેપુરું વળતર આપવામાં આવે તો અમો મંજૂર છીએ, જે મુજબ રજુઆત કરેલ છે.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણો લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;

- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૫થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર 210 મજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(૪) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/ લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(૫) અરજદારશ્રીની તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ બાવળા તાલુકાના મોજે. જુવાલ-રૂપાવટી, સાલજડા, રૂપાલ, સાંકોડ ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઈએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી

ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

આજ તારીખ: ૦૧, માહે: મે, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૦૧/૦૫/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

- (૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.
- (૨) પ્રાંત અધિકારી અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, બાવળા તરફ જાણ સારૂ.
- (૩) મામલતદારશ્રી બાવળા તરફ તરફ જાણ સારૂ.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.



અમદાવાદ મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

215

કેસ નંબર: /૨૦૨૫

અરજદાર:

મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ ૧૯૫૬,
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ: "સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે
તેના વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ

વિરુદ્ધ

સામાવાળા:

- (૦૧) ફાલ્ગુનભાઈ ભાનુપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૮૨૪૦ ૨૫૨૩૫
- (૦૨) અશોકસિંહ બટુકસિંહ ઝાલા અને અન્ય
મો. નંબર: ૮૧૨૮૩ ૬૪૬૩૫
નંબર ૧ અને ૨, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે માણકોલ, તા. સાણંદ, જી.
અમદાવાદ
- (૦૩) છગનભાઈ લાખાભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૦૪) આનંદીબેન કાનજીભાઈ જાદવ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૦૫) મહેન્દ્રભાઈ ગોરધનભાઈ
મો. નંબર: ૯૦૧૬૦ ૬૯૯૩૭
- (૦૬) ગોવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ
મો. નંબર:
- (૦૭) પાડલબા કૃષ્ણસિંહ
મો. નંબર: ૯૯૭૯૭ ૫૦૦૧૭
- (૦૮) કૃષ્ણકુમાર દિલુભા
મો. નંબર: ૯૯૭૯૭ ૫૦૦૧૭
- (૦૯) ભારતીબા, અજીતસિંહના વિધવા અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૯૭૯૭ ૫૦૦૧૭
- (૧૦) લીલાબેન હમીરભાઈ અને અન્ય
મો. નંબર:
- (૧૧) સનવીરસિંહ પરાક્રમસિંહ
મો. નંબર:



(૧૨) વનરાજસિંહ મેઘુભા
મો. નંબર: ૯૯૭૪૧ ૭૫૮૮૧
નંબર ૩ થી ૧૨, પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
સર્વે રહેવાસી : ગામ મોજે કુંડલ, તા. સાણંદ, જી.
અમદાવાદ.

બાબત:- ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ ૧૬ (૧) મુજબની

અરજી

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે:-

- (૧) અમો અરજદાર કંપનીએ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ ઇલેક્ટ્રીક પ્લાન્ટના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.
- (૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ટી.પી ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લી.ને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.) - પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સાથે તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ ૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપનીને આપવામાં આવેલ છે. જે તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ના રોજ ભાગ-૨ના ખંડ-૩થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.
- (૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)-પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન

બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકસાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તારીખ ૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આવશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્સર-બી, એનેક્સર-સી અને એનેક્સર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

(૪) અમારું નમ્ર પાણી જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા, ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદર ટાવર લાઈનવાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદર પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણના (CEA)થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્સર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

(૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંશાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.

(૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે /બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્સર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.

(૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એમાં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબરવાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબરવાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની

ભરપૂર કોશિષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળામાંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી, તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકોને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ, જે નોટીસો રજી. એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઇનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબરવાળા ઇસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટવાળી લાઇનનું કામકાજ બંધ કરવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઇન નાખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઇનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઇન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઇન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટવાળી લાઇન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઇનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઇન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઇન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઇન નાંખવાનો તેમજ તેમના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા

વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો ના થાય તો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પૂરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-

(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

(બ) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

અમદાવાદ

તારીખ:



ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ નાઓ આજ રોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

S.R. No... ૫૫૩ / 2025

અમદાવાદ

NOTARY

27 JAN 2025



27 JAN 2025

તારીખ:



BEFORE ME

Page 5 of 6

JIGISHA P. SHAH
NOTARY
GOVT OF GUJARAT

27 JAN 2025

સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૦૮/૨૦૨૪/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાણા :-

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૧	૧૦૭૪	માવજીભાઈ જેમાભાઈ જયંતિભાઈ દાનાભાઈ મનુભાઈ મોહનભાઈ તુલસીબેન અંબારામ સજનબેન ભીખાભાઈ વાઘેલા વિલાસબા બટુકસિંહ ઝાલા ભાનુપ્રસાદ મણીલાલ બ્રહ્મભટ્ટ તથા અન્ય	મોજે.માણકોલ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૨	૩૨૪	છગનભાઈ લખાભાઈ તથા અન્ય	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૩	૨૬૦	મહેન્દ્રભાઈ ગોરધનભાઈ	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૪	૩૩૧	ગોવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૫	૩૫૯	પાર્શ્વભા કૃષ્ણસિંહ	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૬	૩૫૭	કૃષ્ણકુમાર દિલુભા	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૭	૩૫૮	દેવેન્દ્રસિંહ અજીતસિંહ તથા અન્ય	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૮	૨૫૮	દેવેન્દ્રસિંહ અજીતસિંહ તથા અન્ય	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૯	૪૬૧	લીલાબેન હમીરભાઈ તથા અન્ય	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૧૦	૪૬૦	સણવીરસિંહ પરાક્રમસિંહ	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૧૧	૪૫૯	વનરાજસિંહ મેઘુભા	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત

પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના

કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧)

અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :-ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટરથી રી-

કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ: ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમિટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ ગેરહાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારીશ્રી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી જ.પ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ કરવા સાથે તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કિલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ

લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્ટ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે ચાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપુર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્ષર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્ષર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કરછ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની

જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL. hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02. 12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં:૨ના ખેડૂત ખાતેદાર દ્વારા જણાવેલ છે કે, સવિનય જણાવવાનું કે, મોજે. કુંડલ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ સર્વે નંબર - ૩૨૪ વાળી અમારી માલિકીની જમીન આવેલ છે. જેનું ક્ષેત્રફળ ૨-૮૪-૪૧ છે. જેમાંથી ટોરેન્ટ પાવરની ૪૦૦ કે.વી.ની લાઈન પસાર કરવાનું ઉક્ત નોટીસથી જણાવવામાં આવેલ છે. સદરહુ સર્વે વાળી જમીનમાંથી સંપૂર્ણ વચ્ચેથી ૪૦૦ કે.વી.ની લાઈન પસાર તથા એક ટાવર લગાવવાનું નોટીસથી જણાવેલ છે. જેમાં અમારી માલિકીની જમીનમાં ઘણું મોટું નુકશાન ભોગવવાનો વારો આવે તેમ જણાય છે. મુદ્દા. નં ૧ :- ગુજરાત સરકારશ્રીના ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ મુજબ આવનાર નવી જંત્રીના ૨૦૦% લેખે વળતર ચુકવવા વિનંતી છે. મુદ્દા. નં ૨:- ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન સદરહુ જમીનમાંથી વચ્ચે વચ્ચેથી પસાર થાય છે. જમીન ૨ ભાગમાં વહેચાય છે તો આ સર્વે પૂરતો ટુકડા ધારા નિયમ ના લાગુ પડે તેવો હુકમ કરવા વિનંતી છે.

તથા સામાવાળા ક્રમ નં:૩ થી ૧૧ ના ખેડૂત ખાતેદારો દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવે છે કે, અમો સામાવાળાનાઓની માલિકીની જમીનમા હાલમા આ કામના અરજદાર દ્વારા જે આયોજન કરીને વીજ લાઈન પસાર કરવાના છે તેમા ખુબજ વિશાળ પ્રમાણમા તેઓના કનેક્શન માટે જગ્યા જમીનમા રોકવાના હોઈ જેથી અમોની ખેતીની જમીનમા અમો ખેતી કરી શકીએ નહી તેવી પરીસિથતી ઉભી થાય તેમ છે અમોની માલિકીની જમીનમા આ કામના અરજદારનાઓના કનેક્શન ઉભા કરવામા આવે તો પ્રથમ અમારા ટ્રેક્ટર તથા જમીન મા ખેતીમા ઉપયોગ મા લેવાતા સાધનો દ્વારા ખેતી કરવામા ખુબ જ અડચણરુપ બને તેમ છે ત્યારબાદ અમો ઘરના પરીવાર સાથે તથા અમારા પશુ તથા ઢોર સાથે જમીનમા અવર જવર કરતા હોઈ તથા ખેતી પણ કરતા હોઈ અમોની માલિકીની જમીનમા પાણીનો પણ ઉપયોગ કરતા હોઈ તથા જમીનમા પાણી રાખવુ પડતુ હોઈ આ હેવી વીજ કનેક્શનના કારણે અમારા પરીવાર તથા અમારા પરુ ઓને જીવનુ જોખમ રહેવાની પુરેપુરી સંભાવના છે તથા કંટ જેવા કીરસા હાલમા ખુબજ પ્રમાણમા આ અરજદાર લોકોની બેદરકારી ના કારણે થતુ હોઈ અમારા માલિકીની જમીનમા પણ તેવો ભય રહેલો છે તથા અમોના પરીવારને કે અમારા પશુ પ્રાણી જમીનમા જતા હોઈ તો અમો અરજદારની ધ્યાન બહાર પણ આ વીજ કનેક્શન ની લાઈનમા કંટ આવતા પણ મૃત્યુ પામવાની સંભાવના હોઈ જેથી આ તમામ જવાબદારી કોના શીરે રહેશે



આવો કોઈ બનાવ ના બને અને બને તો કોન જવાબદાર રેહેશે તેવા તમામ કારણોસર આ વીજ કનેક્શન અમો માલીકીની ખેતર માથી પ્રવેશ કરવા .પર પ્રતીબંધ મુકવાનો હુકમ કરવા મહેરબાની કરશોજી.

વધુમા આ વીજ કનેક્શન મા વીજ પસાર થતા ખુરજ વધારે પ્રમાણમા અવાજદ થતો હોઈ અમો ખેડુતો બહેરા થવાના બનાવો પણ બનાતા હોઈ જેથી અમો ખેડુતો નાઓને શારીરીક કે માનસીક રોગ ના ભોગ બનતા હોઈ જેથી પણ સદરહુ વીજ કનેક્શન અમારા માલીકીની જામન માથી પસાર ના કરવા સારુ અમો આ જવાબ આપી સખત વાંધો જાહેર કરીએ છીએ.

વધુમા અમો સદરહુ જમીનમા ભવિષ્યમા કોઈ બાધકામ કરવાનુ થાય તો તે માટે વીજ લાઈન પસાર થતી હોવાથી જરૂરી પરીમીશન નો પણ બાધ નડતો હોઈ અથવા તો સદરહુ જમીન બીનખેતી કરવાની થાય તો તેમા પણ અમો ને ખુબ જ હેરાન પરેશાન થવુ પડતુ હોઈ જેથી તમામ પરમીશન ના મલે તો અમો ખેડુતો એ ના હક્ક ના નુકશાન મા ઉતરવુ પડે તેવી પરીરસિથતી હોઈ જેથી પણ સદરહુ વીજ લાઈન પસર કરવા સામે સખત વાંધો છે.

વધુમા હાલમા સદરહુ જમીનના ભાવો ખુબ જ આસમાને પહોચ્યા હોવા છતા આ કામના અરજદાર દ્વારા જમીનનુ યોગ્ય વળતર પણ આપવા તૈયાર ના હોઈ જેથી તમામ ખેડુતો ને ફક્ત નજીવી રકમ આપી ને શોષણ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા હોઈ જેથી પણ આ વીજ લાઈન પસાર કરવા સામે સખત વાંધો હોઈ આમ, ઉપરોલકત જણાવેલ તમામ શરતો નુ યોગ્ય નિવારણ લેખીત મા આવી શકતુ હોઈ તો જ અમો ખેડુતો તેમા વીચારણા કરી આગળ પગલુ લેશુ તેવી અમો આ કામના અરજદાર વિરુદ્ધ મા આ લેખીત જવાબ તથા દલીલો રજુ કરી આપ સાહેબ શ્રીને જણાવીએ કે સદરહુ વીજ લાઈન ખેડુતો ના હીતમા ના હોઈ જેથી બંધ કરવા તથા તે બાબતે આપ નામદાર સાહેબ શ્રીને ન્યાયી અને વાજબી લાગે તેવો નીર્ણય લેવા મહેરબાની કરશોજી. જે મુજબ જણાવેલ છે.

તારણો

- (૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- 
- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
 - b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
 - c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
 - d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૫થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(૪) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(૫) અરજદારશ્રીની તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે. સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ સાણંદ તાલુકાના મોજે. માણકોલ, કુંડળ ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઝા લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહી તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહી અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે મુજબ લાઇન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ:૦૭, માહે:એપ્રિલ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૦૭/૦૪/૨૦૨૫

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ



- ✓(૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારું.
- ✓(૨) પ્રાંત અધિકારી અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, સાણંદ તરફ જાણ સારું.
- ✓(૩) મામલતદારશ્રી સાણંદ તરફ તરફ જાણ સારું.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.

અમદાવાદ મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

કેસ નંબર: /૨૦૨૫

અરજદાર:

મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ ૧૯૫૬,
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ: "સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે
તેના વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ

વિરુદ્ધ

સામાવાળા:

- (૦૧) માધુભાઈ હલુભાઈ ગોહિલ
મો. નંબર: ૮૨૩૮૩ ૮૨૦૧૮
- (૦૨) બિપીનભાઈ નારણભાઈ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૩૨૭૦ ૫૬૪૬૯
- (૦૩) પ્રવિણભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ અને અન્ય
મો. નંબર: ૯૩૨૭૦ ૫૬૪૬૯
સર્વે પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,
રહેવાસી : ગામ મોજે બકરાણા, તા. સાણંદ, જી.
અમદાવાદ

બાબત:- ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ ૧૬ (૧) મુજબની

અરજી

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે:-

(૧) અમો અરજદાર કંપનીએ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ
ઇલેક્ટ્રીક પ્લાન્ટના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.

(૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ
એનર્જી ટ.પ ગ્રીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના
હસ્તક આવેલ કંપની દ્વારા ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લી.ને વીજ
પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦



(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઇલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાંખવાનો તેમજ તેમના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો ના થાય તો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શીયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પૂરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-

(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણના (CEA)થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે જે આ સાથે એનેક્સર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

- (૫) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંસાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.
- (૬) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે /બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્સર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.
- (૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એમાં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબરવાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબરવાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશિષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળામાંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી. તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકોને નોટીસ રજૂ. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ, જે નોટીસો રજૂ. એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરબુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબરવાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરબુ પ્રોજેક્ટવાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.) - પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ.કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ કરવા સાથે તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ ૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપનીને આપવામાં આવેલ છે. જે તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ના રોજ ભાગ-૨ના ખંડ-૩થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

(૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.)-પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટર થી રી-કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તારીખ ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકસાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તારીખ ૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આવશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્સર-બી, એનેક્સર-સી અને એનેક્સર-ડી થી રજૂ કરેલ છે.

(૪) અમારું નમ્ર પાણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા, ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફસ ઓથોરીટીને આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈનવાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત

(બ) આ અરજીની એકદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

અમદાવાદ

તારીખ:

[Signature]



ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ નામો આજ રોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

અમદાવાદ

તારીખ: 21 FEB 2025

[Signature]



S.R. No... 908/2025

NOTARY

21 FEB 2025

BEFORE ME

JIGISHA P. SHAH
NOTARY
GOVT OF GUJARAT

21 FEB 2025



અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા:-

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૦૧.	૪૪૫	માધુભાઈ હલુભાઈ ગોહિલ	મોજે.બકરાણા, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૦૨.	૪૪૬ પૈકી ૧	બીપીનભાઈ નારણભાઈ પટેલ તથા અન્ય	મોજે.બકરાણા, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
૦૩.	૪૪૬ પૈકી ૨	પ્રવિણભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ તથા અન્ય	મોજે.બકરાણા, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના

કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧)

અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :-ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડક્ટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ: ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૫ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૫ ત્યારબાદ તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ અને ૩ તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારીશ્રી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી ૪.૫ ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ

ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજીત ૯૦ કીલોમીટર ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઇન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ કરવા સારૂ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઇન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ ની લાઇન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઇન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઇન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઇન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઇન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઇન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારુ નમ્ર પણે જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઇન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઇન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઇન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના હિતમાં છે યાને કે “પબ્લીક એટ લાર્જ”ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજી. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજી.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે.કરછ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નજીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.

તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં:- ૩ ના ખેડુત ખાતેદાર દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, સદરહુ જમીન અમોએ તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૩ના રોજ ઉંચા વેચાણ ભાવથી ખરીદ કરેલ છે. વીજ વાયર અને ટાવરો મારી ખેતીની જમીનમાં નાખવાથી મને ખેતીની ઉપજ કાયમને માટે ઓછી થઈ જશે તેમજ અમને જાનહાનિ થવાના ભયના કારણસર અમોની મોંઘીદાટ જમીનની વેલ્યુ ઘટી જાય તેમ છે જે કોઈ વેચાણ લેશે નહીં. સદરહુ બાબતે અમોએ ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડના મેનેજરને વાંધા અરજી આપેલ છે.

આ કામના સામાવાળા ક્રમ નં. ૧ દ્વારા તેઓની લેખિત રજુઆતથી જણાવેલ છે કે, સદરહુ જમીન અમો માલિકી હકે ધારણ કરીએ છીએ. અમો અમારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. અમારી જમીનમાં જો વીજળીના વાયર કાઢવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં કોઈ વેચાણ લેશે નહીં. તેમજ અમોની આવકનો સ્ત્રોત બંધ થઈ જશે. આ અરજીથી ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડને મારી જમીનમાં પ્રવેશવાની તથા કોઈપણ પ્રકારનું કામ કરવાની પરવાનગી વગર ખોદકામ ન કરવા તથા ટાવર ન મુકવા અંગે વાંધા અરજી આપેલ છે. જે મુજબ રજુઆત કરેલ છે.

- (૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- a. the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- b. the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- c. except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- d. in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

- (૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૯૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૫થી પરવાનગી માંગેલ છે.

- (૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/ ૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના હસાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(જ) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ, તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(પ) અરજદારશ્રીની તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

આમ, સમગ્ર હકીકતો, પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ સાણંદ તાલુકાના મોજે. બકરાણા ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઘએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત

વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહીં તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહીં અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનું રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

હુકમની જાણ પક્ષકારોને કરવી.

આજ તારીખ:૦૭, માહે:એપ્રિલ, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૦૭/૦૪/૨૦૨૫

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત

મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-

- ✓(૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી આયોજન કરી અમલવારી કરવા સાડ.
- ✓(૨) પ્રાંત અધિકારી અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, સાણંદ તરફ જાણ સાડ.
- ✓(૩) મામલતદારશ્રી સાણંદ તરફ તરફ જાણ સાડ.
- (૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.



સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

અમદાવાદ મહેરબાન જીલ્લા કલેક્ટર સાહેબ સમક્ષ

કેસ નંબર: /૨૦૨૫

અરજદાર:

મે. ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીમીટેડ
એ નામની કંપની જે કંપનીઝ એક્ટ ૧૯૫૬,
હેઠળ નોંધાયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર ઓફીસ: "સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન,
નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે
તેના વતી અને તરફથી ડીરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ

વિરુદ્ધ

સામાવાળા:

(૧) ખોડાભાઈ નાથભાઈ

(૨) હરિભાઈ નાથભાઈ

મો. નંબર: ૯૭૨૩૬૨૭૫૬૬

સર્વે પુખ્ત ઉમરના, ધંધો- ખેતી,

રહેવાસી : ગામ મોજે કુંડલ, તા. સાણંદ, જી. અમદાવાદ

બાબત:- ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ના કાયદાની કલમ ૧૬ (૧) મુજબની

અરજી

અમો અરજદાર કંપનીની આપ સાહેબને માનસહ નમ્ર અરજ એ છે કે:-

(૧) અમો અરજદાર કંપનીએ કંપનીઝ એક્ટ-૧૯૫૬ અન્વયે રજીસ્ટર્ડ થયેલ લીમીટેડ કંપની છે,
જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ શહેર અમદાવાદમાં આવેલ છે. કંપની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો તેમજ
ઇલેક્ટ્રીક પ્લાન્ટના પ્રસારણ અંગેનું કાર્ય કરે છે.

(૨) અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ
એનર્જી ટી.પી ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના
હસ્તક આવેલ કંપની ડરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી. દ્વારા ટોરેન્ટ પાવર-ગ્રીડ લી.ને વીજ
પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦
કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી.) - પિરાણા (ટી) ટાવર



(૩) કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ ૪૦૦ કે.વી. મઝી સર્કિટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ વધાત પિરાણા (પી.જી.)-પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડક્ટર થી રી-કંડક્ટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં ક્યા ક્યા ગામમાંથી સદરકુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તારીખ ૧૧.૦૬.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાચ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકસાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર મુજરાત ગવર્નમેન્ટ હાલમાં પ્રસિધ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તારીખ ૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આવશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જે નોટીસની નકલ એનેક્સર-બી, એનેક્સર-સી અને એનેક્સર-ડી થી રજુ કરેલ છે.

Page 2 of 6

(પ) કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંશાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.

(દ) કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્સર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.

(૭) કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્સર-એમાં જણાવેલ ગામોની સર્વે/બ્લોક નંબરવાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબરવાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્સર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગવર્મેન્ટની ગાઈડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશિષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળામાંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી. તેઓને કંપનીએ એનેક્સર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકોને નોટીસ રજૂ. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જાન્યુઆરી/ફેબ્રુઆરી/માર્ચ ૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્સર-એફ થી રજૂ કરીએ છીએ, જે નોટીસો રજૂ. એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્સર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદર બ્લોક લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબરવાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદર બ્લોક પ્રોજેક્ટવાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૮) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

(૯) પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઇલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

(૧૦) કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાંખવાનો તેમજ તેમના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારું કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ ૪.૫ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એનર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો ના થાય તો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીલ એકમોને પૂરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

(૧૧) સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

(૧૨) સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-

(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

(બ) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

અમદાવાદ

તારીખ:

[Signature]



ઈકરાર

અમો અરજદાર કંપની વતી ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રમોદ જી. પટેલ નાઓ આજ રોજ શહેર અમદાવાદમાં ઈકરાર કરી જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપરોક્ત અરજીમાં લખેલ તમામ હકીકત અમારા લખાવ્યા અને જણાવ્યા મુજબ સાચી અને ખરી છે.

અમદાવાદ

તારીખ: - 7 MAR 2025

[Signature]



S.R. No... 1192/2025

NOTARY

- 7 MAR 2025

BEFORE ME

[Signature]

NOTARY PUBLIC

- 7 MAR 2025



સુજીત કુમાર(આઈ.એ.એસ.) જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદની કોર્ટમાં

નં.એન.એ/પા.ટ્રા./ટોરેન્ટપાવર/કેસ.નં.૧૧/૨૦૨૫/ફાઈનલ ઓર્ડર

અરજદાર:- મે. ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ

"સમન્વય", ૬૦૦ તપોવન, નહેરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

વિરૂદ્ધ

સામાવાળા:-

ક્રમ નં.	સર્વે.નં	ખાતેદારનું નામ	ગામ
૦૧.	૪૫૭	ખોડાભાઈ નાથાભાઈ તથા અન્ય	મોજે.કુંડળ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ

વિષય:-૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ માટે ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ની કલમ :-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબત.

મોજે :-ઉક્ત કોલમમાં દર્શાવેલ સર્વે નંબર

ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ ના ભાગ-૩ ની કલમ ૧૬(૧) તળેની કાર્યવાહી

આ કેસની ટૂંકમાં વિગત એવી છે કે, ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઈનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ: ૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવા અંગે ઉક્ત ટેબલમાં દર્શાવેલ કબજેદાર દ્વારા રૂકાવટ કરેલ હોઈ ઈન્ડિયન ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે ઉપરોક્ત કામ કરવાની પરવાનગી આપતો હુકમ આપવા બાબતે તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૫ ના રોજ મે.ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ દ્વારા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

જેથી આ કામના અરજદાર અને ખેડૂત ખાતેદારોને રૂબરૂ સાંભળીને નિર્ણય લેવા બાબતે પક્ષકારોને પ્રથમ મુદ્દત માટે તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૫ ત્યારબાદ તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૫ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ હતા તેમજ સામાવાળા તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૫ના રોજ હાજર રહેલ હતા. કંપનીના અધિકારીશ્રી દ્વારા નિયમોનુસાર વળતર ચુકવી આપવા અંગે બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજુઆત

અમો અરજદાર કંપનીને ખાવડા (કચ્છ) ખાતે આવેલ ટ્રાન્સમીશન યોજના રીન્યુએબલ એનર્જી જ.પી. ગીગા વોટ પાવરના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ભારત સરકારના મિનીસ્ટ્રી ઓફ પાવરના હસ્તક આવેલ કંપની રૂરલ ઇલેક્ટ્રીફિકેશન કંપની લી.દ્વારા ટોરન્ટ પાવર-ગ્રીડ લીને વીજ પુરવઠાના પરીવહન તેમજ પ્રસારણ હેતુ ૪૦૦ કે. વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ કરવા સાડ તથા તેના સમારકામ માટે ધી ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબ તેમજ ટેલીગ્રાફ એક્ટ મુજબ સત્તા અને અધિકાર અમો અરજદાર કંપની ને આપવામાં આવેલ છે જે તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૨૪ ના રોજ ભાગ -૨ ના ખંડ -૩ થી ભારત સરકારના ગેઝેટમાં પેજ નંબર ૭૭૨થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

કંપનીને મળેલ સત્તા અને મંજૂરી બાદ સદર ૪૦૦ કે.વી. મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઈન અંદાજીત ૬૦ કીલોમીટર ટાવર લાઈન લગાવવાના તેમજ હયાત પિરાણા (પી.જી)- પિરાણા (ટી) ટાવર લાઈન ના એચ.ટી.એલ.એસ કંડકટર થી રી- કંડકટરીંગ ની લાઈન બાબતે જાહેર જનતા પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ વાળી ટાવર લાઈન સંદર્ભે દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરાવેલ છે. આ નોટીસમાં કયા કયા ગામમાંથી સદરહુ ટાવર લાઈન પસાર થવાની છે, લઈ જવાની કે વચ્ચેથી જવાની છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી એટલું જ નહીં પરંતુ કંપની તરફથી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજથી સંદેશ વર્તમાન દૈનિક પત્રમાં, રાજસ્થાન પ્રત્રીકા માં તેમજ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં નોટીસ છપાવી જેમાં આ ટાવર લાઈન બાબતે સાથ અને સહકાર આપવા તેમજ સદર લાઈન બાબતે ઝાડ કે ખેતીને નુકશાન કે ખોટ ઉભી થાય તો તે માટે કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનું વળતર ગુજરાત ગર્વમેન્ટે હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ ગાઈડ લાઈન તા.૦૧.૦૩.૨૦૨૪ના અનુસાર ચુકવી આપવામાં આપશે તે મુજબની જાહેર નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

અમારું નમ્ર પણું જણાવવાનું કે કંપનીને ટાવર લાઈન નાંખવા માટે ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ના કાયદાની કલમ-૧૬૪ મુજબના અધિકારો આપવામાં આવેલા અને તેને માટે ટાવર લાઈન ખેંચવા માટે તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવા માટે તેમજ બ્રેકેટ વિગેરે નાંખવા માટે અને તેવા વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવા ખાડાઓ ખોદવા વિગેરે માટે ધી ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ના કાયદા મુજબ જે પાવર્સ ટેલીગ્રાફ્સ ઓથોરીટીને આપવામાં આપવામાં આવેલ તે તમામ પાવર્સ કંપનીને આપવામાં આવેલ છે સબબ તેવી મળેલ સત્તા અન્વયે કંપની કાયદેસર રીતે સદરહુ ટાવર લાઈન વાળા પ્રોજેક્ટનું કામ કરી રહી છે. સદરહુ પ્રોજેક્ટ જાહેર જનતાના

હિતમાં છે યાને કે "પબ્લીક એટ લાર્જ"ના હિતમાં છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, કંપની તરફથી જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ કલમ ૧૬૪ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MOP)ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધીકરણના (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે. જે આ સાથે એનેક્ષર-ઈ થી રજૂ કરેલ છે.

કંપનીએ સદર રૂટમાં આવતા તમામ ટાવરો માટે તેમજ તે બાબતના વાયરો તેમજ અન્ય મટીરીયલ્સ કંપનીએ હાલમાં મેળવી લીધેલ છે તેમજ સદર ટાવર લાઈન નાંખવા માટે જે સંશાધન તેમજ અન્ય ટીમ જે આ ટાવર લાઈન નાંખવામાં મદદરૂપ થવાની છે જે તમામ ટીમોનું ગઠન પણ કંપનીએ કરી લીધેલ છે.

કંપનીની સદર ટાવર લાઈન આ સાથે રજૂ કરેલ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે/બ્લોક નંબરમાંથી પસાર થાય છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે અને સદર બ્લોક/સર્વે નંબરના ગામ નમુના નંબર ૭ની નકલો એનેક્ષર-એ/૧ થી એ/૩૯માં સામેલ રાખેલ છે.

કંપનીએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામોની સર્વે/ બ્લોક નંબર વાળી જમીનમાંથી ટાવર લાઈન લઈ જવાના છીએ તેમજ વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરવાના છે તે સર્વે નંબર વાળી જમીનમાં ચાલતા નામોમાંથી એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ વ્યક્તિઓને ગુજરાત ગર્વમેન્ટની ગાર્ડ લાઈન્સ મુજબ વળતર ચુકવીશું તેવી રૂબરૂમાં સમજણ આપવાની ભરપૂર કોશીષ કરેલ તેમજ આ બાબતે નોટીસ આપવા જતા સામાવાળા માંથી ઘણાએ વાંધા સાથે નોટીસ સ્વીકારેલ છે તેમજ જે સામાવાળાઓએ નોટીસ સ્વીકારેલ નથી તેઓને કંપનીએ એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ ગામના સર્વે નંબરોના માલિકને નોટીસ રજૂ. પોસ્ટ દ્વારા તેમજ રૂબરૂ હાથો હાથ જાન્યુઆરી/ ફેબ્રુઆરી/માર્ચ-૨૦૨૫ ના રોજથી મોકલી આપેલ છે જે નોટીસ આ સાથે એનેક્ષર- એફ થી રજૂ કરીએ છીએ જે નોટીસો રજૂ.એ.ડી. કરેલ છે તેની વિન્ડો સ્લીપો આ સાથે એનેક્ષર-જી થી રજૂ કરેલ છે. સદરહુ લાઈનનું કામકાજ કરવામાં એનેક્ષર-એ માં જણાવેલ સર્વે/બ્લોક નંબર વાળા ઈસમો અડચણ ઉભી કરી રહ્યા છે અને સદરહુ પ્રોજેક્ટ વાળી લાઈનનું કામકાજ બંધ કરાવી દેવાનું જણાવી રહ્યા છે. માટે તેઓને સામાવાળા તરીકે જોડેલા છે. સબબ અમે લાઈન નાખવાનું કામ બંધ કરી દઈએ તો કામ પુરૂ કરવામાં મોડું થાય અને પ્રોજેક્ટ ધારેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થઈ શકે નહીં તેમજ કંપની તરફથી સદર લાઈનના પ્રોજેક્ટ માટે જે મટીરીયલ્સ મંગાવી રાખેલ છે તેમજ તેવી લાઈન નાંખવા માટે ટીમ બનાવી દીધેલ છે આમ કંપનીને આર્થિક રીતે મોટું નુકશાન થાય તેમ છે માટે હાલની આ અરજી સામાવાળાઓનું ઓબ્ટ્રેક્શન અને રેસીટન્સ દૂર કરવા માટે તાકીદે કરવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયેલ છે.



ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન વિદ્યુતની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર જનતાના લાભમાં ભારત સરકારના આદેશ અનુસાર નાંખવામાં આવી રહી છે જેને કામ અને કમ્પ્લીશન અંગે ભારત સરકારને અહેવાલ આપવાનો રહે છે.

પ્રોજેક્ટવાળી લાઈન હેઠળ આવતી જમીનોમાં કંપનીને ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ ૨૦૦૩ અને ધી ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ અન્વયે મળેલી સત્તાઓ હેઠળ પ્રવેશ કરી ઓવરહેડ લાઈનના વાયરો લઈ જવાને અને ટાવર ઉભા કરવાના અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. કંપનીના માણસો દ્વારા એનેક્સર-એ માં જણાવેલ જમીનમાં જે ટાવર તેમજ ટાવર લાઈન નાંખવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે કાયદા હેઠળ મળેલ સત્તા અને અધિકાર અન્વયે છે. સબબ કંપનીનું કામ ઓવરહેડ લાઈન નાંખવાનું અને જમીનમાં ટાવર ઉભું કરવાનું કામ કાયદેસરનું છે.

કંપની તરફથી જાહેર જનતાના હિતમાં ટાવર લાઈન નાંખવાનો તેમજ તેના સમારકામ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે સંદર્ભે કંપની તરફથી કુલ- ૧૭૩ વિદ્યુત ટાવરો ઉભા કરવાના છે તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં ઘણા ટાવરના કામ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી અમારુ કામ આગળ ચાલે નહીં તો કંપનીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન થાય તેમ છે. એટલું જ નહીં પણ જાહેર જનતાને ઘણું જ નુકશાન થાય તેમ છે. કચ્છ ખાવડા ખાતે આવેલ જ.પ ગીગા વોટ રીન્યુએબલ એર્નર્જીના પ્રસારણ તથા પરીવહન જાહેર જનતાની જરૂરીયાત મુજબની વીજ માંગને પહોંચી વળવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે જે પ્રોજેક્ટ સમયસર ના થાયતો ગુજરાતના તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોને કોમર્શિયલ તેમજ રેસીડેન્સીયલ એકમોને પુરતો પાવર નહીં મળે તો તેઓને ઘણું નુકશાન થાય તેમ છે.

સદર અરજીના સામાવાળાની એનેક્સર-એ માં જણાવેલ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો આપ સાહેબની હકુમતમાં આવેલી છે તેમજ પ્રોજેક્ટવાળી ઓવરહેડ વિદ્યુત લઈને અને તેના ટાવરો આપ નામદાર સાહેબની હકુમતમાં આવેલી જમીનો ઉપરથી લઈ જવાના છે જેથી હાલની અરજી સાંભળવાની અને ચલાવવાની આપ નામદાર સાહેબને હકુમત છે.

સબબ અરજી કરી દાદ માંગવાની કે:-

(અ) એનેક્સર-એ માં જણાવેલ તમામ રેવન્યુ સર્વે /બ્લોક નંબરવાળી જમીનો ઉપરથી અરજદાર કંપની કે તેમના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમાં વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહીં તેવો સામાવાળા વિરુદ્ધ હુકમ ફરમાવશો જી.

(બ) આ અરજીની એકંદરે હકીકત જોતા આપ નામદાર સાહેબને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગે તેવી બીજી દાદ આપશો જી.

જેથી અમોની કંપની કે કંપનીના માણસોને ઓવરહેડ લાઈન લઈ જતા તેમજ તેમા વિદ્યુત ટાવર ઉભા કરતા આ કામના સામાવાળાઓ અડચણ, અંતરાય ઉભી કરે નહી તેઓ હુકમ કરવા જણાવેલ છે.

વધુમાં કંપની વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/55/2024 ની વિગતે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

Construction of the line is carried out under provision of Indian telegraph Act, 1885 and compensation to the landowner / farmers is being distributed as per the Government of Gujarat (Energy and Petrochemical department) resolution dated 01.03.2024. The land compensation is to be paid to the landowner/ farmers for the tower foundation locations and line corridor coming under transmission line as per the prescribed Jantri Rates.

We approached the landowner/ farmers falling within the route of the proposed transmission line, however many of them are not agreed for the same and obstructing the construction of the transmission line and demanding significantly higher compensation.

TPGL hereby agrees to pay compensation to the landowners as per the latest Govt of Gujarat resolution dt. 02.12.2024.


તેમજ કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

As there is constant monitoring of progress of subject project at MOP/GOI level to complete within schedule timeline. In view of the above 73 tower locations under ROW & balance are completed/nearing completion and thus there will not be working front available for deployed foundation gangs and may remain idle.

Looking at the cumbersome process involved in getting DLVC done for each application, we would request you to issue interim orders on above applications with the provision that "TPGL may execute the work by paying compensation as per prevailing guidelines issued by of Govt of Gujarat and the differential amount of compensation as per DLVC's recommendation will be payable immediately after final orders."

TPGL is hereby undertake that differential amount between compensation payable as per prevailing rate & as per DLVC rate being finalized, will be paid promptly after the receipt of final orders in the matter.

સામાવાળાનો જવાબ :-



અમો સામાવાળાનાઓ ખેતી કરી અમો તથા અમારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ.

અમો સામાવાળાનાઓ ખોડાભાઈ નાથાભાઈ નાઓ આપ સાહેબ શ્રીનાઓને જણાવીએ કે અમો સામાવાળાનાઓ નું જીવન નીવોંહ ખેતી કરી ને ગુજરાન ચલાવવાનું છે હાલમાં આ કામના અરજદાર દ્વારા મોજે ગામ માણકોલ, કુંડલ જેનો તાલુકો સાણંદ માં ૬૦ કી.મી ટાવર લાઈન લગાડવા માટે અમો સામાવાળાનાઓના માલિકીના ખેતરમાંથી હેવી વીજ કનેક્શન લાઈન પસાર કરવા માંગતા હોઈ જે સામે અમો સામાવાળાનાઓનો સખત મા સખત વાંધો છે

અમો સામાવાળાનાઓની માલિકીની જમીનમાં હાલમાં આ કામના અરજદાર દ્વારા જે આયોજન કરીને વીજ લાઈન પસાર કરવાના છે તેમાં ખુબજ વિશાળ પ્રમાણમાં તેઓના કનેક્શન માટે જગ્યા જમીનમાં રોકવાના હોઈ જેથી અમોની ખેતીની જમીનમાં અમો ખેતી કરી શકીએ નહીં તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થાય તેમ છે અમોની માલિકીની જમીનમાં આ કામના અરજદારનાઓના કનેક્શન ઉભા કરવામાં આવે તો પ્રથમ અમારા ટ્રેક્ટર તથા જમીન મા ખેતીમાં ઉપયોગ મા લેવાતા સાધનો દ્વારા ખેતી કરવામાં ખુબ જ અડચણરૂપ બને તેમ છે ત્યારબાદ અમો ઘરના પરિવાર સાથે તથા અમારા પશુ તથા ઢોર સાથે જમીનમાં અવર જવર કરતા હોઈ તથા ખેતી પણ કરતા હોઈ અમોની માલિકીની જમીનમાં પાણીનો પણ ઉપયોગ કરતા હોઈ તથા જમીનમાં પાણી રાખવું પડતું હોઈ આ હેવી વીજ કનેક્શનના કારણે અમારા પરિવાર તથા અમારા પશુ ઓને જીવનું જોખમ રહેવાની પુરેપુરી સંભાવના છે તથા કંટ જેવા કીસ્સા હાલમાં ખુબજ પ્રમાણમાં આ અરજદાર લોકોની બેદરકારી ના કારણે થતું હોઈ અમારા માલિકીની જમીનમાં પણ તેવો ભય રહેલો છે તથા અમોના પરિવારને કે અમારા પશુ પ્રાણી જમીનમાં જતા હોઈ તો અમો અરજદારની ધ્યાન બહાર પણ આ વીજ કનેક્શન ની લાઈનમાં કરંટ આવતા પણ મૃત્યુ પામવાની સંભાવના હોઈ જેથી આ તમામ જવાબદારી કોના શરિ રહેશે આવો કોઈ બનાવ ના બને અને બને તો કોણ જવાબદાર રહેશે તેવા તમામ કારણોસર આ વીજ કનેક્શન અમો માલિકીની ખેતર માથી પ્રવેશ કરવા પર પ્રતીબંધ મુકવાનો હુકમ કરવા મહેરબાની કરશોજી.

વધુમાં આ વીજ કનેક્શન મા વીજ પસાર થતા ખુબજ વધારે પ્રમાણમાં અવાજ થતો હોઈ અમો ખેડુતો બહેરા થવાના બનાવો પણ બનાતા હોઈ જેથી અમો ખેડુતો નાઓને શારીરીક કે માનસીક રોગ ના ભોગ બનતા હોઈ જેથી પણ સદરહુ વીજ કનેક્શન અમારા માલિકીની જમીન માથી પસાર ના કરવા સારું અમો આ જવાબ આપી સખત વાંધો જાહેર કરીએ છીએ.

વધુમા અમો સદરહુ જમીનમા ભવિષ્યમા કોઈ બાધકામ કરવાનુ થાય તો તે માટે વીજ લાઈન પસાર થીંતી હોવાથી જરૂરી પરીમીશન નો પણ બાધ નડતો હોઈ અથવા તો સદરહુ જમીન બીનખેતી કરવાની થાય તો તેમા પણ અમો ને ખુબ જ હેરાન પેરેશાન થવુ પડતુ હોઈ જેથી તમામ પરમીશન ના મલે તો અમો ખેડુતો એ ના હકક ના ગુકશાન મા ઉતરવુ પડે તેવી પરીરસિથતી હોઈ જેથી પણ સદરહુ વીજ લાઈન પસર કરવા સામે સખત વાંધો છે.

વધુમા હાલમા સદરહુ જમીનના ભાવો ખુબ જ આસમાને પહોચ્યા હોવા છતા આ કામના અરજદાર દ્વારા જમીનનુ યોગ્ય વળતર પણ આપવા તૈયાર ના હોઈ જેથી તમામ ખેડુતો ને ફકત નજીવી રકમ આપી ને શોષણ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા હોઈ જેથી પણ આ વીજ લાઈન પસાર કરવા સામે સખત વાંધો હોઈ આમ, ઉપરોલકત જણાવેલ તમામ શરતો નુ યોગ્ય નિવારણ લેખીત મા આવી શકતુ હોઈ તો જ અમો ખેડુતો તેમા વીચારણા કરી આગળ પગલુ લેશુ તેવી અમો આ કામના અરજદાર વિરુદ્ધ મા આ લેખીત જવાબ તથા દલીલો રજુ કરી આપ સાહેબ શ્રીને જણાવીએ કે સદરહુ વીજ લાઈન ખેડુતો ના હીતમા ના હોઈ જેથી બંધ કરવા તથા તે બાબતે યોગ્ય નિર્ણય થવા વિનંતી છે. જે મુજબ લેખિત રજુઆત કરેલ છે.

તારણો

(૧) સદરહુ કામે ઈન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૯૮૫ ની કલમ-૧૦(એ) તથા ૧૬(૧) વંચાણે લીધેલ જે નીચે મુજબ છે.

Sec.10 The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: Provided that -

- the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;
- the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and
- except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and
- in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in

respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

Sec.16(1) Exercise of Powers Conferred by section 10, and disputes as to compensation in case of property Other than that of a local authority, If the exercise of the powers mentioned in section-10 in respect of property referred to in clause(d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.

(૨) ૪૦૦ કેવી મલ્ટી સર્કીટ ટાવર લાઇન અંદાજિત ૬૦ કી.મી. ટાવર લાઇન લગાવવાના તેમજ હયાત પીરાણા (પી.જી.)-પીરાણા(ટી) ટાવરલાઇનના એચ.ટી.એલ.એસ. કંડકટરથી રી-કન્ડકટીંગ કરવાના કામમાં સદરહુ ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા કામ અટકાવાતા ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ દ્વારા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) અન્વયે લાઇન કામ કરવાની તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૫થી પરવાનગી માંગેલ છે.

(૩) ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લીમીટેડ વતી તેઓના અધિકૃત અધિકારીશ્રીના તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૪ના પત્ર નં. TPGL/DM/ 55/2024 થી જણાવેલ છે કે, ખેડુત ખાતેદારો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંગે ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ મળતા વળતરથી વધારે વળતરની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ અને તા.૦૨/૧૨/ ૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઇટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઇ-૧૯૯-ક ની સુચનાઓ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વધુમાં કંપનીના તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૫ના પત્રથી, જંત્રી આધારિત વળતર તેમજ ડી.એલ.વી.સી. માં નક્કી થતી વળતરની રકમના તફાવતની રકમ ખેડુત ખાતેદારોને ચુકવી આપવા બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.

(૪) ટ્રાન્સમિશન ટાવર/માળખાના આધારિત વિસ્તાર અને પ્રવહન રેષાઓની પહોળાઈ/લંબાઈના કારણે જમીનના મૂલ્યમાં થતાં ઘટાડાના સંદર્ભમાં સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ના ઠરાવ,

તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક:-જીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૮૮-કમાં જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈઓ તથા તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૪ના સુધારા ઠરાવની વિગતો ધ્યાને લઈ કંપનીએ નિયમોનુસાર વળતર ચૂકવવાનું થાય.

(૫)

અરજદારશ્રીની તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૫ ની લેખિત રજુઆતની સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારોની જમીનમાં સદરહુ લાઈન નાખવાની કામગીરીની પરવાનગી આપતો હુકમ કરવા અત્રે રજુઆત કરેલ છે.

આમ, સમગ્ર હકીકતો,પક્ષકારોની રજુઆતો અને કામમાં રજુ થયેલ કાગળો નિગાહે લઈ ભારતીય ટેલીગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬(૧) થી મળેલ અધિકારની રૂએ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

રાજ્યના જાહેર હિતમાં અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખી તમામ વ્યક્તિ અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વિજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે તે માટે આ કામના સામાવાળાઓ સાણંદ તાલુકાના મોજે. કુંડળ ગામનાં ઉક્ત દર્શાવેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે રીતે ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લી દ્વારા વિજરેષા પ્રસ્થાપિત કરવાના કામમાં તેના મંજૂર થયેલ રૂટમાંથી પસાર કરવા ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬(૧) હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂઈએ લાઈન નાખવાની કામગીરીમાં સામાવાળા ખેડુત ખાતેદારો/ખાતેદારએ ઉક્ત વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં રૂકાવટ કે અડચણ કરવી નહી તેમજ આ કામના અરજદારને કામગીરી કરતા નહી અટકાવવા આ હુકમ કરુ છુ.

વધુમાં અરજદાર સંસ્થાએ સામાવાળાની મિલકતમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે મુજબ લાઈન નાખવાની રહેશે. ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ-૧૮૮૫ ની કલમ-૧૦(ડી) અનુસાર મળવાપાત્ર મહત્તમ વળતર સંબંધિતોને સરકારશ્રીની નિયમોનુસાર જોગવાઈને આધારે ચુકવી આપવાનુ રહે છે. કંપની તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ અસંતોષ સામે પ્રોપર્ટી માલિક/ખાતેદાર નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ ઇન્ડિયન ટેલિગ્રાફની કલમ-૧૬ (૩) હેઠળ અપીલ કરી શકે છે. વધુમાં, સદર વિજલાઈનની કામગીરી માટે કંપનીને જરૂર જણાય તેવા આજુ-બાજુના સરવે નંબરની જમીન પરથી પસાર થવા દેવાના રહેશે. જે-તે સરવે

નંબરમાં અવર-જવર દરમિયાન થયેલ પાક નુકસાન કે અન્ય નુકસાનીનું વળતર જે-તે ખેડુત ખાતેદારોને સરકારશ્રીની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર ચુકવવાનું રહેશે.

આજ તારીખ: ૦૧, માહે: મે, સને: ૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા કચેરીની મુદ્રા સાથે આ હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો.

સ્થળ :- અમદાવાદ

તારીખ :- ૦૧/૦૫/૨૦૨૫

સહી/-

(સુજીત કુમાર)

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અમદાવાદ

રવાના કરવા માટે પ્રમાણિત


મામલતદાર(એન.એ.)

અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધિત પક્ષકારો તરફ

નકલ રવાના:-



(૧) જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી

આયોજન કરી અમલવારી કરવા સારૂ.

(૨) પ્રાંત અધિકારી અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, સાણંદ તરફ જાણ સારૂ.

(૩) મામલતદારશ્રી સાણંદ તરફ તરફ જાણ સારૂ.

(૪) સિલેક્ટ ફાઈલે.



TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/2025/04/13
April 25th , 2025

To,
The Chief Engineer,
PSPM Division
Power System Planning & Appraisal-I (PSPA-I) Division,
RK Puram , New Delhi -110001
Email: PSPM Division CEA <pspm-cea@gov.in>

Kind Atten to Sh. Yogendra Kumar Swarnkar

Subject: Request for Administrative Support to Address Right of Way Issues Affecting Transmission Line Construction in Ahmedabad District, Gujarat – Khavda PS Phase II, Part-D (RTM).

Ref. no: Project review meeting chaired by Secretary (Power), Ministry of Power, Government of India on 03.04.2025 (Hybrid Mode)
: TPGL Request Letter TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/2025/04/12 dated 07-04-2025 Request for Administrative Support to Address Right of Way Issues Affecting Transmission Line Construction in Ahmedabad District.

Dear Sir,

We would like to bring to your kind attention that the ongoing construction work for the **400 kV M/C Pirana (PGCIL) – Pirana (TPL) 400 kV D/C line** under the Transmission Scheme for **Khavda PS Phase-II, Part-D (RTM)** has been significantly hampered due to severe Right of Way (RoW) issues in Ahmedabad District, Gujarat.

Scope of Work:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D (RTM) includes:

- LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/C line at Ahmedabad S/s with twin HTLS, along with reconductoring of the Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor and OPGW for both mainline and LILO section.
- Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation – 4 Nos).

Status of Bay Upgradation Work:

- **Supply of Bay Upgradation Material:** Completed.
- **Civil Work:**
 - **Line-1 & Line-2** bays completed, Bus Coupler and TBC partially completed.
 - **Line 1:** Equipment replaced at TPL & PGCIL ends, except for the Pantograph Isolator (TPL end).
 - Shutdown for replacement of Equipment in Line 1 Tie Bay at the PGCIL end; TBC bay equipment replacement completed and charged on 07-03-2025.
 - **The outage of 400 kV Pirana TPL - Pirana PG line-II** has been deferred by WRLDC/SLDC-Gujarat from the planned outage schedule due to system constraints. Multiple outages are required owing to changes various elements in charged Substation at the 400 kV PGCIL Pirana and TPL substations. As a result, considerable manpower is currently idle due to the non-availability of the planned outage and project work is getting delayed.



TORRENT POWER GRID LIMITED

Request for Administrative Support:

The Right of Way issues have been consistently highlighted in regular CEA /CTU monthly progress meetings.

1. **Despite of DM order, farmers are not allowing us to work at site for which Police protection for 43 RoW affected locations is sought from SP, Ahmedabad vide application dt. 17-03.2025, SP order is awaited.**

Your intervention is requested to issue an order from SP, Ahmedabad.

2. **Outage for 400 kV Pirana TPL - Pirana PG line-II has been differed by WRLDC/SLDC Gujarat and insisted to take up in July-25 onward. For non-availability of line outage, we are not in position to take up the work of equipment replacement as a part of Bay upgradation project.**

Your intervention is requested to grant of said outage from WRLDC/SLDC Gujarat.

Timely intervention is essential to ensure the project is completed as per the planned schedule. We kindly request your prompt attention and continued support in this regard to help us move forward efficiently.

Yours sincerely,

For Torrent Power Grid Limited,



Pramod Patel

Director, TPGL

Email : pramodpatel@torrentpower.com



CC: The Chief Operating Officer (PMU-TBCB/RTM Project)

Central Transmission Utility of India Ltd.,

1st Floor, "Saudamini", Plot No.: 02,

Sector-29, Gurugram (Gurgaon),

Haryana – 122 011. Email: pcgarg@powergrid.in

o/c

TPGL/DM/POLICE/30/2025-26

તા: ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૫

પ્રતિ શ્રી,
પોલીસ અધિક્ષક શ્રી,
અમદાવાદ (રૂરલ),
મકરબા, અમદાવાદ.

વિષય :- ૪૦૦ કેવી ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લિમિટેડ (૪૦૦ કેવી બેવડા વીજ રેસા વાળી પીરાણા (પીજી) - પીરાણા (ટી) ની ડબલ સર્કિટ લાઈનને અમદાવાદ સબ સ્ટેશનમાં લુપ ઈન લુપ આઉટ કરવા માટેની મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈન યોજના માટે નીચેના ગામોમાં શ્રી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટના હુકમ અનુસાર કાર્ય કરવા માટે ઓન પેમેન્ટ પોલીસ પ્રોટેક્શન માટે ની અરજી.

ગામ : સરોડા, ચલોડા, તાલુકો: ધોળકા, જિલ્લો: અમદાવાદ

ગામ : કમોડ, તાલુકો: વટવા, જિલ્લો: અમદાવાદ

ગામ : બાકરોલ-બદરાબાદ, તાલુકો: વેજલપુર, જિલ્લો: અમદાવાદ

ગામ : બાવળા, આદરોડા, તાલુકો: બાવળા, જિલ્લો: અમદાવાદ

ગામ : મેલાસણા, મખીયાવ, બકરાણા, ઝોલાપુર, તાલુકો: સાણંદ, જિલ્લો: અમદાવાદ

સંદર્ભ:

- (૧) જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ઓર્ડર નંબર: એન.એ/પા.ટ્રા/ટોરેન્ટ પાવર/કેસ.નં.૦૧/૨૦૨૪/ફાઇનલ ઓર્ડર તા:૧૩.૦૩.૨૦૨૫
- (૨) જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ઓર્ડર નંબર: એન.એ/પા.ટ્રા/ટોરેન્ટ પાવર/કેસ.નં.૦૩/૨૦૨૪/ફાઇનલ ઓર્ડર તા:૧૩.૦૩.૨૦૨૫
- (૩) જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ઓર્ડર નંબર: એન.એ/ પા.ટ્રા/ટોરેન્ટ પાવર/કેસ.નં.૦૪/૨૦૨૪/ફાઇનલ ઓર્ડર તા :૧૩.૦૩.૨૦૨૫
- (૪) જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ઓર્ડર નંબર: એન.એ/પા.ટ્રા/ટોરેન્ટ પાવર/કેસ.નં.૦૫/૨૦૨૪/ફાઇનલ ઓર્ડર તા:૧૩.૦૩.૨૦૨૫
- (૫) જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ઓર્ડર નંબર: એન.એ/પા.ટ્રા/ટોરેન્ટ પાવર/કેસ.નં.૦૬/૨૦૨૪/ફાઇનલ ઓર્ડર તા:૧૩.૦૩.૨૦૨૫
- (૬) જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ઓર્ડર નંબર :એન.એ/પા.ટ્રા/ટોરેન્ટ પાવર/કેસ.નં.૦૭/૨૦૨૪/ફાઇનલ ઓર્ડર તા:૧૩.૦૩.૨૦૨૫

માનનીય સાહેબ શ્રી,

ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લિમિટેડ કે જેની રજીસ્ટર ઓફિસ "સમન્વય", ૬૦૦, તપોવન નહેરુનગર, આંબાવાડી,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫, જગ્યાએ આવેલી છે. હાલમાં ટોરેન્ટ પાવર ગ્રીડ લીમિટેડ દ્વારા ૪૦૦કે.વી. મલ્ટી સર્કિટ ટાવર લાઈનની જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તે ઇલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૬૮(૧) તેમજ ૧૬૪ હેઠળ ભારત સરકારના વિદ્યુત મંત્રાલય (MoP) ના કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણ (CEA) થી પ્લાન તેમજ રૂટ મંજૂર કરેલ છે. જે ભારત સરકાર ના ગેજેટ તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૪ ના ભાગ-૨ ના ખંડ-૩ થી પેજ નંબર ૭૭૨ થી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે

તદુપરાંત, તા. ૧૧/૦૭/૨૦૨૪ ના રોજ સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં, રાજસ્થાન પત્રિકામાં તેમજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દૈનિક પત્રમાં નોટિસ ધ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી.

ઉપરોક્ત જરૂરી પરમિશન મળ્યા બાદ કંપની દ્વારા ૪૦૦કેવિ લાઇનનું કામકાજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેટલાક જમીનમાલિકો દ્વારા વિરોધ કરતા નિયમાનુસાર અમો કંપનીએ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી ને અરજી કરેલ હતી, જેનો ફાઇનલ ઓર્ડર આ પત્ર સાથે બીડાણ કરેલ છે.

માનનીય જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી દ્વારા કામ શરૂ કરવાનો આદેશ મળતાં, અમે સંબંધિત જમીનમાલિકોને તેમની જમીનમાં ઉપરોક્ત લાઇન નું કામ કરવા દેવા વિનંતી કરી છે, પરંતુ કેટલાક જમીનમાલિકો અમારા સ્ટાફ અને કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીના કામ માં અવરોધો ઉભા કરી રહ્યા છે/ કામ કરવા દેતા નથી.

ઉપરોક્ત ટ્રાન્સમિશન લાઇન નું કામ જાહેર હિતમાં તથા ભારત સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થવું ખુબજ જરૂરી છે તેથી અમો આપ શ્રી ને ઉપરોક્ત કામ દરમિયાન નીચે મુજબ ઓન પેમેન્ટ પોલીસ બંદોબસ્ત ૬૦ દિવસ સુધી આપવા નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ તેમજ તેના માટે નિયમાનુસાર જે કોઈ સંબંધિત ચાર્જ થાય તે ચૂકવવા અમો બાંધધરી આપીએ છીએ.

1. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર -૦૧
2. એસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર/ હેડ કોન્સ્ટેબલ -૦૧
3. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ -૦૩
4. મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ -૦૨

આ મામલે વહેલી તકે કાર્યવાહી કરવાની વિનંતી છે.

આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ



પ્રમોદ પટેલ, (ડિરેક્ટર)

ટોરેન્ટ પાવરગ્રીડ લિમિટેડ.

બિડાણ: ઉપર મુજબ



TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/06/2025/14

Date: June 05th, 2025

To,
 The Chief Operating Officer
 Central Transmission Utility of India Ltd.
 1st Floor, "Saudamini", Plot No.: 02
 Sector-29, Gurugram (Gurgaon),
 Haryana - 122 011
 Email: pcgarg@powergrid.in

Subject: Force Majeure Intimation and Request for Time Extension - Disruption due to Unseasonal Rainfall in Gujarat Affecting Transmission Line Construction Activities.

Ref: ISTS Transmission Scheme for Evacuation of 4.5 GW RE at Khavda PS under Phase II, Part-D - LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s

Dear Sir,

We would like to bring to your kind attention that the ongoing construction activities for the 400 kV M/C LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c transmission line, being executed by Torrent Power Grid Ltd. (TPGL) under the Khavda PS Phase-II Part-D Transmission Scheme, have been significantly disrupted due to **heavy and unseasonal rainfall** experienced in the Ahmedabad region of Gujarat during May 2025.

The adverse weather conditions have caused interruption of construction works at multiple sites during rainfall, as detailed below:

From	To	Location	Work Status	Remarks
05-May-2025	07-May-2025	Ahmedabad, Gujarat	Day & Night	Work halted for ~6 days
25-May-2025	27-May-2025	Ahmedabad, Gujarat	Day & Night	Work halted for ~6 days

This unseasonal rainfall severely impacted site accessibility and the supply chain for critical construction materials such as aggregates, sand, cement, and tower components. Foundation and erection activities were particularly affected due to difficulty in transporting materials to agricultural lands and marshy stretches.

Progress Status as of May 31, 2025 (for 60 km M/C line):

Sno	Activity	Status (Completed/Total)	Present Gangs Mobilized	Expected Completion
1	Foundation	116/out of 174 Nos	12 Gangs	SCoD: 21.03.2025 (In matching the commissioning timeframe of Khavda Phase II (Part A to C).
2	Total Erection	73/out of 174 Nos	12 Gangs	
3	Stringing	40/out of 240 Ckm	02 Gangs	

Additionally, persistent **Right of Way (RoW) challenges** in the Ahmedabad district continue to impact work at 38 locations, several of which are under litigation or require police assistance for execution. These challenges have created bottlenecks despite our continuous coordination efforts with local authorities and stakeholders.

In view of the above, we would like to invoke the **Force Majeure clause** as applicable under the contract and formally request a **time extension** corresponding to the number of affected days. We remain committed to expediting the balance works and are actively implementing mitigation measures to minimize further delays.

We request your kind understanding and consideration of this genuine disruption. We shall continue to keep CTUIL/CEA informed of further developments and recovery measures.

Thank you for your support.



Yours faithfully,

Pramod Patel

Director

Torrent Power Grid Ltd.


Copy to:

- Chief Executive Officer, Adani Energy Solutions Limited,
13th Floor, K.P. Epitome, Makarba, Ahmedabad – 382421
Email: kandarp.patel@adani.com
- The Chief Engineer, PSPM Division,
Power System Planning & Appraisal-I (PSPA-I) Division,
R.K. Puram, New Delhi - 110001
Email: pspm-cea@gov.in

Enclosure:


1. Copy of newspaper reports
2. Site photographs depicting weather and construction impact

૧૬ મુસ્લામ સમજાવક (અમદાવાદ આવૃત્તિ)

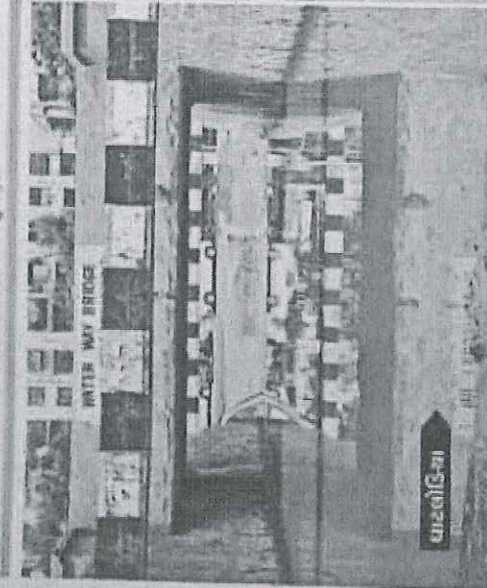


વાટાલોડિયા

ગુજરાત

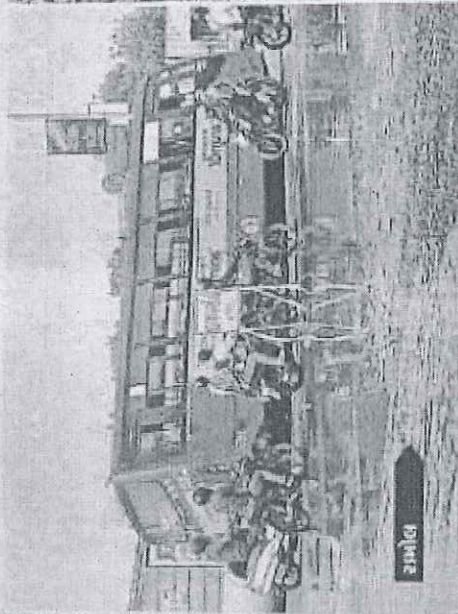

રામોલ

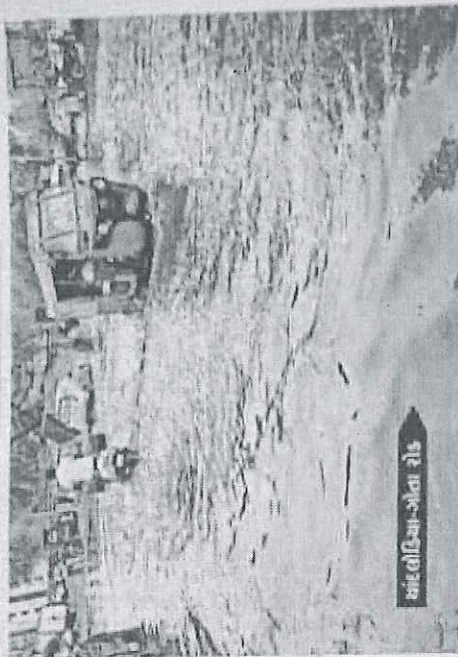

સાંતોડિયા-બેતા રોડ

મુકાબર, તા. ૩૦ મે, ૨૦૨૫

ધનાસુધારની પોળમાં મકાન ધરાશાયી થતાં મહિલાનું મોત માત્ર એક ઈય વરસાદમાં જળબંબાકાર : પાંચ અંડરપાસ બંધ, ૨૬ સ્થળે રોડ બેસી ગયા

અમદાવાદમાં વરસાદના પાંચ દિવસો પછી પણ પાણી ધોવાઈ રહ્યું છે. ગત ૨૪ કલાકથી પાણી અત્યંત ઘણું વધી ગયું છે. આથી કમીમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અમદાવાદના પાંચ અંડરપાસ બંધ થઈ ગયા છે. ૨૬ સ્થળે રોડ બેસી ગયા છે. આથી ધનાસુધારની પોળમાં મકાન ધરાશાયી થતાં મહિલાનું મોત માત્ર એક ઈય વરસાદમાં જળબંબાકાર : પાંચ અંડરપાસ બંધ, ૨૬ સ્થળે રોડ બેસી ગયા

૧૦૬ સ્થળે પાણી ભરાયાં : પરોડે પડેલા વરસાદના કારણે દુધેશ્વર, રાણીપ સહિતના વિસ્તારોમાં પ્રજા પરેશાન

અમદાવાદમાં વરસાદના પાંચ દિવસો પછી પણ પાણી ધોવાઈ રહ્યું છે. ગત ૨૪ કલાકથી પાણી અત્યંત ઘણું વધી ગયું છે. આથી કમીમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અમદાવાદના પાંચ અંડરપાસ બંધ થઈ ગયા છે. ૨૬ સ્થળે રોડ બેસી ગયા છે. આથી ધનાસુધારની પોળમાં મકાન ધરાશાયી થતાં મહિલાનું મોત માત્ર એક ઈય વરસાદમાં જળબંબાકાર : પાંચ અંડરપાસ બંધ, ૨૬ સ્થળે રોડ બેસી ગયા

૩૪ જેટલા તાલુકામાં ૧ ઈય સુધી વરસાદ આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે

મહાનગર, ગુરુવાર : ગુજરાતમાં આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ૩૪ જેટલા તાલુકામાં ૧ ઈય સુધી વરસાદ આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ૩૪ જેટલા તાલુકામાં ૧ ઈય સુધી વરસાદ આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

ગુજરાતમાં આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ૩૪ જેટલા તાલુકામાં ૧ ઈય સુધી વરસાદ આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ૩૪ જેટલા તાલુકામાં ૧ ઈય સુધી વરસાદ આજે ૨૦થી વધુ જિલ્લામાં ૫૦ કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

અમદાવાદમાં સૌથી વધુ ૧૪૫, રાજકોટમાં ૨૩૬ દહીંઓ ગુજરાતમાં કોરોનાના ૨૨ ઓક્ટોવ કેસ : ૩ દિવસમાં બમણો વધારો

અમદાવાદ, ગુરુવાર : ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસોમાં ૨૨ ઓક્ટોવે ૩૬૬ કેસો નોંધાયેલા છે. આમાં અમદાવાદમાં ૧૪૫, રાજકોટમાં ૨૩૬ કેસો નોંધાયેલા છે. ૩ દિવસમાં બમણો વધારો

ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસોમાં ૨૨ ઓક્ટોવે ૩૬૬ કેસો નોંધાયેલા છે. આમાં અમદાવાદમાં ૧૪૫, રાજકોટમાં ૨૩૬ કેસો નોંધાયેલા છે. ૩ દિવસમાં બમણો વધારો



ડી કેવિન અંડરપાર

રાત્રે જ પાંચ અંડરબ્રિજ બંધ કરવા પડ્યા : ૧૪૯ પાણી ભરાવવાની, ૨૬ જગ્યાએ રોડ બેસવાની ફરિયાદો

શહેરમાં બુધવારે મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે બે ઈંચ વરસાદ, પ્રી-મોન્સૂન ક્રામગીરીનું સુરસુરિયું

ગુરુવર સાંજ સુધી સાબરમતી અંડરબ્રિજ સહિત ૧૦ જગ્યાએ પાણી ઓસર્યા જ નહીં

ચાંદખેડા, સાયન્સસિટી, ચાંદલોડિયા, પાલડી, જોધપુર, બોડકદેવ, વાડજ, ગોતા, દૂધેશ્વરમાં સવાથી બે ઈંચ વરસાદ




વધુ વરસાદ ગાંધીનગર

અમદાવાદમાં બુધવાર રાત્રે ભારે પવન સાથે બે કલાકમાં સરેરાશ પરંપરા બે ઈંચથી વધુ વરસાદથી વિશાળ ક્રામગીરીનું સુરસુરિયું થઈ ગયું છે. ગુરુવાર સાંજ સુધી સાબરમતી અંડરબ્રિજ સહિત ૧૦ જગ્યાએ પાણી ઓસર્યા જ નહીં. નાઈટલિંગા ટેક્સના નાજાંમોડી ડી. મોન્સૂન ક્રામગીરી પાળી બંધ કરાવેલા ફોર્સે રૂપિયા પાણીમાં વહી નયા હોય તેવા માહિત્ય જોડા મળ્યા હતાં, રાત્રિના સમય પાણી ભરાવા પાંચ અંડરબ્રિજ બંધ કરવા પડ્યાં હતાં. ગરમ પાણી બેક માસલાવાન્યા હતાં. ૧૪૯ સ્પોર્સેમ પાણી ભરાવવાની, ૨૬ જગ્યાએ રોડ બેસવાની, ૧૧ ગાડ પડવાની અને ૬ મકાનો પરાશાળી વકાની હરિયાદી મુજબને મળી હતી. ચાંદખેડા, સાયન્સસિટી, ચાંદલોડિયા, પાલડી, જોધપુર, બોડકદેવ, વાડજ, ગોતા, દૂધેશ્વરમાં સવાથી બે ઈંચ વરસાદ ખાનગી હોટલોનું પાણી મળ્યું છે. જ્યારે મ્યુનિસિપલ સેલેશ ૧.૪૫ ઈંચ વરસાદ પડવાનો દાવો કરી ગયાં. બુધવારે મોડી રાત્રે પરંપરા બંધે વરસાદના કારણે વિશાળ ક્રામગીરી પાળી સ્પોર્સેમ આંશિક કરી પછી પણ મળે છેકાં પાણી ભરાવા હતાં વરસાદ પડ્યાં જ મ્યુનિસિપલ સેલેશ દ્વારા પ્રેરેલા મર્ડ કરી ગયાં.

વિસ્તાર	વરસાદ(ઇંચ)
દુધેશ્વર	2.24
રાણીપ	2.22
વિરાટનગર	1.91
ચાંદલોડિયા	1.83
ઉત્તમનગર	1.79
ચાંદખેડા	1.67
સાયન્સસિટી	1.67
ચાંદલોડિયા	1.67
ગોતા	1.63
નરોડા	1.63
મહોજનગર	1.61
સોલંક	1.59
નિકોલ	1.46
દાસપીઠ	1.42
જોધપુર	1.36
બોડકદેવ	1.34
કેતરપુર	1.32
પાલડી	1.24

કાલુપુરની ધનાસુથારની પોળમાં બે માળનું જર્જરિત મકાન ધરાશાયી થતાં મહિલાનું મોત

રાત્રે ૩.૩૦ વાગ્યાની ઘટના, કાટમાળ નીચે બે મહિલા દટાઈ હતી. એક ઈજાગ્રસ્ત

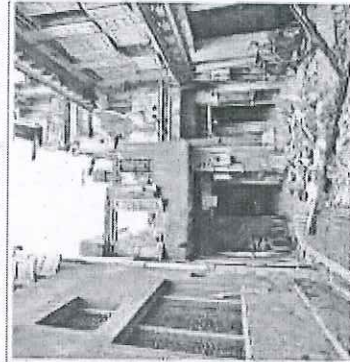


કાલુપુરમાં જતાસુથારની પોળમાં બુધવારે રાત્રે ૩.૩૦ વાગ્યે ભારે પવનના કારણે મોડી રાત્રે બે માળનું મકાન ધરાશાયી થયું હતું. આ મકાનમાં દિનેશબાઈ દરજી તેમના પરિવાર સાથે રહેતા હતા. જ્યારે મકાન પડવાથી જ્યુ તે સમયે તેમની ૪૪ વર્ષીય પત્ની કલ્યાણબેન અને એક ૩૦ વર્ષીય સ્ત્રીગર્ભવેન દરજી સાથે હતી અને બેન બેન કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયાં હતાં. મકાન પડવાનો અવાજ આવતા આસપાસના લોકો અચાનકા દોડી આવ્યા હતા. તેમજ કાલુપુરની જાણ કરતા કલ્યાણબેનની એક ગાંઠીએ ઘરના સ્થાને પહોંચીને બેનને કાટમાળ ખસેડીને રેલ્સુક્રી બહાર મૂકવા હતા. ત્યારબાદ બેનને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ મોકલી દેવામાં હતાં. સારવાર દરમિયાન કલ્યાણબેનનું મોત ત્રિપલનું થયું. મલત્યુ ડ્રી. અંબમતી કાટા અંબાઈ જર્જરિત મકાન પડ્યા તપાસ કરાઈ હતી, પરંતુ કોઈ કારણવાળી ફરવામાં આવી ન હતી.




દાઘ કલોડિયા ખર્ચે બહેનના પ્રી-મોન્સૂન ક્રામગીરી વાળી રહી છે. કારણકે રોડ પર બોડકામ, ફોર્સ, પાણીની વાળના કામો વાળી રહ્યા છે. તેવામાં વરસાદી પાણી ભરાવા દોડિક-જમની સ્પર્શવા સમયે હતી કેટલાક સ્થાને વાંદળો ખાડમાં ફેલાઈ ગયા હતા.



અમદાવાદમાં બુધવાર રાત્રે ભારે પવન સાથે બે કલાકમાં સરેરાશ પરંપરા બે ઈંચથી વધુ વરસાદથી વિશાળ ક્રામગીરીનું સુરસુરિયું થઈ ગયું છે. ગુરુવાર સાંજ સુધી સાબરમતી અંડરબ્રિજ સહિત ૧૦ જગ્યાએ પાણી ઓસર્યા જ નહીં. નાઈટલિંગા ટેક્સના નાજાંમોડી ડી. મોન્સૂન ક્રામગીરી પાળી બંધ કરાવેલા ફોર્સે રૂપિયા પાણીમાં વહી નયા હોય તેવા માહિત્ય જોડા મળ્યા હતાં, રાત્રિના સમય પાણી ભરાવા પાંચ અંડરબ્રિજ બંધ કરવા પડ્યાં હતાં. ગરમ પાણી બેક માસલાવાન્યા હતાં. ૧૪૯ સ્પોર્સેમ પાણી ભરાવવાની, ૨૬ જગ્યાએ રોડ બેસવાની, ૧૧ ગાડ પડવાની અને ૬ મકાનો પરાશાળી વકાની હરિયાદી મુજબને મળી હતી. ચાંદખેડા, સાયન્સસિટી, ચાંદલોડિયા, પાલડી, જોધપુર, બોડકદેવ, વાડજ, ગોતા, દૂધેશ્વરમાં સવાથી બે ઈંચ વરસાદ ખાનગી હોટલોનું પાણી મળ્યું છે. જ્યારે મ્યુનિસિપલ સેલેશ ૧.૪૫ ઈંચ વરસાદ પડવાનો દાવો કરી ગયાં. બુધવારે મોડી રાત્રે પરંપરા બંધે વરસાદના કારણે વિશાળ ક્રામગીરી પાળી સ્પોર્સેમ આંશિક કરી પછી પણ મળે છેકાં પાણી ભરાવા હતાં વરસાદ પડ્યાં જ મ્યુનિસિપલ સેલેશ દ્વારા પ્રેરેલા મર્ડ કરી ગયાં.

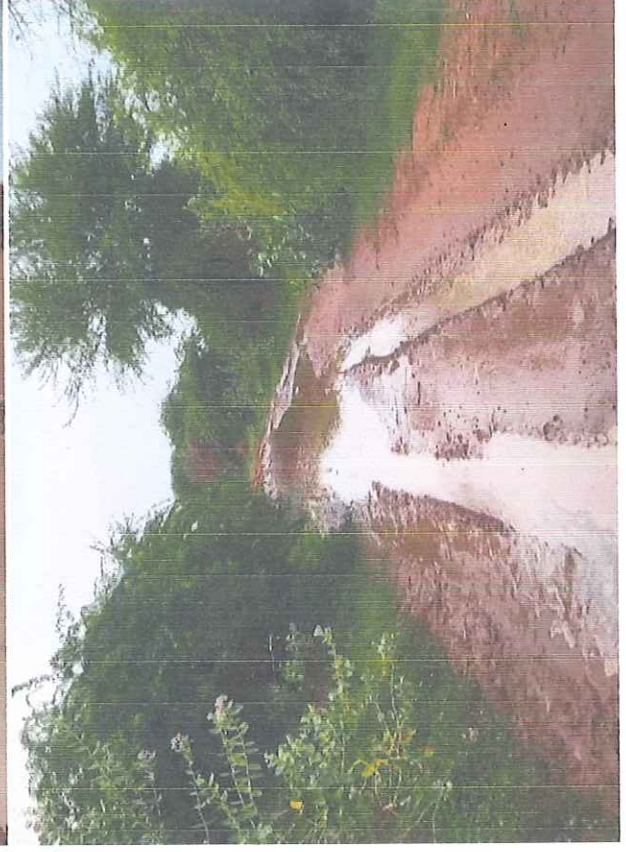

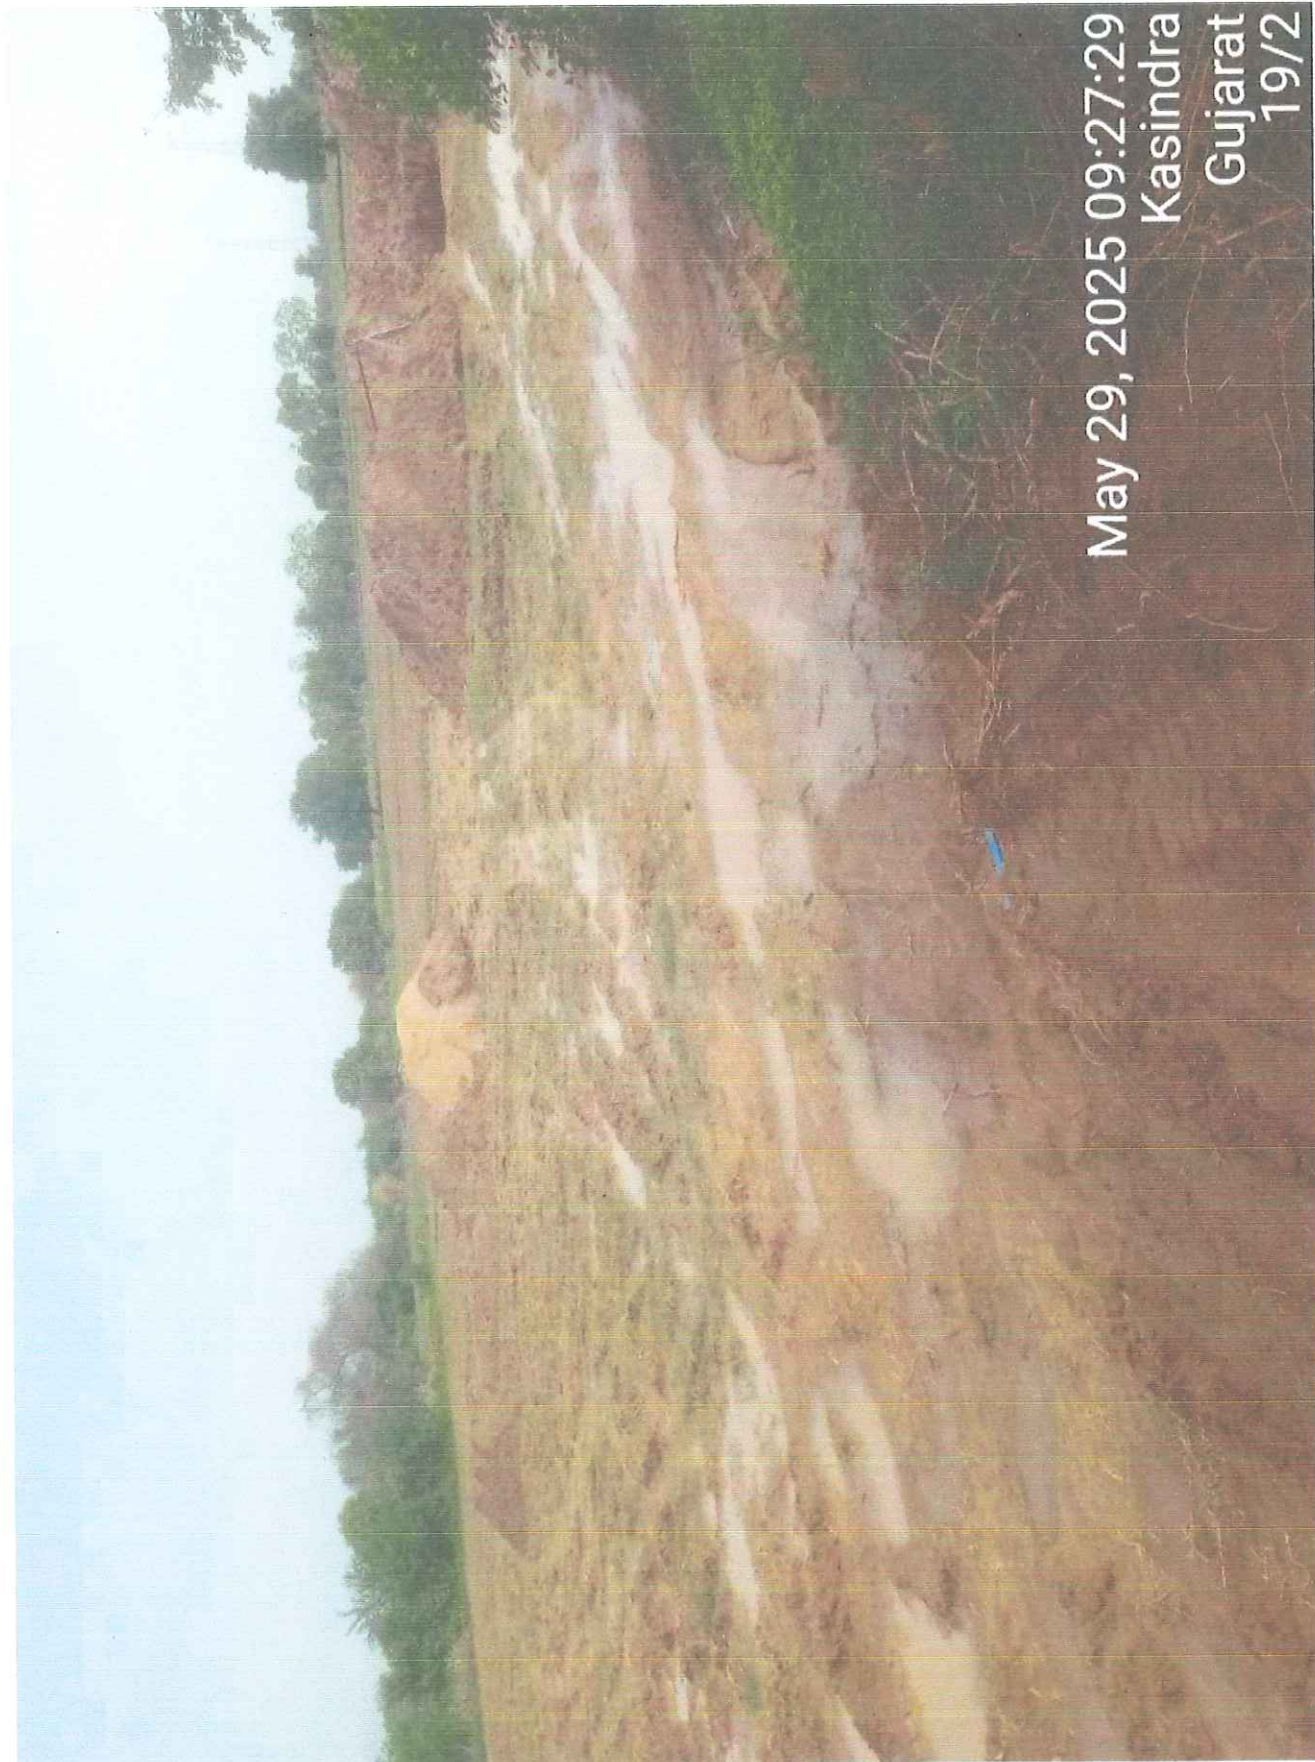

May 29, 2025 09:27:29
Kasindra
Gujarat
19/2

TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/07/2025/18
Date: July 15th, 2025



To,

Chief General Manager (CGM)

CTUIL Corporate/CGM Office

Floors 5th–10th, IRCON International Tower, Tower 1,

Plot No. 16, Institutional Area, Sector 32, Gurugram, Haryana 122003

Email: nagraj@powergrid.in

Kind Atten : Sh. K Nagraj Bhatt

Subject: Force Majeure Declaration & Request for Extension of Time – Unseasonal Rainfall Disruption (June 2025) in Ahmedabad District, Gujarat.

Ref: ISTS Transmission Scheme for Evacuation of 4.5 GW RE at Khavda PS under Phase II, Part-D – LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s.

Dear Sir,

We would like to bring to your kind attention that the ongoing construction activities for the 400 kV M/C LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c transmission line, being executed by Torrent Power Grid Ltd. (TPGL) under the Khavda PS Phase-II Part-D Transmission Scheme, have been significantly disrupted due to heavy and unseasonal rainfall experienced in the Ahmedabad region of Gujarat during June 2025.

The adverse weather conditions have caused interruption of construction works at multiple sites during rainfall, as detailed below:

Scope of Work:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D (RTM) includes:

- **LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/C line at Ahmedabad S/s with twin HTLS, along with reconductoring of the Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor and OPGW for both mainline and LILO section.**
- Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation – 4 Nos).

Force Majeure Event Description

The Transmission Line traverses through the following Major Villages in Ahmedabad District Gujarat:

- Piplaj, Kamod, Bakrol-Badrabad, Visalpur, Paldi-Kankaj, Kasindra Navapura, Saroda, Badarkha, Chaloda, Juval-Rupavati, Salajada, Rupal, Bavla, Adaroda, Sankod Mankol, Kundal, Melasana, Makhiyav, Bakrana, Zolapur.

The ongoing construction of the **LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/C line** at Ahmedabad S/s transmission line has been significantly disrupted due to unseasonal and intense heavy rainfall in the District Ahmedabad, Gujarat State during **June to 10-July 2025**.

The adverse weather conditions caused work interruptions at multiple locations, as detailed below:

From	To	District/State	Rainfall Duration	Remarks
17-June-2025	30-June-2025	Ahmedabad, Gujarat	Day & Night	Work hampered for ~14 days
01-July-2025	10-July-2025			Work hampered for ~10 days



TORRENT POWER GRID LIMITED

CIN : U0104GJ2005PLC046660

Regd. Office : "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, India. Phone: 079 - 26628300 email: cs.tpgl@torrentpower.com

These conditions, falling under– **Natural Force Majeure Events**, have severely impacted site access and the supply chain for critical construction materials such as aggregates, cement, and tower components. The transport of materials and machinery through agricultural and marshy terrain has been particularly affected.

Progress Status as of July 10, 2025 Transmission Line (for 60 km M/C line):

Sno	Activity	Status (Completed/Total)	Mobilized Status	SCoD
1	Foundation	130/out of 174Nos	06 Gangs	To Align/matching with the commissioning timeframe of Khavda Phase II – Parts A to C
2	Total Erection	90/out of 174 Nos	12 Gangs	

Request for Relief :

In light of these uncontrollable circumstances, we:

- **Declare a Force Majeure event** for the affected period.
- Request a **24-day extension of time** to compensate for the disruption.
- Confirm our commitment to **mitigation measures**, including revised schedules, accelerated manpower deployment, and priority logistics.
- Weather reports/newspaper cuttings (**Ahmedabad rainfall, June–July 2025**).
- Site photographs demonstrate work stoppage conditions.

We remain fully committed to the timely completion of the remaining works, with all necessary mitigation measures being adopted to minimize delays.

We sincerely request CTUIL's understanding and favorable consideration of our request for a time extension. We will continue to keep both CTUIL and CEA informed of further developments and progress in recovery efforts.

We highly appreciate your continued support and cooperation.

Yours sincerely,



Pramod Patel
 Director
 Torrent PowerGrid Limited



Copy for information pl : The Chief Engineer, PSPM Division,

Enclosure: As above : Copy of cutting newspaper.
 : Site photographs

સિવિલના નિયમિત સ્ટાફ ઉપરાંત ૮૫૫ જેટલો વધારાનો સ્ટાફ અર્ચરવ



4. **CONCLUSIONS**

અમદાવાદમાં બી.કે.કે.ના
ફુટબોલમાં ૧૨૫ ડિગ્રીનો મેચ થયો
હો, જે પૈકી ૮૩ ડિગ્રીનો મેચમાં મેચને
સુરક્ષા તરફનો મેચમાં છે. અમદાવાદ
સિવિલ એરિયામાં મેચ આ અમદાવાદ
નામની રહી રહી છે. આ મેચમાં
સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે.

વૃત્તીકૃતિ તેમ જ દ્વારા નાણાકીય કૃતિ
રૂપેના કંપની તેમજ કોલેજોના સરકારી કે
અર્ધસરકારી ક્ષેત્રોમાંથી કાર્ય
સરનામાંથી પણ પદ તે માટે સ્વયંસેવા
સ્થળોનાં સંપર્ક કાર્યને જરૂરી
દસ્તાવેજો સહારે પૂર્ણ પામ્યા છે.
સ્વયંસેવા પેટીના સહિતના
દસ્તાવેજો પંચો તથા સાંપ્રતિબંધ
આધારે આપવા પામીકરી તેમ જ મદદગાર

અધિગિવ હેસિગટલમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર
પટેલે દર્શાવેલો જાનક અંતર પાછળ

[illegible]

100

મોખોમાં સાની ધમાકેદાર એન્ડ્રીઃ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં, ઘીકાંટામાં વીજ કરંટથી એક યુવકનું મોત થયું. શહેરમાં પોણા બે ઈંચ વરસાદઃ રામોલમાં અઢી ઈંચ, મ્યુનિ. કોર્પોરેશનનો આગોતરો પ્લાન એક ઝાટકે ધોવાયો

100

ગાંધીનું સંયોગવાળી પગપેદાર શરૂઆત પાંચની વયે જ AMMC ને ઈ-એન્ટ્રી બેઝન પાસ થોડાં દિવસો બે પૂર્વ એન્ટ્રી રાખવાની ઝીંકી વાળી ખેંચી ઉઠે. રાજકીય શરૂઆત રાજકીય બહેરોમાં થઈ. આ પછી મેલારકાએ ભેગની એન્ટ્રી કરી રોહાની બે ઉઠે. આ પછી ૧૯૮૨ અગાઉના પછી સોમનાથ જઈ જાય ત્યાં પાંચે પાંચે જાય. આ પછી ૧૯૮૨ અગાઉના પછી સોમનાથ જાય ત્યાં પાંચે પાંચે જાય. આ પછી ૧૯૮૨ અગાઉના પછી સોમનાથ જાય ત્યાં પાંચે પાંચે જાય.


[illegible]

AMC द्वारा जारी कंडर १४७ में टका

યુકેને પીચવાંગકામંચી કરે લાયકે હતી

એ કારા વિચારમાં મોટી શખાની પાળ શબ્દના ધીરવીની ચાખવામાંથી કરેલે લાગણી રાજનિવાળમાં ૩૦ વર્ષનાં યુવાનનું કણ મોઢા નીપણું હતું. આ છાત્રનાં ચહેરા પર કણા કામંચી કાલે રિહોડની ટીમ વડવાનું ચહેલું પડેલી હતી.


પી કારા



**डिपोटरिंग
वान स्टाई**

वाटनेडमा डी डिपोट
रिंगमा केलेको यात्रामा
वाली डिपोटमा गएर
MC-बी डी डिपोटिंग

[illegible][illegible][illegible]

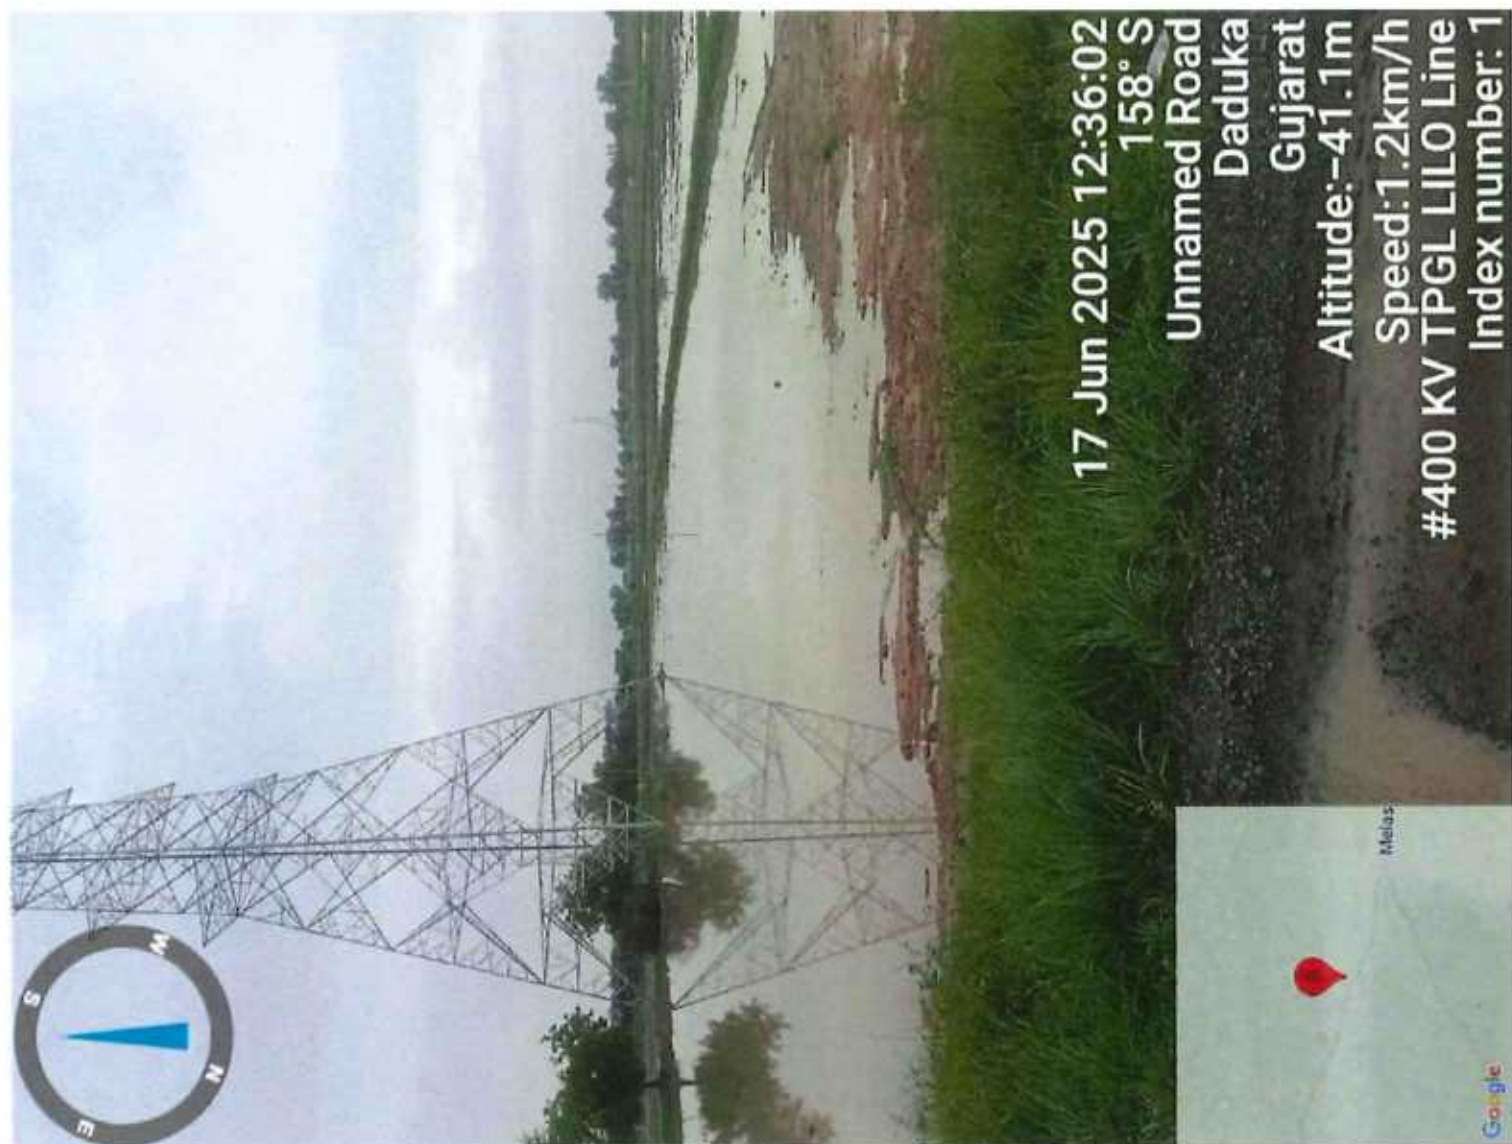

સતત બીજા દિવસે વરસાદી વાતાવરણ નિકોલમાં સવા, વટવામાં એક અને મરેરાશ અડધો ઈંચ વરસાદ પડ્યો

[illegible]

સાસરપંથમાં એક ઈય મેઝામાં ૨૦ વાસણા વિસ્તારમાં ૧૦ મિલીમીટરથી વધુ વરસાદ મળવાને કારણે વધુ વરસાદ થવાનો ખેડૂતોને અનુભવ થયો છે. આવા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ખેતરોમાં પાણી ભરવાની જરૂર નથી પડતી. આવા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ખેતરોમાં પાણી ભરવાની જરૂર નથી પડતી. આવા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ખેતરોમાં પાણી ભરવાની જરૂર નથી પડતી.

शहरमा क्या-उटवो वरसाह			
दिनांक	ठा	माथप	र४
शनिवार	उ२	४५०	४१
रविवार	४३	४५५	४३

KALAMANDIR
YOUR FAVOURITE JEWELLERY DESTINATION

TODAY'S 22KT GOLD RATE TODAY'S 18KT GOLD RATE

87090/- Per 10 Gms. **74990/-**
Per 10 Gms.
MINIMUM PURCHASED QUANTITY 100 GRAMS ONLY
CONTACT US: 011-2610 7070

એકતરફ આકાશી આકૃત બીજી તરફ ખોદેલા રસ્તા
નિકોલમાં કોર્પોરેશને રોડ બોદી
નાખતા રહીશો પારાવાર મુશ્કેલીમાં

અમદાવાદનાં સત્તા બે દિવસથી રાજીવાર વરસાદમાંથી પસાર થઈ ગયેલા છે. આજે રાત્રીના પાંચ વાગ્યાનાં સમયે પાણીની પસાર થઈ ગઈ છે. આજે રાત્રીના પાંચ વાગ્યાનાં સમયે પાણીની પસાર થઈ ગઈ છે. આજે રાત્રીના પાંચ વાગ્યાનાં સમયે પાણીની પસાર થઈ ગઈ છે.

[illegible]

ઓવરઈરિયા બાર એકાદામના પરિશામને પડકારતી
કાયદાશાખાની વિદ્યાર્થીનીની રિટમાં

બોસોઆઇન હાઇકાંટની નોટસ અમદાવાદ, મેમ્બરવાર ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬

HOW TO BRAND INDIAN PRODUCTS Globally

June 19 (10 AM to 1 PM)
**PRACTICAL STEPS TO VERIFY
BUYERS & PREVENT FRAUDS**
June 19 (2 PM to 5 PM)
HOW TO COMPLICATE

EXPORT PRICE

WITH TRANSACTION EXAMPLES!

June 20 (11:00 AM to 1 PM)

EXPORTING THROUGH

NORMAL RATE EXPORT SHIPS

GLOBAL RE-EXPORT NEWS June 28/29 (10 AM to 5 PM) EXPORT MARKETS FOR FOOD INGREDIENTS June 28/29 (10 AM to 5 PM)	संयोजन का प्रसार है (दो वर्षों में)। (व्यापक) नया अर्थव्यवस्था में काया के दोषों के कारण परिवर्तन के कारण है। पुनर्विनिर्माण के बाद, निर्माण का मापन और दोषों के कारण संयोजन के दोषों के कारण परिवर्तन के कारण है।
---	--

**EXPORT OPPORTUNITIES
IN E&E COUNTRIES**
June 19 (3 PM to 6 PM)

For more info:
Tel: 077-265 0800/55, 0742300000
Fax: 077-265 0800/55, 0742300000
E-mail: info@europe-direct.com



पिप्लू विल्लु आबुस एरिचि एरिचि

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી ૧૮ના
માતઃ આજે ૮ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'

રેલ્વે ડેપુ ડાસ (અન.ડી.આર.એલ.)ની ૧૨ ટીમ સિલિંગ
કિલ્લોવામાં જ્યારે સ્ટેડ ડિપાર્ટર ડેપુ ડાસ
(એસ.ડી.આર.એલ.)ની ૬૦૦ સિલિંગમાં ઉતારવામાં
આવી છે. દરમિયાન મુખ્યત્વે અમદાવાદ સિલિંગ ૮ કિલોમી
માટે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ અપાયું છે.

ગુજરાતના ૨૦૮ તાલુકામાં મેઘમહોર : ભાવનગરના બરવાળા, સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં ૬ ઈંચથી વધુ

तल्लुगुनामिपेरुवर्गवर्गवनी, वेमोयोट्टाडल
मन्नायणना, तौपु, वुडु, एम.एच.एच.एच.
पराय, डकी, गीळु तल्लुगु, डूडु-मन्नायणना


[illegible][illegible][illegible]

1000

ଆହୁରନା ଗେ ମିମ୍ବର

આવકાર
વર્ષારાણીને

ઉનાળાને
વિદાય

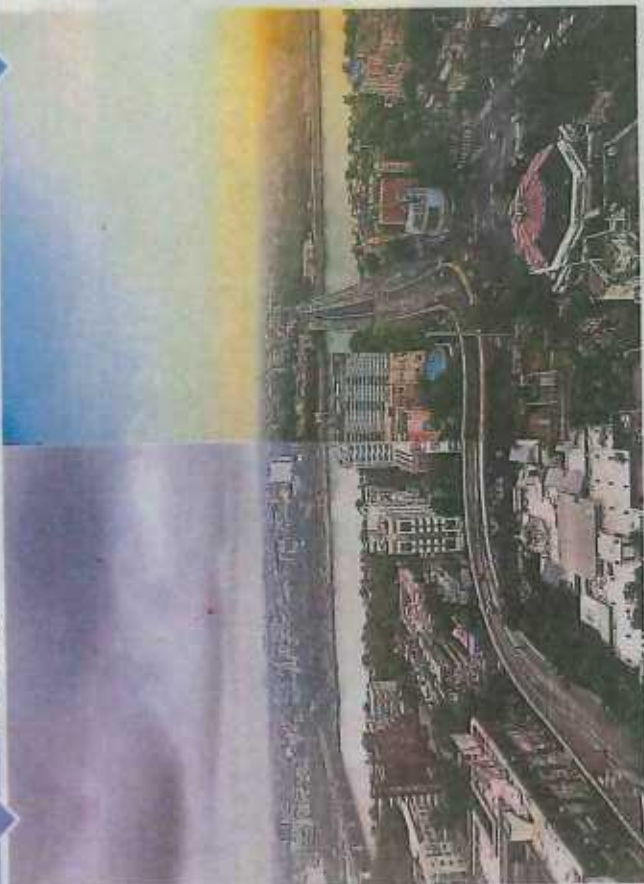[illegible]

વટવા. સરખેજમાં એક-એક ઈંચ : સરેરાશ અડધો ઈંચ વરસાદ

શહેરના રામોલ નિકોલમાં દોઢ ઈંચ વરસાદ વરસ્યો

[illegible]

■ २७ जूने शहेरामं रथयात्रा सादरार्थी
योनवी के नही, चर्या-वियारण शत्रु

[illegible]

જિલ્લાના ૧.૮૦ લાખથી વધુ ખેડૂત ખાતેદારોનો સમાવેશ

અમદાવાદ જિલ્લામાં ૪૮ હજારથી વધુ સરવે નંબરની જમીન નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં ટ્રાન્સફર થશે

૨૩૫૭૭૭થી વધુ સર્વે નંબરો જની શરતમાં ટાન્સફર હવે ઓન.ઓ. માટે પ્રીમિયમ ભરવામાંથી મુક્તિ

[illegible][illegible]

શ્રાવણમાં આવેલી સરસી જમીન નેરોની જમીન તરીકે સરસાંબી જુની ના સાથે ૧૯૭૭ અને ૧૯૭૮માં ૩૦૦૦ ચોરસ ફીટ જેટલી જમીન હાથે પેટા કરી

[illegible]

તાલુકો	કુલ સરેરાશ નંબર	પુલી સરેરાશ નંબર	ગ્રામીણ સરેરાશ નંબર
સાગાં	૨૩૩૧	૧૩૨૬	
બાજાળા	૧૦૧૧૬	૬૦૦૬	
બાળકા	૧૦૧૬૧	૬૩૫૮	
ધાંધુડા	૧૭૦૦	૬૩૫૧	
સોશરા	૨૨૧૬	૧૧૫૧	
કિરતરાજા	૭૧૬૭	૩૩૮૮	
મોડા	૩૨૨૧	૧૦૨૧	
દસકાંઠા	૩૨૦૫	૧૨૩૬	
કોશી	૭૨૦૦	૩૦૧૧	

પાલેન કેશ દર્શતનાના ૧૫મા દિવસે સ્થયાત્રા કેવી રીતે ચોક્કસી તે અંગે અસમંજસવા


રથયાત્રા માત્ર રથ, પ્રસાદની ટુક સાથે નીકળે તેવી શક્યતા

મંદિર ટ્રસ્ટ અને રાજ્ય સરકારની
બેઠક બાદ અંતિમ નિર્ણય લેવાશે

1991 में भी सम्मान है। आ तरफ अर्जुन प्रोडिक्टर का उद्देश्य है देश के रसायन, खाद्य और जीव विज्ञान के प्रगतिशील विचारों को प्रसारित करना। अर्जुन प्रोडिक्टर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें और पत्रिकाएँ देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अग्रणी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई हैं। अर्जुन प्रोडिक्टर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें और पत्रिकाएँ देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अग्रणी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई हैं। अर्जुन प्रोडिक्टर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें और पत्रिकाएँ देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अग्रणी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई हैं।




આર્થિક સ્થાપીત

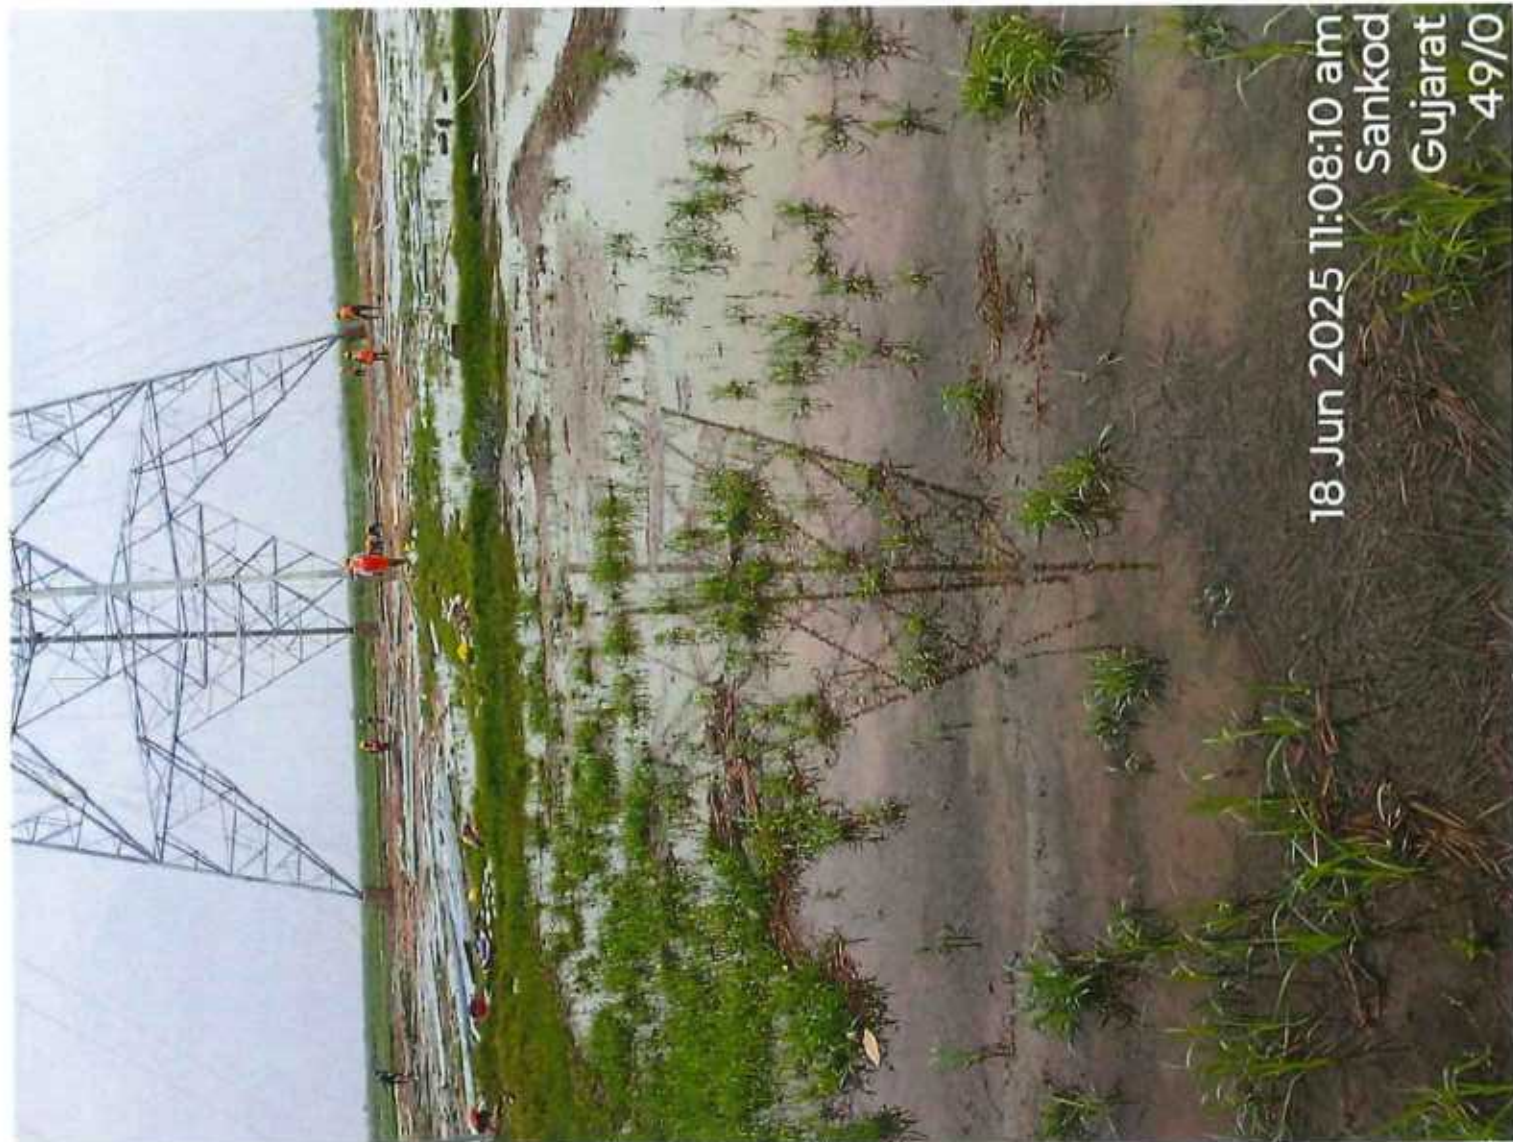

18 Jun 2025 11:08:10 am
Sankod
Gujarat
49/0



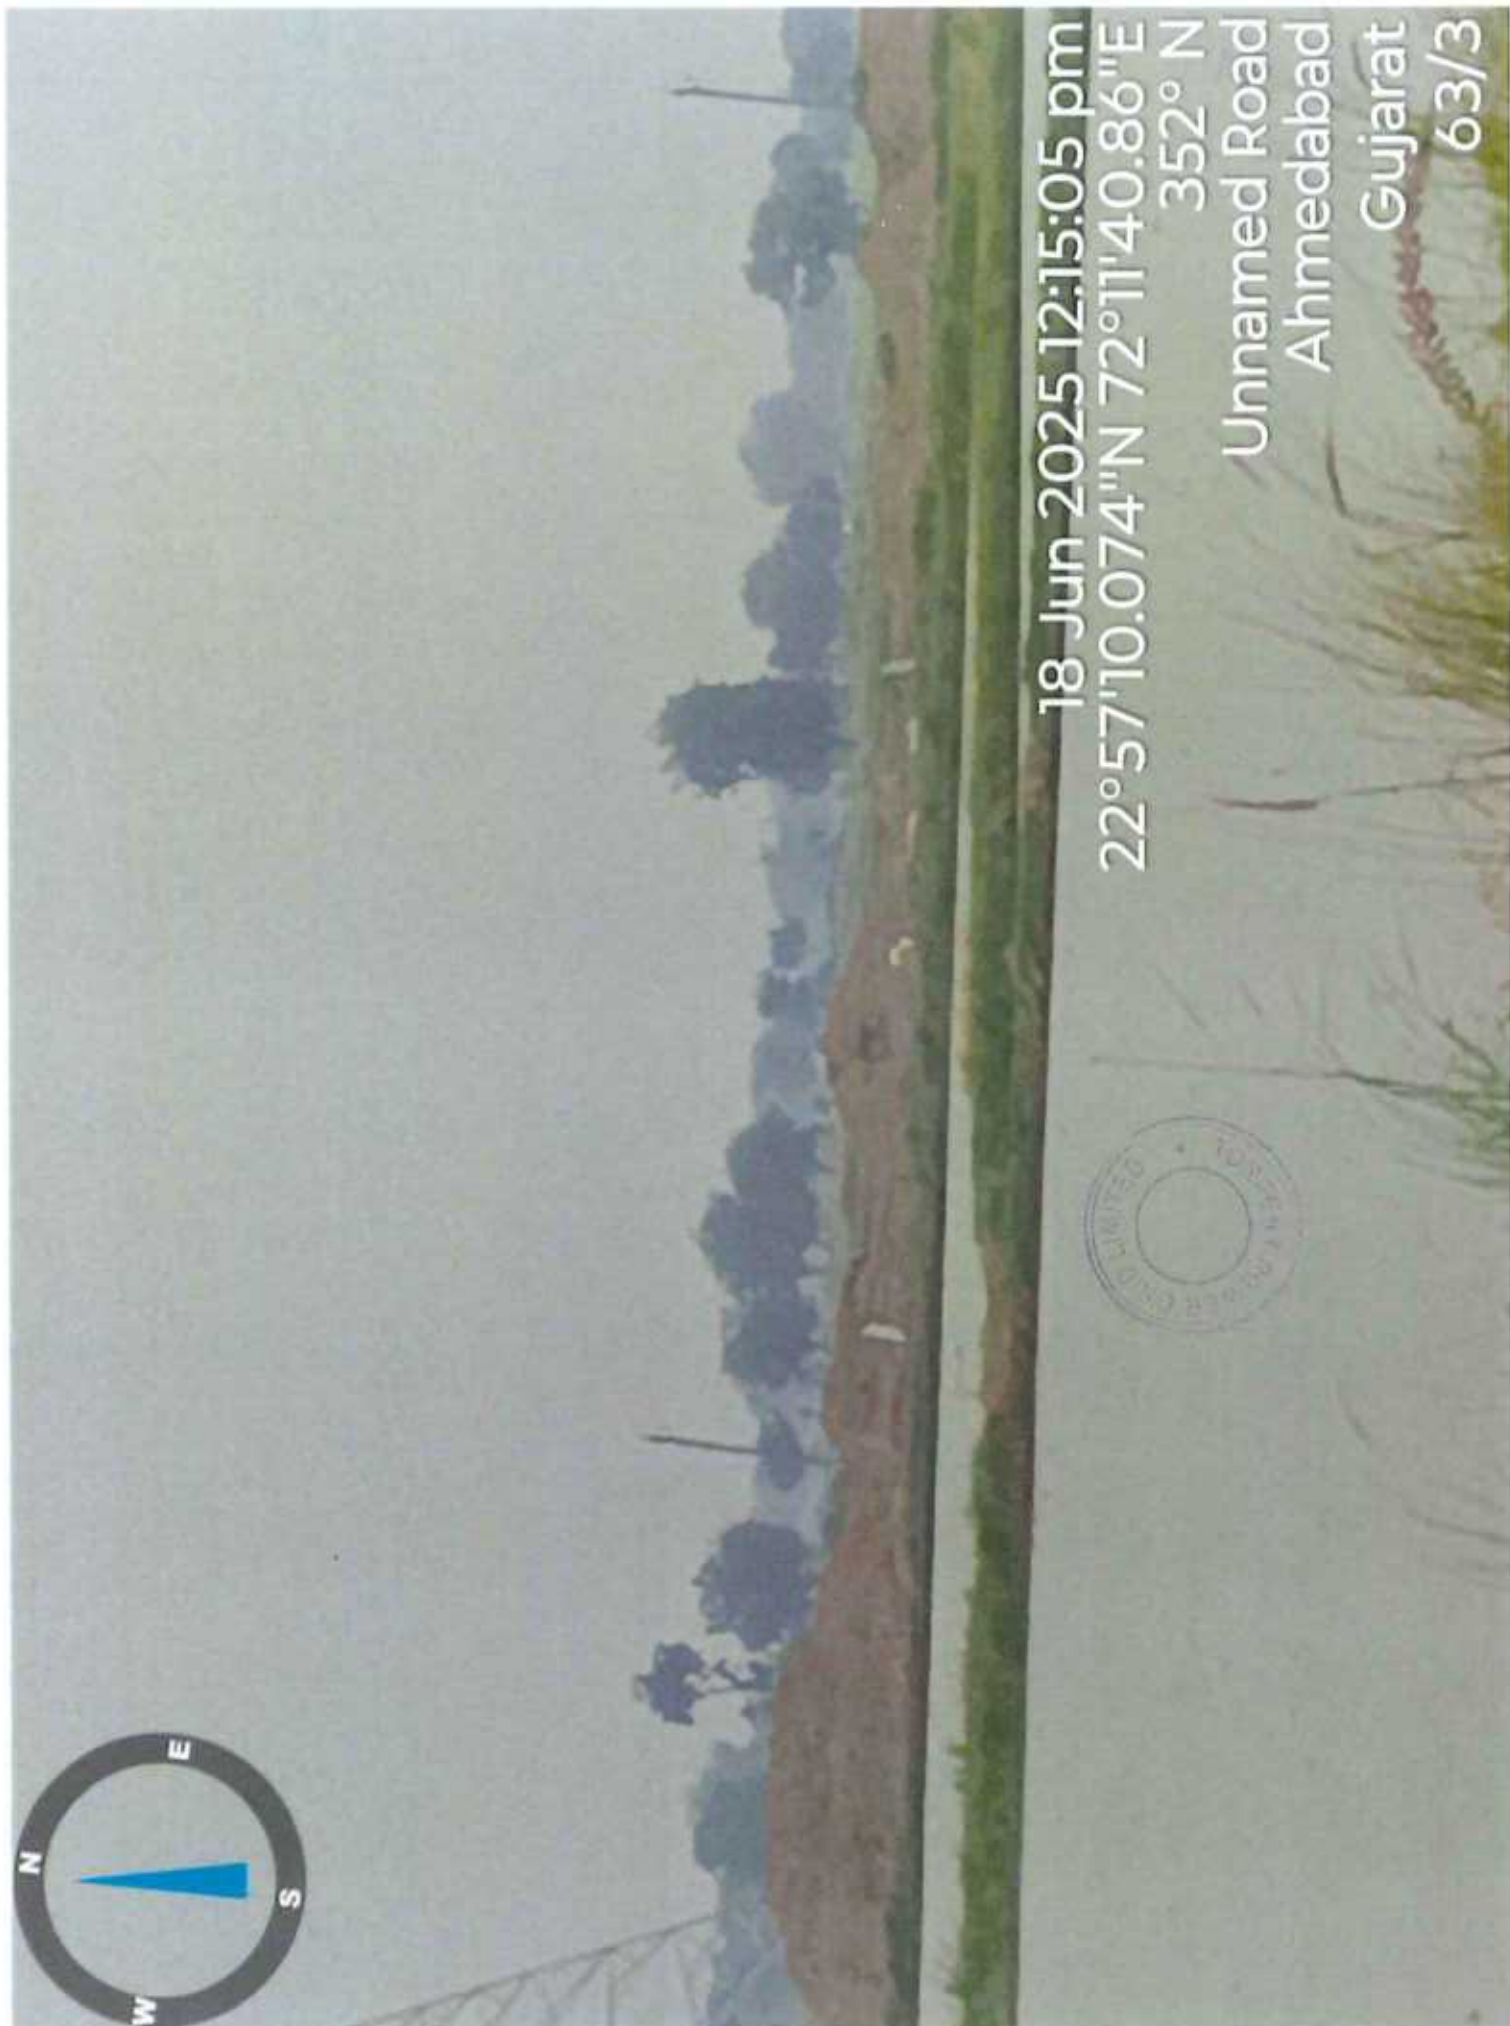

18 Jun 2025 12:15:05 pm
22°57'10.074"N 72°11'40.86"E

352° N

Unnamed Road

Ahmedabad

Gujarat

63/3

Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Inc.

આગામી 6 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી
દવામાન ખાતા દ્વારા ગુજરાતમાં ચોમાસાના પ્રારંભની વિધિવત જાહેરાત



0170-2508/00

[illegible][illegible]

સાતેય મૃતકોના લામ

બાલક (બાઈડેન) હિંમત તલધેરુ ૧ મી. ૧૦.૫૫	મનમોહન વાલેખા (45)
૧૫ મુદતક મળા. બાઈડે. ૩૦. 16 મી. ૧૦.૫૫	મુખેન વાલેખા (72)
૩૫ મુદતક મળા. બાઈડે. ૩૦. 16 મી. ૧૦.૫૫	મુખેન વાલેખા (48)
૩૫ મુદતક મળા. બાઈડે. ૩૦. 16 મી. ૧૦.૫૫	મુખેન વાલેખા (22)
૩૫ મુદતક મળા. બાઈડે. ૩૦. 16 મી. ૧૦.૫૫	મુખેન વાલેખા (75)
૩૫ મુદતક મળા. બાઈડે. ૩૦. 16 મી. ૧૦.૫૫	મુખેન વાલેખા (72)
૩૫ મુદતક મળા. બાઈડે. ૩૦. 16 મી. ૧૦.૫૫	મુખેન વાલેખા (72)

॥ ७ भुवनेह भवत ॥

બોટાદ । શહેરના ઉડીમાં તરફથી ૬ વાંડોમાંથી ૭૫૫ મુનફેડ મળ્યા. શહેરના ૧૬ તાલુકો સારે ઉડો કાર પછાતોમાં તરફથી સર્વે આ ઉડીમાં ૧ લાખે સુધારે જતા. ૩ વાંડો સાથેના થયા હતા. ત્યાર બાદથી આ તપાસ સામે પુરોગામી મુનફેડ પછી આવ્યા છે. જેના છ મહિના અને એક પુરુષ છે. જ્યારે શહેરના ૩૫ વાંડોમાંથી ૭૫૫ મુનફેડ મળ્યા.

સાતેય મૃતકોના લામ

नमूनाओं पर (45),
 नमूने पर (72),
 जीवाणु बीजाणु (48),
 विभिन्न बीजाणु (22),
 नमूना बीजाणु (75),
 नमूना बीजाणु (72),
 विभिन्न बीजाणु

વેરાવળ-ગાંધીનગર કેપિટલ હયે રાબેતા મુજબ
દેહરાદૂન-ઓખા ઉત્તરાંચલ
ટ્રેનના ટાઈમટેબલમાં ફેરફાર
ફેરફાર 29 જૂનથી આગામી સુધી લાગુ

[illegible]

સુરતમાં ૨ કરોડની ખંડણીના ગુનામાં ૧૦ મહિનાથી વોન્ટેડ
ખંડણીખોર વિવાદી સોશિયલ મીડિયા
ઈન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની ધરપકડ

સંસ્કૃત
સાહિત્ય
ગ્રંથો
પ્રકાશન



સંસ્કૃત
સાહિત્ય
ગ્રંથો
પ્રકાશન

સંસ્કૃત
સાહિત્ય
ગ્રંથો
પ્રકાશન



સંસ્કૃત
સાહિત્ય
ગ્રંથો
પ્રકાશન

સુરતમાં કોમ્પલેક્ષના સાતમા માળે બંધ બારણો નશાનો ખેલ

સુરતમાં કોમ્પલેક્ષના સાતમા માળે બંધ બારણો નશાનો ખેલ

બનાસકાંઠામાં અરજદારની જાણ બહાર વહીવટ

બનાસકાંઠામાં અરજદારની જાણ બહાર વહીવટ

દીવમાં એક સાથે સાત મૃતદેહ આવતા વાતાવરણ ગમગાન

દીવમાં એક સાથે સાત મૃતદેહ આવતા વાતાવરણ ગમગાન



विद्युत पम्प-२

जनो सबी

डिप्टी कमिश्नर

जिला नाना

क्र.सं. **नाम**

१	१००७३
२	१००७४
३	१००७५
४	१००७६
५	१००७७
६	१००७८
७	१००७९
८	१००८०
९	१००८१
१०	१००८२
११	१००८३
१२	१००८४
१३	१००८५
१४	१००८६
१५	१००८७
१६	१००८८
१७	१००८९
१८	१००९०
१९	१००९१
२०	१००९२
२१	१००९३
२२	१००९४
२३	१००९५
२४	१००९६
२५	१००९७
२६	१००९८
२७	१००९९
२८	१०१००
२९	१०१०१
३०	१०१०२
३१	१०१०३
३२	१०१०४
३३	१०१०५
३४	१०१०६
३५	१०१०७
३६	१०१०८
३७	१०१०९
३८	१०११०
३९	१०१११
४०	१०११२
४१	१०११३
४२	१०११४
४३	१०११५
४४	१०११६
४५	१०११७
४६	१०११८
४७	१०११९
४८	१०१२०
४९	१०१२१
५०	१०१२२
५१	१०१२३
५२	१०१२४
५३	१०१२५
५४	१०१२६
५५	१०१२७
५६	१०१२८
५७	१०१२९
५८	१०१३०
५९	१०१३१
६०	१०१३२
६१	१०१३३
६२	१०१३४
६३	१०१३५
६४	१०१३६
६५	१०१३७
६६	१०१३८
६७	१०१३९
६८	१०१४०
६९	१०१४१
७०	१०१४२
७१	१०१४३
७२	१०१४४
७३	१०१४५
७४	१०१४६
७५	१०१४७
७६	१०१४८
७७	१०१४९
७८	१०१५०
७९	१०१५१
८०	१०१५२
८१	१०१५३
८२	१०१५४
८३	१०१५५
८४	१०१५६
८५	१०१५७
८६	१०१५८
८७	१०१५९
८८	१०१६०
८९	१०१६१
९०	१०१६२
९१	१०१६३
९२	१०१६४
९३	१०१६५
९४	१०१६६
९५	१०१६७
९६	१०१६८
९७	१०१६९
९८	१०१७०
९९	१०१७१
१००	१०१७२

क्र.सं. **नाम**

१	१०१७३
२	१०१७४
३	१०१७५
४	१०१७६
५	१०१७७
६	१०१७८
७	१०१७९
८	१०१८०
९	१०१८१
१०	१०१८२
११	१०१८३
१२	१०१८४
१३	१०१८५
१४	१०१८६
१५	१०१८७
१६	१०१८८
१७	१०१८९
१८	१०१९०
१९	१०१९१
२०	१०१९२
२१	१०१९३
२२	१०१९४
२३	१०१९५
२४	१०१९६
२५	१०१९७
२६	१०१९८
२७	१०१९९
२८	१०२००
२९	१०२०१
३०	१०२०२
३१	१०२०३
३२	१०२०४





www.ijournalsonline.com

હાદાવાદ શહેરમાં અલખ વ્યાનિય અને પ્રી-માનયુન તૃપારીઓના ૬૨ વર્ષે ગુણગાન ગવાયા આવે છે. ૬૨ વર્ષે સોમાતામાં વરસાદ પડે ત્યારે વિત્તારમાં ઘોઠશણ પાણી ભરાવા, એકરપાત વધે કરવા કરજ પાવની, ઠાંકડી જેવી સમસ્યાનો કોઈ જાને સામનો કરવો પડે છે. વરસાદ બે ડિગ્રી હોય કે ત્રણ, ત્રણે પડે કે દિવસે એક વરસાદ પડે તો બધા અચાનક બેસી જાય છે. આવા વરસાદમાં કોઈ રીતે કારકર સાબિત થઈ નથી. આવી એક સમસ્યા મુલા પડવાની છે. શહેરમાં મુલા પડી રહ્યા છે. રસ્તા બેસી જાય છે અને વરસાદના કારણે 'ચંદના કોર' પણ સોળ કરવા પડે છે. આવા અચાનક વરસાદમાં ફરી શહેરનીજનોએ વરસાદી પાણીમાં પ્રી-માનયુન તૃપારીઓની નિષ્કળતા તરતી જોવા પળી હતી.

ત્રણ ઈંચ વરસાદમાં શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ

પાંચ અંડરપાસ બંધ કરાયા, એક ડહાનથી વધુ વૃક્ષ ક્ષરાશાયી,
૬૭ રાત્રે ભવ્ય પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. કલકત્તાના પાંચ મંત્રી, જેમણે
પાંચ અંડરપાસ બંધ કરાયા, એક ડહાનથી વધુ વૃક્ષ ક્ષરાશાયી,
૬૭ રાત્રે ભવ્ય પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. કલકત્તાના પાંચ મંત્રી, જેમણે

સિદ્ધિ ફેસ્ટ

માં રેલ માલોડવાલ જેકાલાલ
1933 વાઈબ્રેટોનો શિલાન્નાલ ગાંધીજીએ કર્યા
હતો. તેનું લોકાર્પણ વરદાર પટેલે 1938માં કર્યું હતું.

divyabhaskar.com

વીકેન્ડ પ્લાનર

20થી 22 જુન

લેક્સ ગ્રીડ એટ ઇન્ડિયન કાર્પોરેશન

• 20 જુન, સોરે 5.30 વાગ્યાથી : એલડી મ્યુઝિયમ
આલિયન : આ કાર્યક્રમમાં મ્યુઝિયમ ખાતે 11 મ્યુઝિયમ ઓફ
ઈમિજિનેશન કિલ્લનું સોનિયલ થશે.

કલા પ્રતિભા એવોર્ડ સમારોહ

• 20 જુન, સોરે 5.30 વાગ્યાથી : ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ
આલિયન : પ્રફુલ્લ દવે કલા પ્રતિભા એવોર્ડ સમારોહમાં
સિનિયર સિમ્તાર વૃદ્ધાવન સોલ્ડીને એવોર્ડ એનાયત થશે.

કોમેડી નાઈટ વિથ આલિયન વિવાર્ધી

• 20 જુન, સોરે 6.30 વાગ્યાથી : પેલેટિયમ મોલ
આલિયન : આલિયન વિવાર્ધી દ્વારા સ્પેશિયલ કોમેડી
નાઈટનું આયોજન કરવામાં આવશે.

કોટોગાંધી એક્ઝિબિશન

• 20 જુન, સોરે 6.30 વાગ્યાથી : લલિતકલા આર્ટ ગેલેરી
લો ગાર્ડન.
આલિયન : નિલરિયા કોટોગાંધી સમ્બોએ હેરિટેજ
સ્થળની કોટોગાંધી કરી હતી જે અને સ્વાઈડ શો ચોજશે.
કોટોગાંધીમાં રસ પરાવર્તી કોઈપણ વ્યક્તિ નિહાળી શકે છે.

સમરગ્રામ HOMAGE ફેસ્ટિવલ

• 21-22 જુન, સોરે 7 વાગ્યાથી : CEE ઓડિટોરિયમ
આલિયન : સમારગ્રામ HOMAGE ફેસ્ટિવલમાં કલાકારો
ગ્રાન્ડ મ્યુઝિકના કલાકારો પોતાની પ્રસ્તુતિઓ આપશે.

હુમરે રામ

• 22 જુન, બપોરે 3.30 વાગ્યાથી : ઓડિટોરિયમ, રોલા
આલિયન : હુમરે રામ ગોસ્વમીના કલાકારો હુમરે રામ રજૂ કરશે.

શાસન

• 22 જુન, સોરે 4 વાગ્યાથી : ટીમટીમ લાઈસ
આલિયન : બોડી ગેમ નાઈટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
છે, જેમાં ગેમ માસ્ટર દ્વારા હારેક ગેમને લીડ કરાશે.

ફેસ્ટ-એ સમારગ્રામ

• 22 જુન, સવારે 7 વાગ્યાથી : પેલેટિયમ ગાર્ડન
આલિયન : ઈવેન્ટ 3 ટીમમાં થશે, જેમાં શાસનના વિવિધ
પોઈન્ટ પર 25 ક્લુ મુકાશે અને વિજેતાને ઈનામ આપશે.

આ સપ્તાહ બનાસ ઈવેન્ટ અલગ આયોજનથી
જાણકારી અપને 93227041762 પર વોટ્સએપ કરો
અથવા cbmabnashah@divyabhaskar.in પર ઈમેલ કરો.

તાપમાન / હવામાન

હિસ 31.0° નાનપન | રાત્રે 23.6° વાનપન



દિવ્ય ભાસ્કર

ગાંધીધામ, ઇલેક્ટ્રિક, 20, 76, 2025

અમરજી દુધાઈ, ચલારામ,
સવાર : 7.30 વાગ્યે

બુધવારે મોડી રાત્રે 2 વાગ્યાથી વરસાદ શરૂ થયો, વીજળીના પ્રચંડ કડાકાથી લોકો ઘરમાં પાણી કરી ગયા હતા. 3 કલાકમાં સરેરાશ 3 ઈંચ વરસાદ, 105 સ્થળે અડધાથી 4 ફૂટ સુધી પાણી ભરાયાં, નિકોલમાં ડૂબી જવાથી એકનું મોત. રામોલ ટોલ ટેક્સથી નિકોલ સુધી 6 કિમીમાં સવારથી શરૂ કરી બપોર સુધી જામ, 20 મિનિટને બદલે લોકોને નીકળતાં 2 કલાક લાગ્યા.

પશ્ચિમમાં 9 જંકશન પર ટ્રાફિક જામ, 130થી વધુ કોલ મળ્યા.

કામલિયાર / અમરજી

વરસાદને કારણે ટ્રાફિક ચોરીસને ટ્રાફિકજનના 130થી વધુ કોલ મળ્યા હતા. એકાદ દિવસ રોડ નિહાલ ચારસના કોણી કોટેલ જુવારે પશ્ચિમમાં વેબસોરેલી અમામનનગર, વાડજ, પાંજરાપોળ, પેપલ્ટી ચારસના એકાદ હાઉસ, સરભજ ચારસના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સાર્વજિક રોડો પર ટ્રાફિકજામ જોવા મળ્યો હતો. ટ્રાફિક અસરકારક વિસ્તારોમાં બમણા કમ્પાઈનો કાંઠેલો ઉતાણો હતો અને ટ્રાફિકજામ દૂર કરવાનો હતો.

એ દિવસ વરસાદનું જોર દરમિયાન 102.4 મીટર જેટલો

વિવિધ વિસ્તારના 6 સ્થળે રોડ પાણી ભરી ગયા




પાલડી ચારસના પાસે ભારે વરસાદને કારણે રોડ ભરી ગયો હતો. મધુમાલતીમાં એટલું પાણી ભરાયું કે, 108 ઑન્ટન આવી થકી, ડૂબેલાને લાતીમાં લઈ જવાયા હતા.

યા 11 સ્થળે પાણી ઉતરતાં 5 કલાક લાગ્યા


- કલકત્તા, મનમપુરા (1 ફૂટ)
- એલકલુક, સરભજ - બાદલ નગર, ગોતા (અડધો ઈંચ)
- બેનન ટ્રાપેંગલ, ગોતા (1 ફૂટ)
- એમ.એસ. એપાઈન્ટ રોડ, શાહીબાગ (1 ફૂટ)
- પેપલ્ટન આવાસ, વરસાલ (1 ફૂટ)
- જુનના પાર્ક સોસા, અડધો ફૂટ
- મધુમાલતી આવાસ (2 ફૂટ)
- કમળીબાગ એડરપાસ (4 ફૂટ ઈંચ)
- ડીકબીન અડરપાસ (2 ફૂટ)
- કુલેરનગર, અરનાપુ (1 ફૂટ)

યા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદ થયો



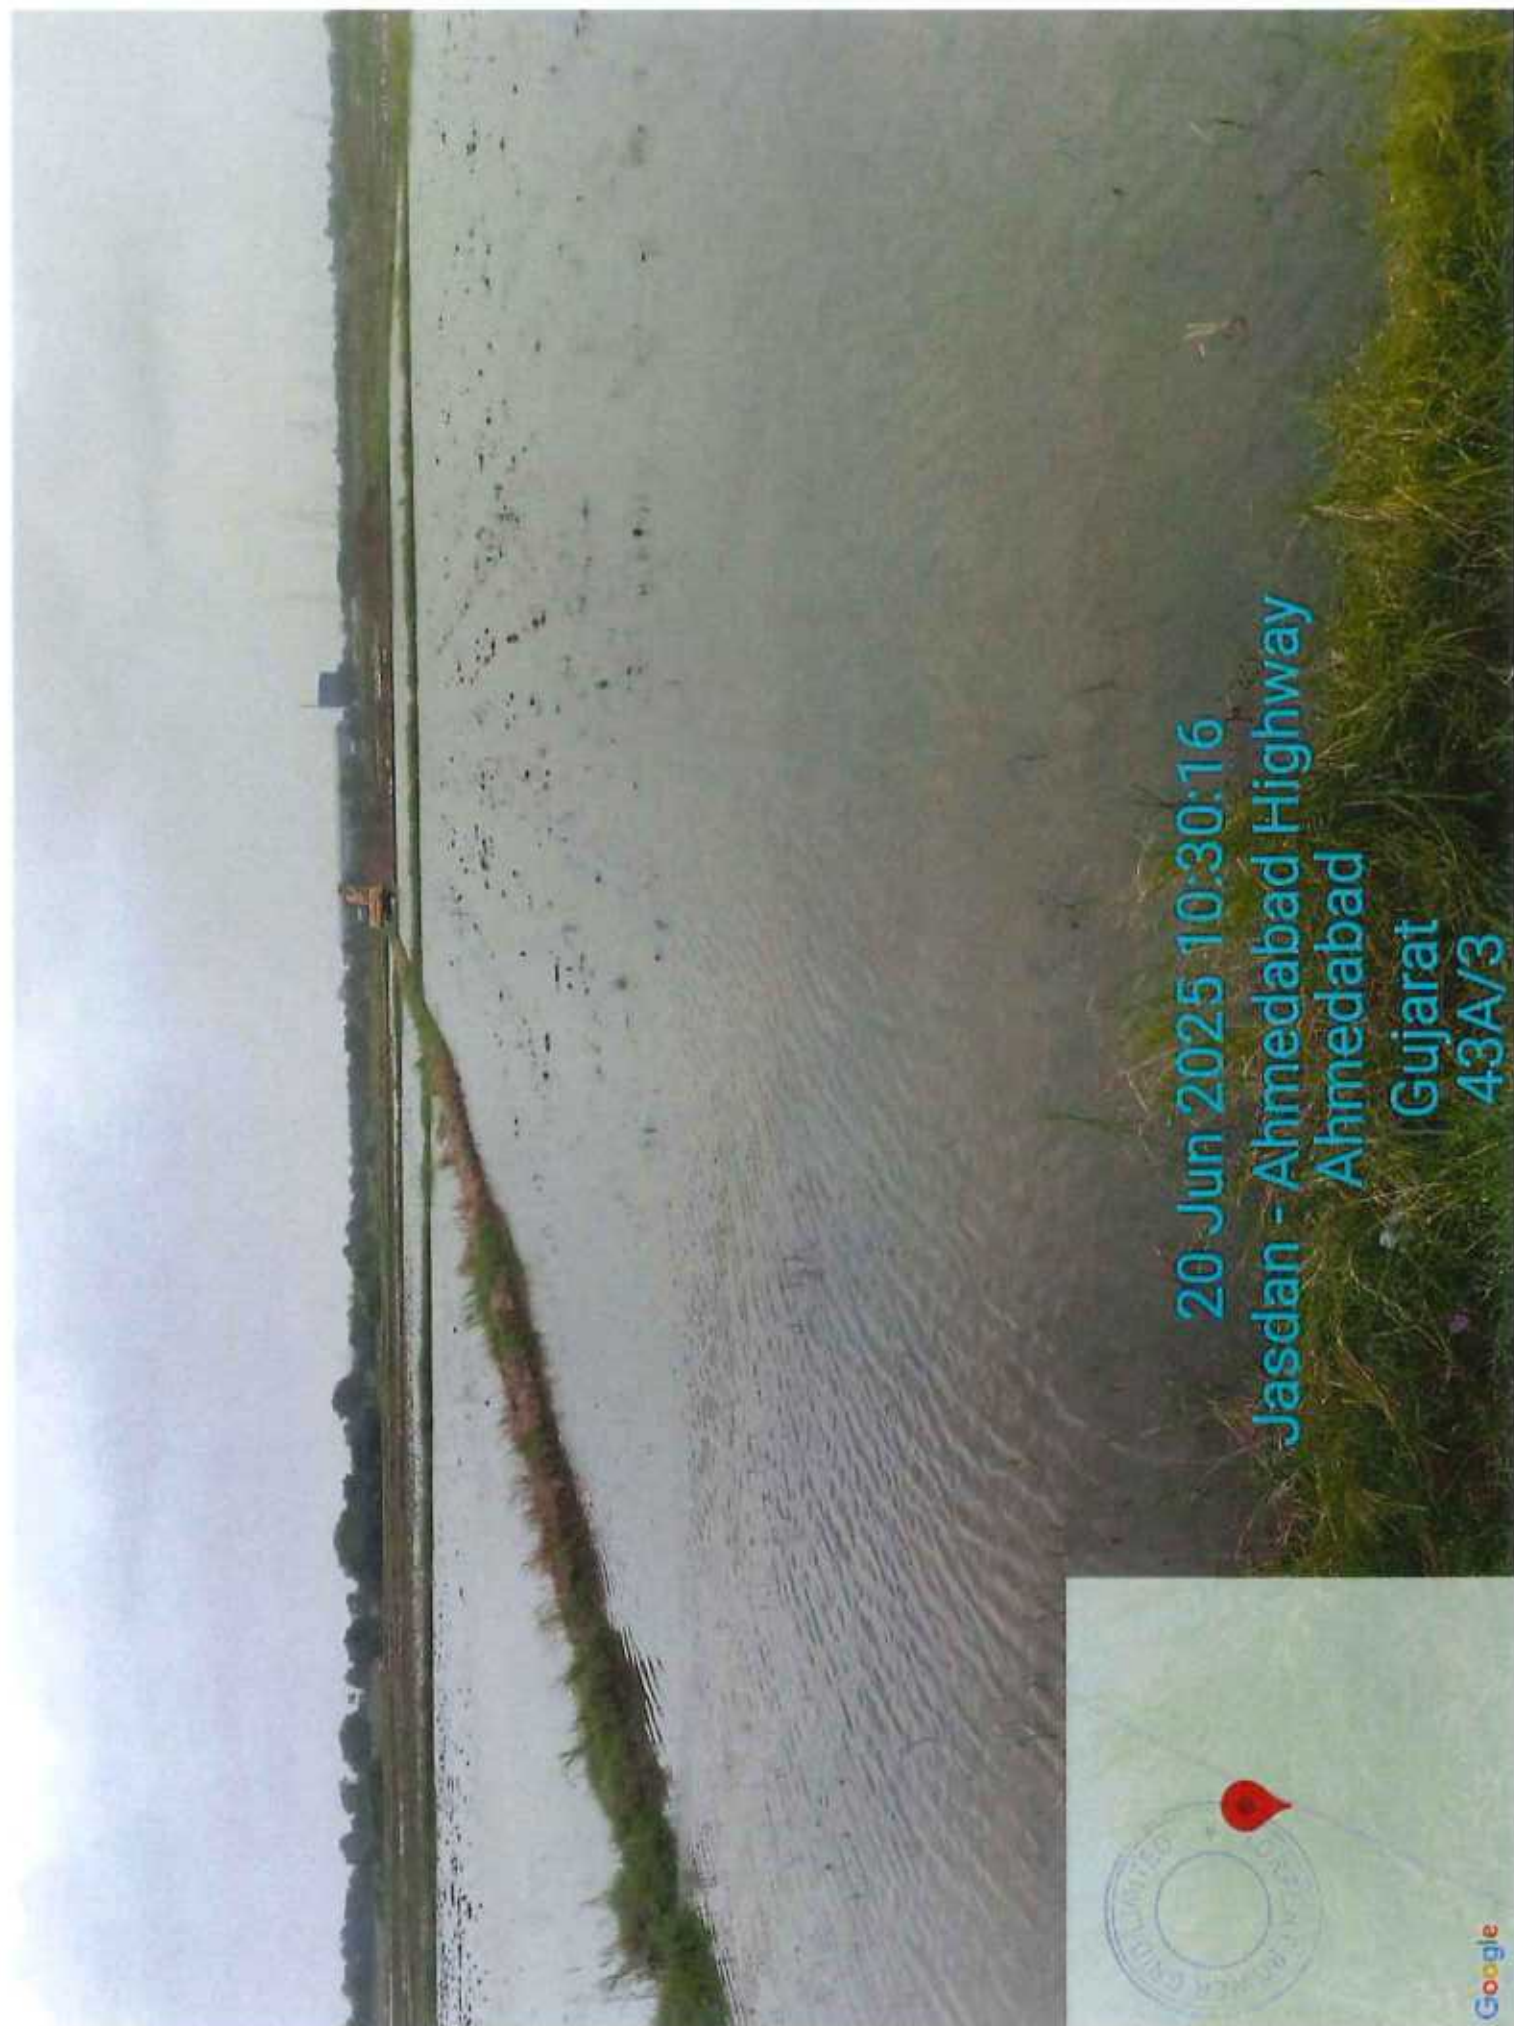

20 Jun 2025 10:30:16
Jasdan - Ahmedabad Highway
Ahmedabad
Gujarat
43A/3

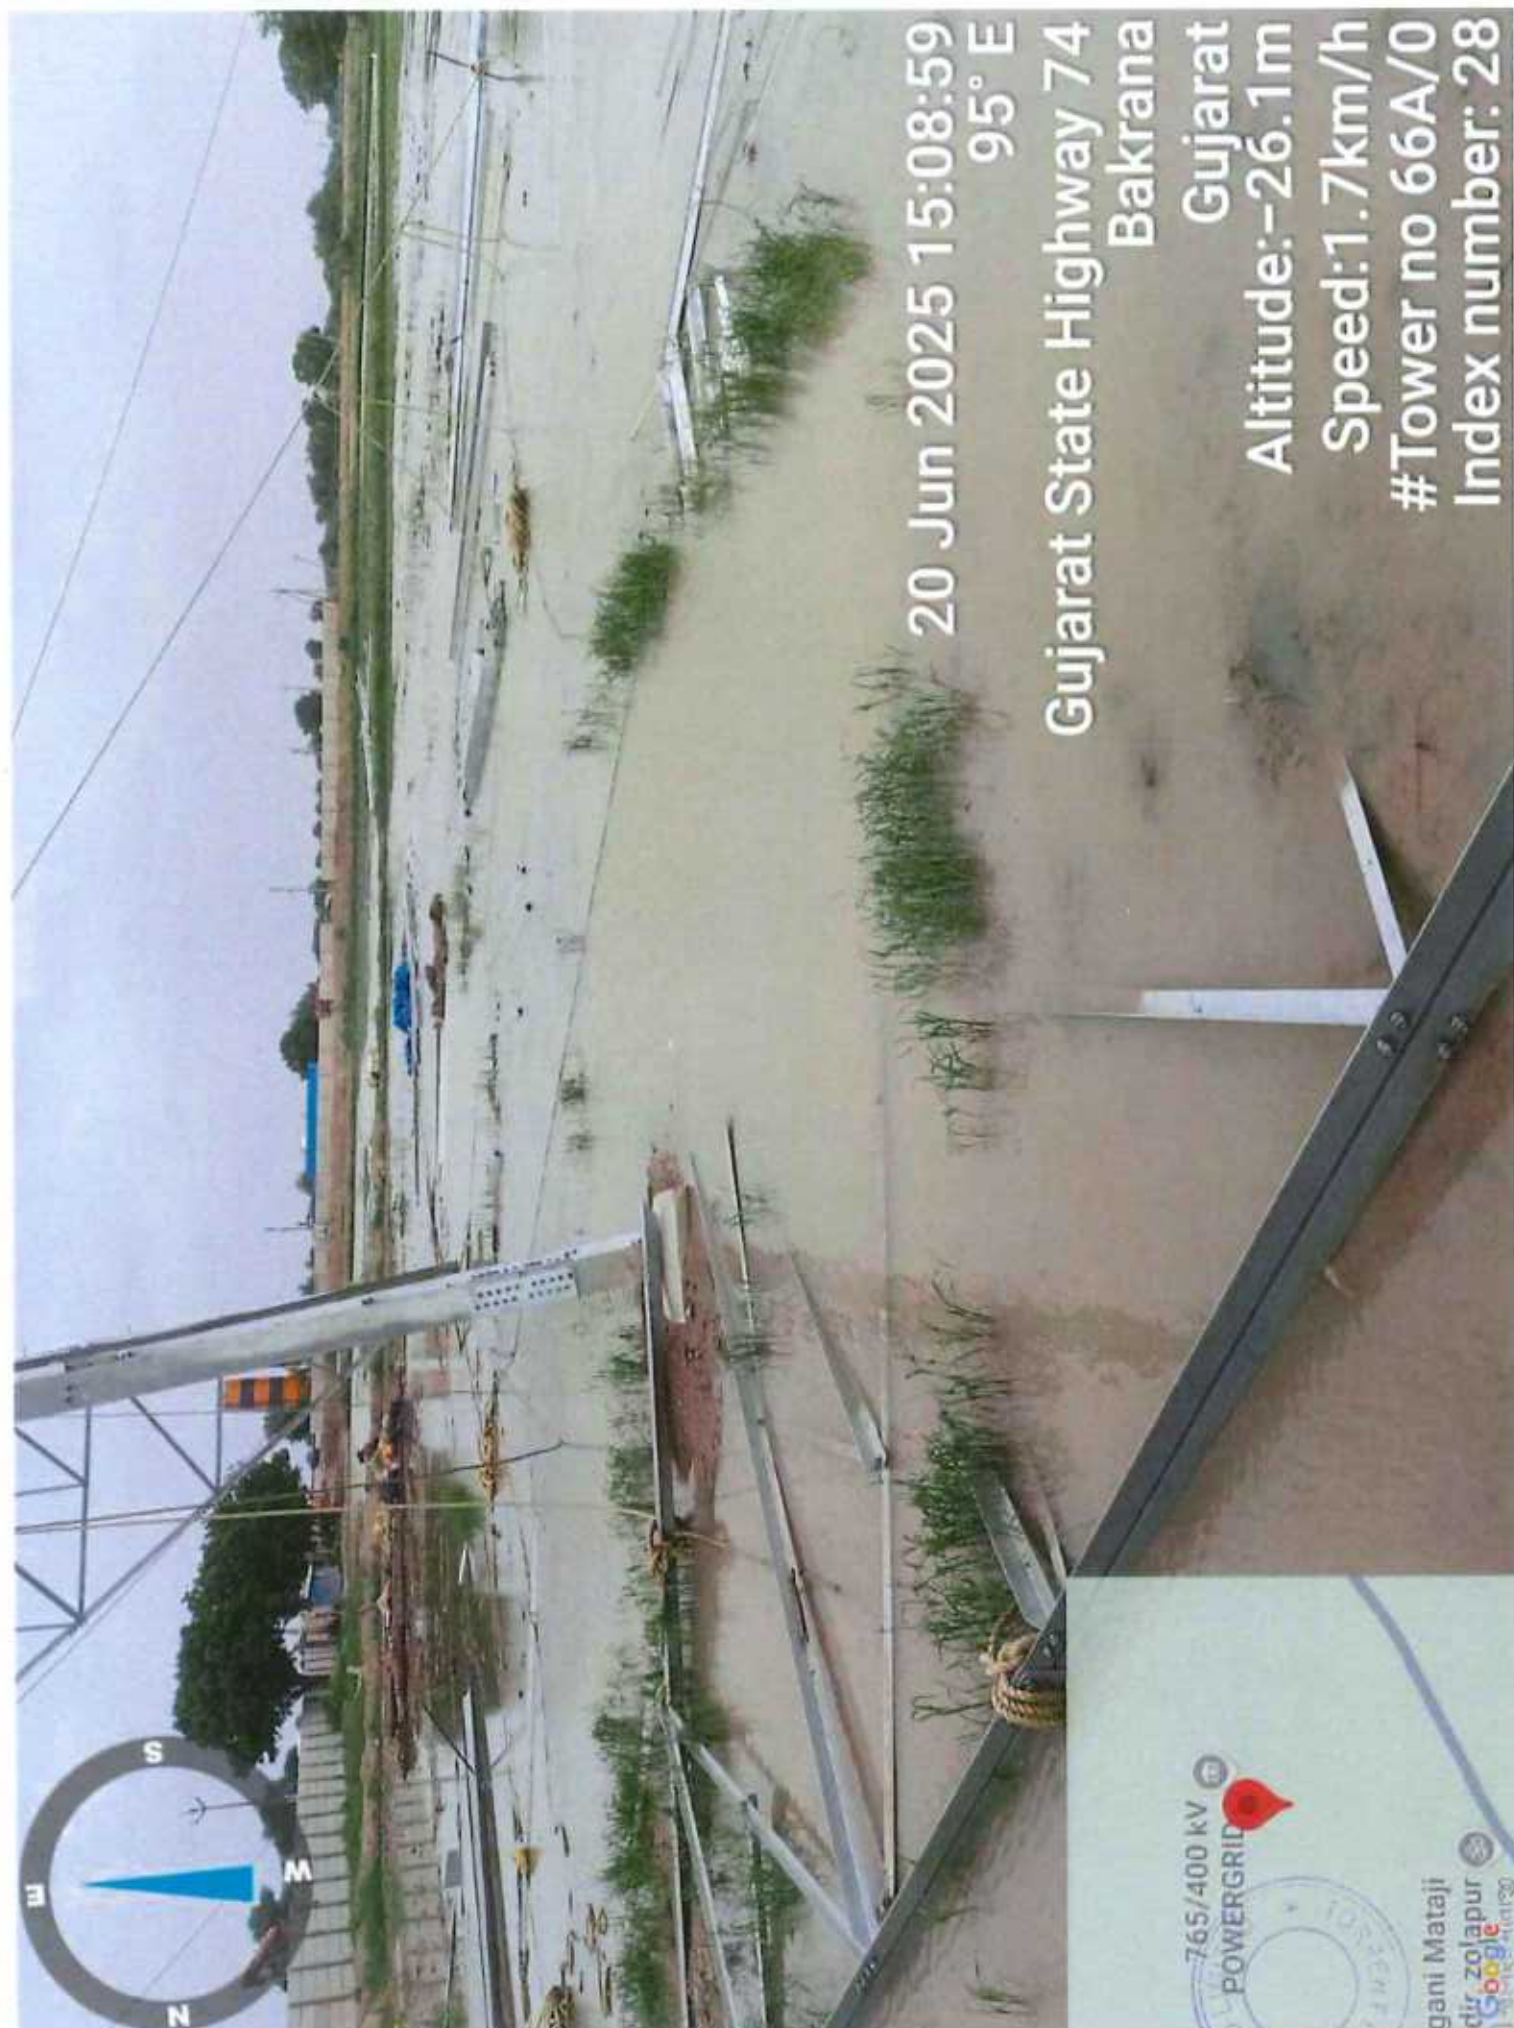

મહિલાની વિમાન કેશ કરવાની ધમકી

બેંગલુરુ : બેંગલુરુ સુરત જઈ રહેલી એર ઈન્ડિયા એકસેસની ફ્લાઈટમાં હોબાળો કરનાર ૩૬ વર્ષીય મહિલાની પરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમણે કથિત રીતે વિમાનને કેશ કરી દેવાની ધમકી આપી હતી, કેમ કે, કેપિન કુએ પ્રતિબંધિત જગ્યામાં સામાન મૂકવાની ના પાડી હતી. આ ઘટનાના કારણે વિમાનના ઉડ્ડયનમાં બે કલાક મોડું થયું હતું. યેલ્ડક નજીક શિવનહલ્લીનાં રહેવાસી હિરલ મોહનભાઈ વ્યાસની આરોપી તરીકે પરપકડ કરવામાં આવી છે. તેઓ બે બેગ સાથે એઆઈની ફ્લાઈટ IX૨૭૪૮માં એકલાં મુસાફરી કરતાં હતાં. પોલીસે જણાવ્યું કે, આયુર્વેદિક ડોક્ટરે ચેક-ઇન કાઉન્ટરની અવગણના કરીને બંને બેગ સાથે ફ્લાઈટમાં જવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. જ્યારે તેઓ વિમાનમાં બેસી ગયાં અને પોતાની એક બેગ કેપિન કુની નજીક મૂકી દીધી ત્યારે વિવાદ વધી ગયો હતો.

એમપી સરકારે ભોપાલમાં ૮૦ ડિગ્રી વળાંક ધરાવતા પુલ મુદ્દે સમિતિ બનાવી

ભોપાલ : મધ્યપ્રદેશના જાહેર બાંધકામ વિભાગ દ્વારા ૮૦ ડિગ્રી ક્રાટબૂલે વળાંક ધરાવતો રેલવે ઓવર બ્રિજ ઊભો થતા તે પુલ મજાક અને ટીકાનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે. હવે તેનું સમાધાન શોધવા એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. એશબાજ સ્ટેડિયમ નજીક ૧૮ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ઊભા થયેલા પુલનું ઉદ્ઘાટન પણ હજી બાકી છે. પુલની ડિઝાઇન સામે સવાલ સર્જાયા છે. વાહન માટે ક્રાટબૂલે વળાંક લેવો જ મુશ્કેલ છે. જાહેર બાંધકામ વિભાગના પ્રધાન રાકેશસિંહે ગુરુવારે કહ્યું કે, કેસની તપાસ કરનારી રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ સત્તામંડળની ટીમનું કહેવું છે કે જમીનની ઉપલબ્ધતાને કારણે પુલની જરા અજબ ડિઝાઇન પર (ક્રાટબૂલે વળાંક) પસંદગી ઉતારવામાં આવી હતી. ઉકેલ શોધવા અને સરળતાથી વાહન અવર જવર કરી શકે તેવો ઉપાય કરવા બે મુખ્ય ઇજનેરોની સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.

મણિપુરમાં મહિલાનાં મૃત્યુ બાદ આદિવાસી સંગઠનના બંધથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું

આઈટીએલએફની પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં બફર ઝોનના ઉલ્લંઘનની સ્વતંત્ર તપાસ કરવાની માગ

। દરજાલ ।

મણિપુરના ચુરાચાંદપુરમાં શુક્રવારે ફરી એક વાર સામાન્ય જનજીવનને અસર થઈ હતી, કેમ કે, એક આદિવાસી સંગઠને જિલ્લામાં અનિશ્ચિતકાલીન બંધનું આદેશન કર્યું છે. આ બંધ એક વૃદ્ધ કૂકી મહિલાની હત્યાના વિરોધમાં જાહેર કરાયું છે. બજારો અને અન્ય વેપારી સંસ્થાઓ બંધ રહ્યાં હતાં, જ્યારે માર્ગો પર વાહનવ્યવહાર ઠપ થઈ ગયો હતો. ઈન્ડિયન ટ્રાઈબલ લીડર્સ ફોરમ (આઈટીએલએફ)ના કાર્યકરોએ ઘણી સડકો જામ કરી દીધી હતી, જેમાં મહિલાઓ પણ સામેલ હતી. દેખાવો કરનારા લોકો લાઠીઓ સાથે માર્ગો પર ઊતરી પડ્યા હતા અને સુરક્ષા દળો અને અજાત હથિયારધારી લોકો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં વૃદ્ધ મહિલા હોઈમોલ્ટિંગ હાઓકિપના મૃત્યુના વિરોધમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે સરકારી કચેરીઓમાં ઘણી ઓછી હાજરી જોવા મળી અને બધી શિક્ષણ સંસ્થાઓ બંધ રહી હતી. ઈન્ડિયન ટ્રાઈબલ લીડર્સ ફોરમે ગુરુવારે સાંજે થયેલા ગોળીબારની ઘટના પછી બંધનું એલાન આપ્યું હતું. જેમાં હાઓકિપનું મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટના એવા સમયે થઈ હતી, જ્યારે સુરક્ષા દળ લાંગચિંગમાનબી અને હાઈચાંગલોક વિસ્તારમાં અભિયાન ચલાવતાં હતાં.

CM
મુસિ
૨
પાક., બ

આસામના શુક્રવારે મોટો તરફેણમાં પાંચ એકાઉન્ટ ઓ ગયા છે, જે ઈસ્લામિક દે થઈ રહ્યા છે. તે સુરક્ષાનો મામ પણ જણાવ્યું હ આ બાબતે મ તપાસની માગ સરમાએ પત્રક સોશિયલ મીડિ બન્યા છે અ બાંગ્લાદેશ એ મહિનાથી અ

૨૨ જૂનથી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત અને મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદી ગતિવિધિઓ વધશે

યોમાસાની દેશમાં છવાઈ જવાની તૈયારી, પૂર્વોત્તર માટે આગામી સાત દિવસ ભારે

યોમાસુ વહેલું આવ્યું હોવાથી અનેક સ્થળોએ નિર્ધારિત સમય પહેલાં તેની આગેકૂચ જોવા મળી

। તાપી દિલ્હી ।

દેશભરમાં ચોમાસુ સતત આગળ વધી રહ્યું છે અને તેના કારણે ઘણા રાજ્યોમાં જોરદાર વરસાદ થઈ રહ્યો છે. ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર, હિમાચલપ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ જેવા રાજ્યોમાં ચોમાસુ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ચોમાસાની અસરને કારણે હવામાન વિભાગે દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાનું એલર્ટ આપ્યું છે. દેશમાં આ વખતે ચોમાસુ વહેલું આવ્યું છે અને તેથી જ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તે નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલા પહોંચ્યું છે. IMDના અનુસાર ચોમાસું બિહાર, પૂર્વ ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશના બાકીના ભાગો, પશ્ચિમી ઉત્તરપ્રદેશના કેટલાક



ભાગો, ઉત્તરાખંડના મોટાભાગના વિસ્તારો, હિમાચલપ્રદેશના ઘણા બધા ભાગો અને લદાખના કેટલાક ભાગોમાં આગળ વધ્યું છે. ૨૨ જૂનથી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત અને મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદી ગતિવિધિઓ વધે તેવી સંભાવના સેવાઈ રહી છે. આગામી સાત દિવસ સુધી પૂર્વોત્તર ભારતમાં ખૂબ વધારે વરસાદ

થાય તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ચોમાસાની આગેકૂચ માટે હાલ પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. આગામી બે દિવસ દરમિયાન ઉત્તર અરબ સમુદ્રના બાકીના ભાગો, રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગો, પશ્ચિમ યુપીના બાકીના ભાગની સાથે જ અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

વૃંદાવનના એઆઈ ત આકોશ, અ




। મથુરા ।

સોસિયલ મીડિયા પર વૃંદાવન સંત પ્રેમાનંદની એક એક -જનરેટેડ તસવીર વાયરલ થઈ તે નકલી તસવીરને મુદ્દે પાર્લિમેન્ટમાં અને જનમાનસમાં તી પ્રતિક્રિયા જન્મી છે. તસવીરમાં પ્રેમાનંદ તેમની કુટિરમાં આરા કરતા નજરે પડે છે. વ્રજ અધિષ્ઠાની રાધારાણી તેમ સેવામાં લીન છે. ભગવાન શ્રીકૃ બારીમાંથી આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા

21 जून 2025 7:18:31 am
loc 43a/3
prana to prana 400kv






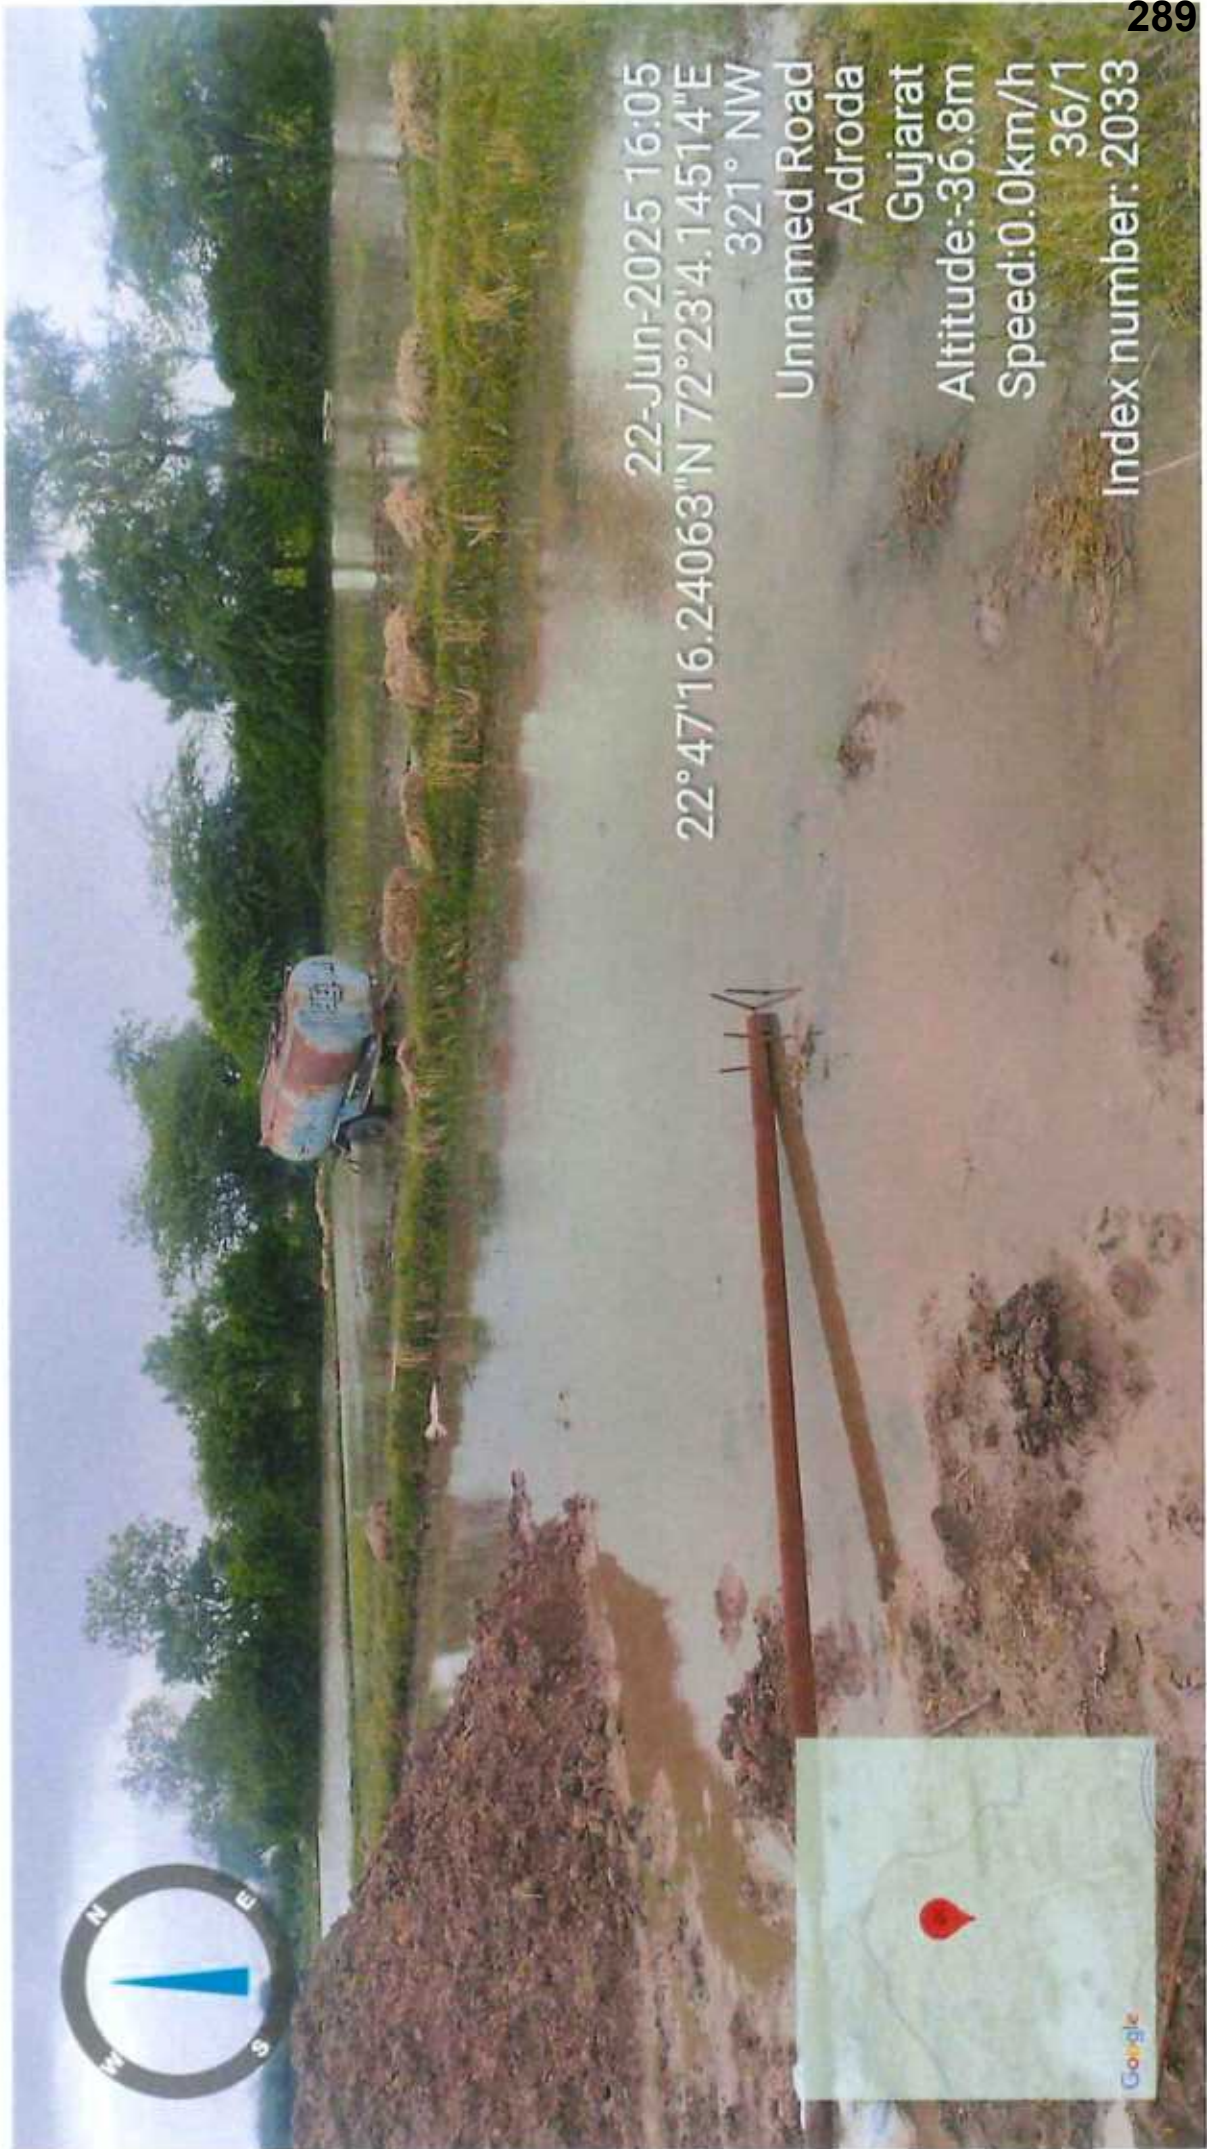

22-Jun-2025 16:05
22°47'16.24063"N 72°23'4.14514"E
321° NW
Unnamed Road
Adroda
Gujarat
Altitude:-36.8m
Speed:0.0km/h
36/1
Index number: 2033



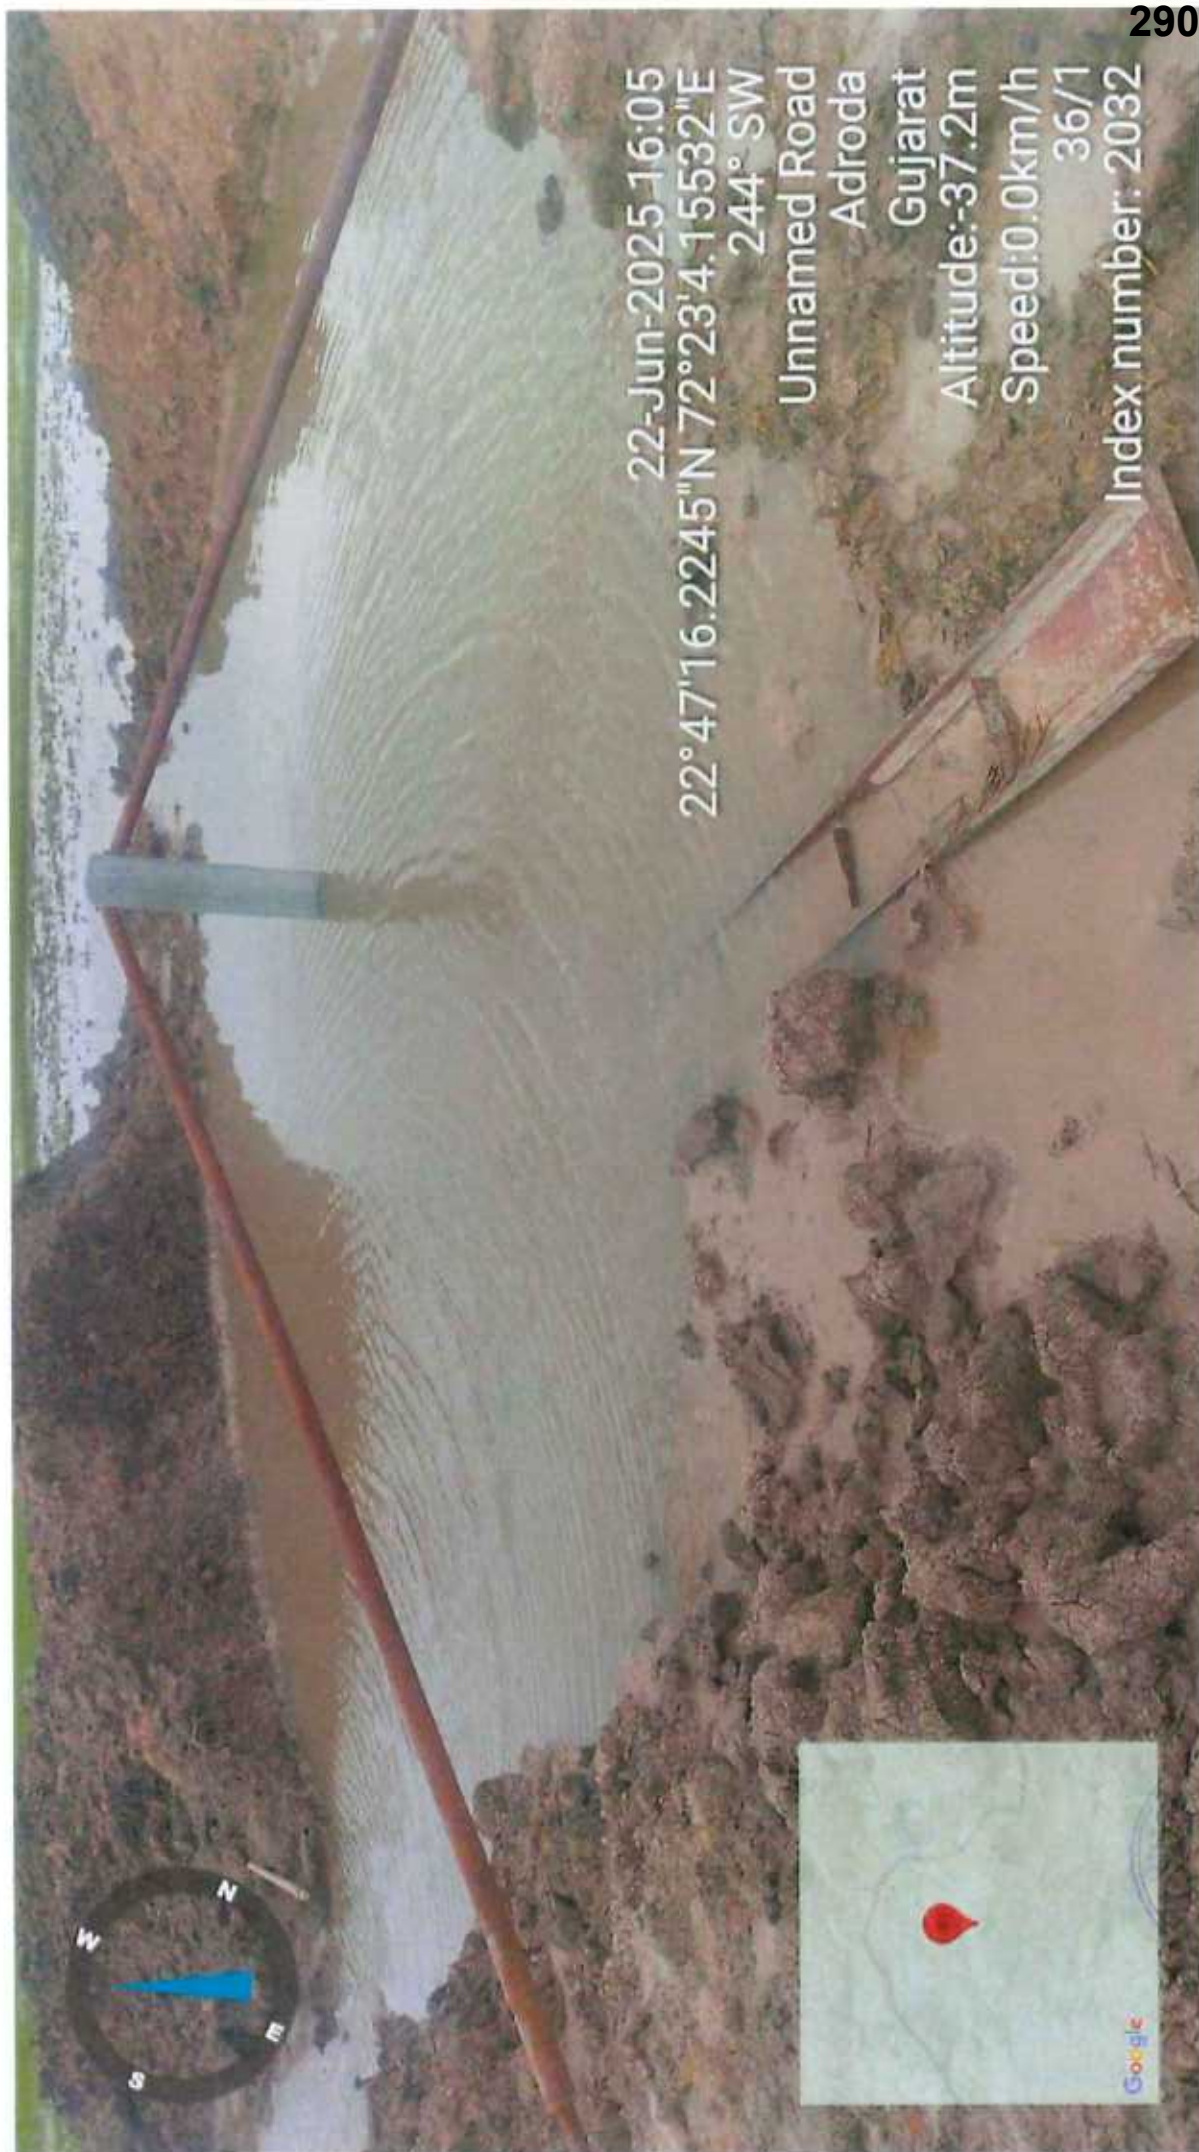

22-Jun-2025 16:05

22° 47' 16.2245" N 72° 23' 4.15532" E

244° SW

Unnamed Road

Adroda

Gujarat

Altitude:-37.2m

Speed:0.0km/h

36/1


Index number: 2032



23 जून 2025 8:52:37 am
Altitude:-27.4m
Speed:0.0km/h
loc 43a/3
prana to prana 400kv





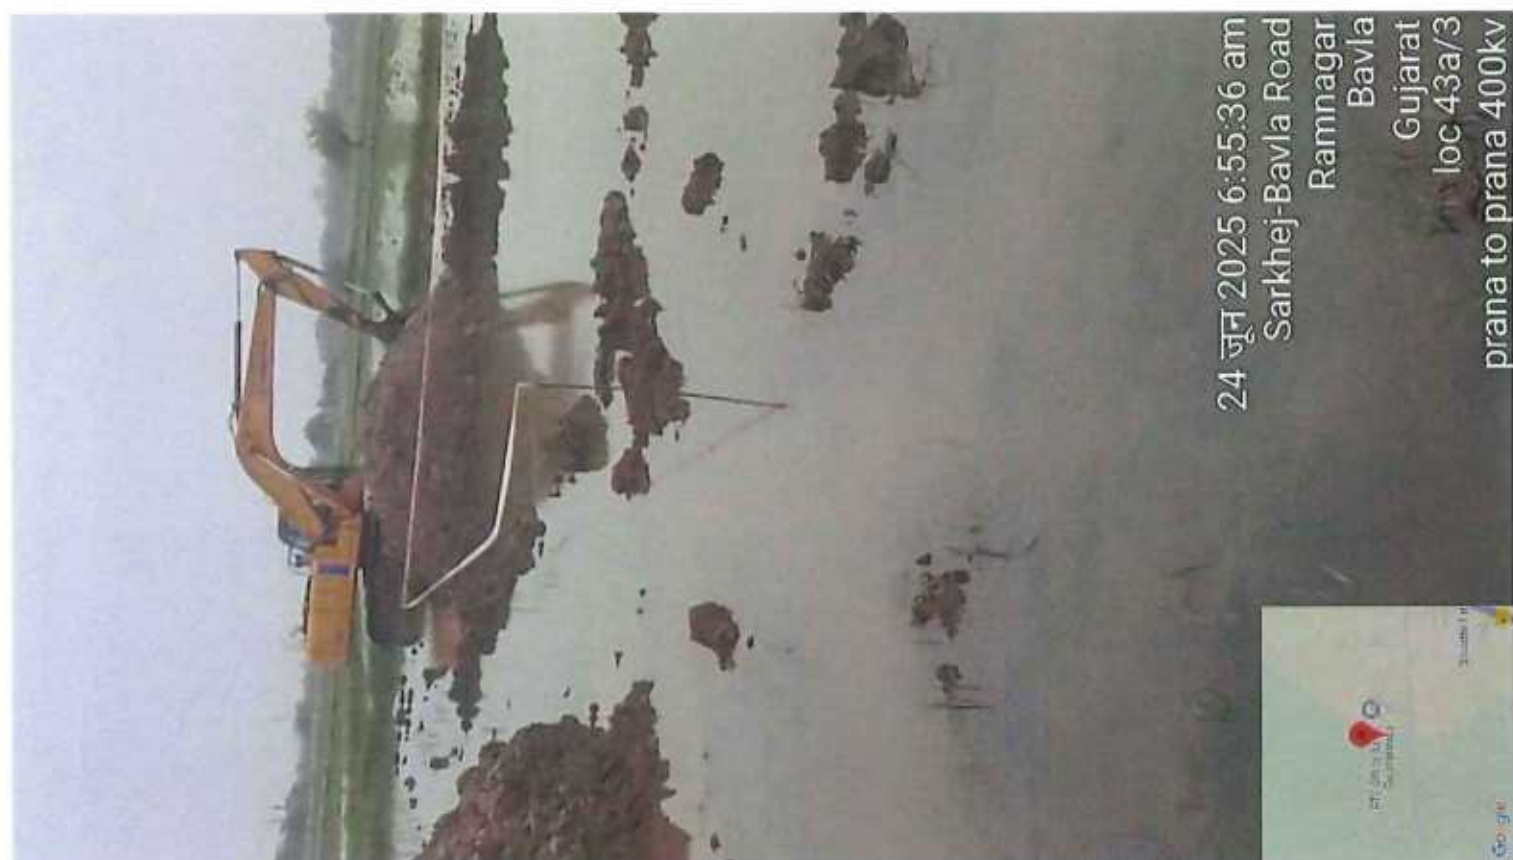

prana to prana 400kv

loc 43a/3


Gujarat

Bavla

Ramnagar

Sarkhey-Bavla Road

24 જૂન 2025 6:55:43 am

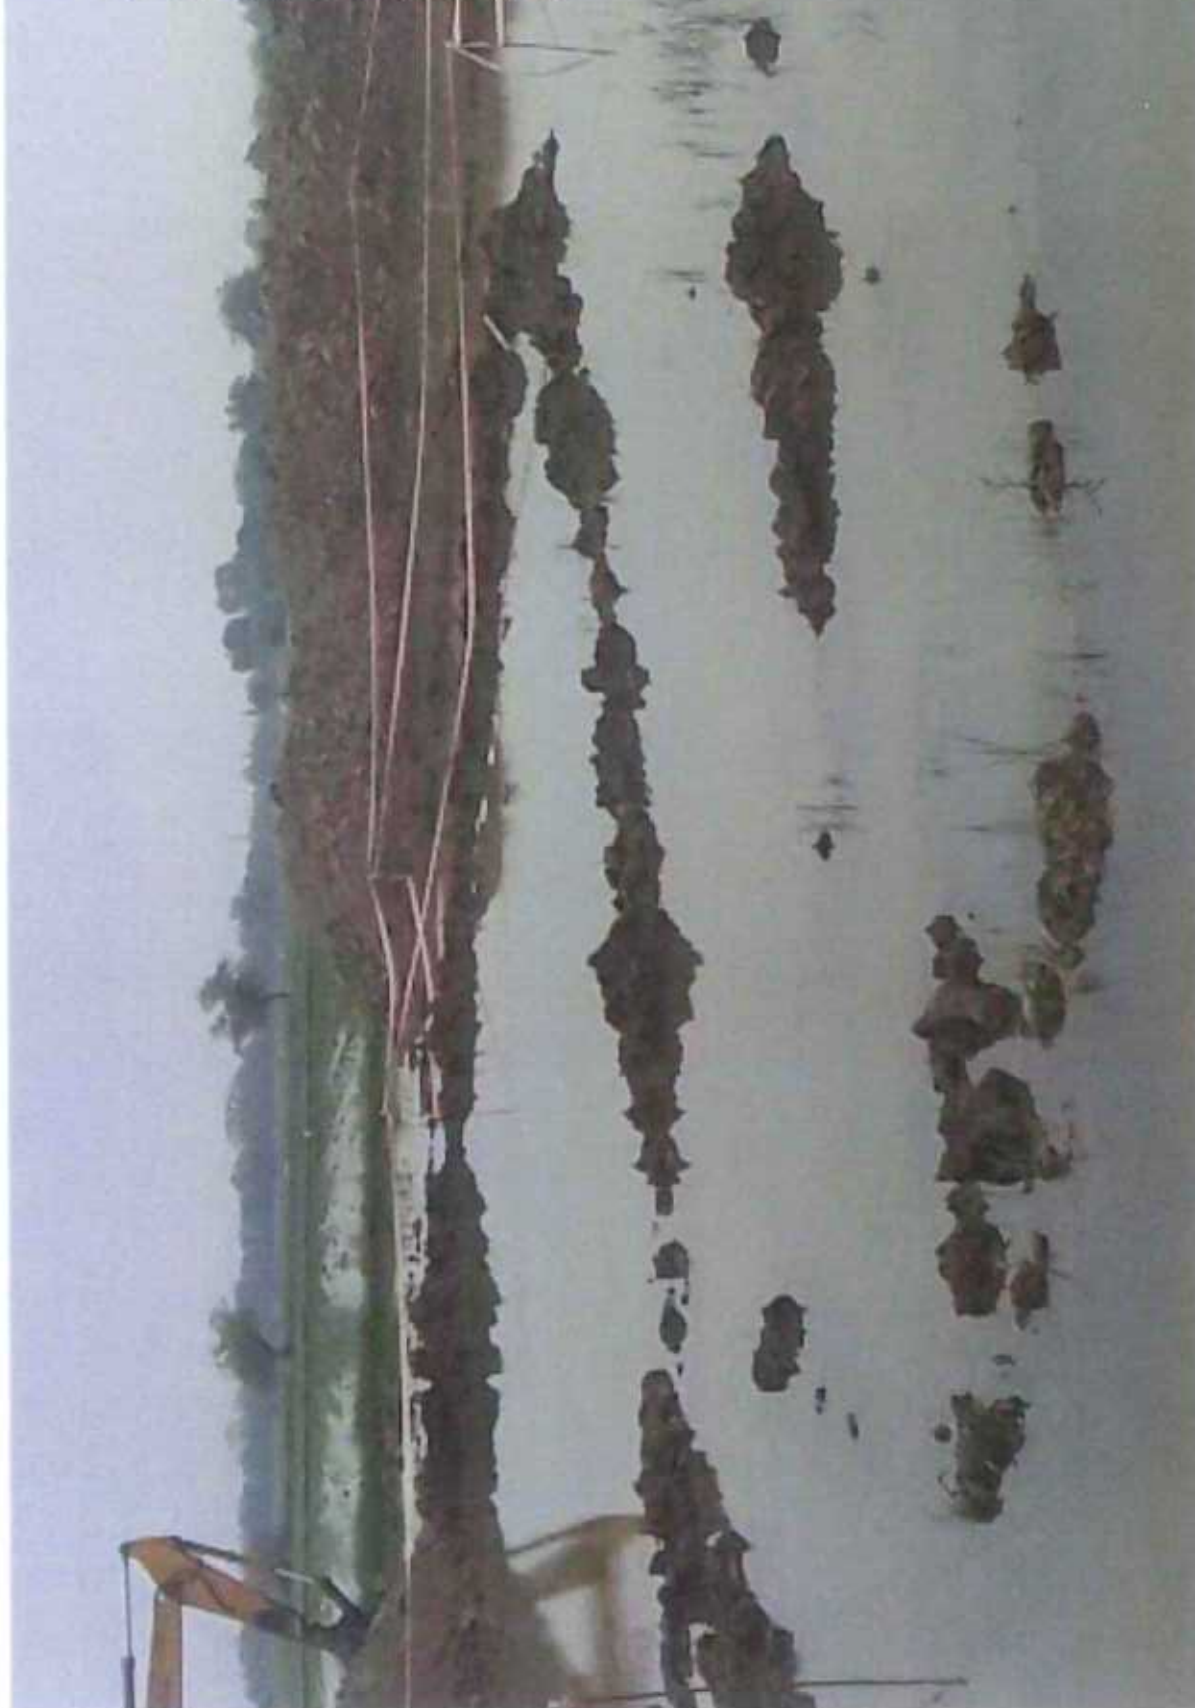

व्यापार-सौजीकरण १६ रस्ता धंध... भयंकरसे व्यापार करने सोचाना धंध टिकी चू चूकसाक पड़ो। आठे परसनाके मालकी पड़ी। नरन बड़ी चूकी। ठीक-कामाल पड़ी। लगी बरसाक मर। चूना कठोरी ठोपी पिछाना आवे। पड़ो। अने जोन-बसक मरिचाना वि रस्ता-अने पर बाणी मरिचो बर।



સિદ્ધિ મુક્ત

140

Миндлбэ / Миндлбэ

દિવસ 33.3% માનવ | સરે 26.8% પ્રાણ

શ્રીમદભિષેક

સોનાપેશ દર્શન, અજસરોની પૂજા
ક્રમો : જગન્નાથ મંદિર, જગન્નપુર,
સુવોરે : ૧૦થી ૧૧ વાગ્યા સુધી

કુલિય બેડિઝ

ક્રમાં : રિઝલ્ટાન્ ગેલેસી, ખડલાઉનગર રોડ,
સેટેલાઈટનગર : ૧૧૫૪૦૬

मोन्सुन जू आर्ट शो

પૃથ્વી : સ્વમહાવાદની ગુફા ખોલવી. સાજ : સ્વામી ૪ ભુપા.
પૃથ્વી વિમોચન

ક્રમ : સ્પોર્ટ્સ ટ્રાઇ, સાઈ : ૬ મી.મી.

सोल्स एन्ड मार्केटिंग स्टीव किरम
पत्नी : अमृतादास मेनेजमेन्ट असोसिएट्स, मुंबई

મુનિવાલ્લીની એરિયા. સાંજે : ૬.૩૦ થી ૭.૩૦ વચ્ચે
 સેન્ટ્રલ અપ કોમેડી શોપન માર્કેટ

ક્રમાંક : ૧૩૨ ફૂટ ડિંગ રોડ રાત્રે : ૪ થી
દેવે દી ગો

અર્થ : આર્ટ ડાઉન ઈન્ડિયા, થર્ડ માર્ચ ધી, સીઝ રીડ.

સોના-ચાંદી બજાર

સોનું	ચાંદી
-------	-------

22 ફરેડ	24 ફરેડ	પ્રતિ કિલો
99960	102000	106500

(+1665) (-3700) (-15051)

જગન્નાથજી મોસાળથી પરત ફર્યા, નેત્રોત્સવ વિધિ કરાઈ



અર્થશાસ્ત્ર

[illegible]

સાંજે ગાજવીજ સાથે વરસાદથી કલાકો સુધી લોકો ટ્રાફિકમાં ફસાયા, દક્ષિણી, કુબરનગર, મોઠાખળી અડપાસ બંધ કરવા પડ્યાં. મહિનગરમાં ૩ કલાકમાં ૬ ઈંચ, પૂર્વમાં સરેરાશ ૩ ઈંચ સુધી વરસાદ.

રોડ નંબર	પરિવહન	પ્રવાસી	કાર્ગો	કુલ
૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૩૦
૨૦	૨૦	૨૦	૨૦	૬૦
૩૦	૩૦	૩૦	૩૦	૯૦
૪૦	૪૦	૪૦	૪૦	૧૨૦
૫૦	૫૦	૫૦	૫૦	૧૫૦
૬૦	૬૦	૬૦	૬૦	૧૮૦
૭૦	૭૦	૭૦	૭૦	૨૧૦
૮૦	૮૦	૮૦	૮૦	૨૪૦
૯૦	૯૦	૯૦	૯૦	૨૭૦
૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૩૦૦
૧૧૦	૧૧૦	૧૧૦	૧૧૦	૩૩૦
૧૨૦	૧૨૦	૧૨૦	૧૨૦	૩૬૦
૧૩૦	૧૩૦	૧૩૦	૧૩૦	૩૯૦
૧૪૦	૧૪૦	૧૪૦	૧૪૦	૪૨૦
૧૫૦	૧૫૦	૧૫૦	૧૫૦	૪૫૦
૧૬૦	૧૬૦	૧૬૦	૧૬૦	૪૮૦
૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦	૫૧૦
૧૮૦	૧૮૦	૧૮૦	૧૮૦	૫૪૦
૧૯૦	૧૯૦	૧૯૦	૧૯૦	૫૭૦
૨૦૦	૨૦૦	૨૦૦	૨૦૦	૬૦૦
૨૧૦	૨૧૦	૨૧૦	૨૧૦	૬૩૦
૨૨૦	૨૨૦	૨૨૦	૨૨૦	૬૬૦
૨૩૦	૨૩૦	૨૩૦	૨૩૦	૬૯૦
૨૪૦	૨૪૦	૨૪૦	૨૪૦	૭૨૦
૨૫૦	૨૫૦	૨૫૦	૨૫૦	૭૫૦
૨૬૦	૨૬૦	૨૬૦	૨૬૦	૭૮૦
૨૭૦	૨૭૦	૨૭૦	૨૭૦	૮૧૦
૨૮૦	૨૮૦	૨૮૦	૨૮૦	૮૪૦
૨૯૦	૨૯૦	૨૯૦	૨૯૦	૮૭૦
૩૦૦	૩૦૦	૩૦૦	૩૦૦	૯૦૦
૩૧૦	૩૧૦	૩૧૦	૩૧૦	૯૩૦
૩૨૦	૩૨૦	૩૨૦	૩૨૦	૯૬૦
૩૩૦	૩૩૦	૩૩૦	૩૩૦	૯૯૦
૩૪૦	૩૪૦	૩૪૦	૩૪૦	૧૦૨૦
૩૫૦	૩૫૦	૩૫૦	૩૫૦	૧૦૫૦
૩૬૦	૩૬૦	૩૬૦	૩૬૦	૧૦૮૦
૩૭૦	૩૭૦	૩૭૦	૩૭૦	૧૧૧૦
૩૮૦	૩૮૦	૩૮૦	૩૮૦	૧૧૪૦
૩૯૦	૩૯૦	૩૯૦	૩૯૦	૧૧૭૦
૪૦૦	૪૦૦	૪૦૦	૪૦૦	૧૨૦૦
૪૧૦	૪૧૦	૪૧૦	૪૧૦	૧૨૩૦
૪૨૦	૪૨૦	૪૨૦	૪૨૦	૧૨૬૦
૪૩૦	૪૩૦	૪૩૦	૪૩૦	૧૨૯૦
૪૪૦	૪૪૦	૪૪૦	૪૪૦	૧૩૨૦
૪૫૦	૪૫૦	૪૫૦	૪૫૦	૧૩૫૦
૪૬૦	૪૬૦	૪૬૦	૪૬૦	૧૩૮૦
૪૭૦	૪૭૦	૪૭૦	૪૭૦	૧૪૧૦
૪૮૦	૪૮૦	૪૮૦	૪૮૦	૧૪૪૦
૪૯૦	૪૯૦	૪૯૦	૪૯૦	૧૪૭૦
૫૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૧૫૦૦
૫૧૦	૫૧૦	૫૧૦	૫૧૦	૧૫૩૦
૫૨૦	૫૨૦	૫૨૦	૫૨૦	૧૫૬૦
૫૩૦	૫૩૦	૫૩૦	૫૩૦	૧૫૯૦
૫૪૦	૫૪૦	૫૪૦	૫૪૦	૧૬૨૦
૫૫૦	૫૫૦	૫૫૦	૫૫૦	૧૬૫૦
૫૬૦	૫૬૦	૫૬૦	૫૬૦	૧૬૮૦
૫૭૦	૫૭૦	૫૭૦	૫૭૦	૧૭૧૦
૫૮૦	૫૮૦	૫૮૦	૫૮૦	૧૭૪૦
૫૯૦	૫૯૦	૫૯૦	૫૯૦	૧૭૭૦
૬૦૦	૬૦૦	૬૦૦	૬૦૦	૧૮૦૦
૬૧૦	૬૧			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

वर्षा नेरोन्मप तिदि क्ताई | वर्ष ओक ख्रिदिश


नागरिकनो मुतहस
रायतेस्त ओक म्यनिसिपालिटी कोटना आदर्शन

परिवारन सापाया

12/6 પાલન ન કર તા યાજ્ઞફલ યશઃ હાઇકોર્ટના ચાન્સેલર જસ્ટિસે આજુબોજીમાં આપેલ છે.

आगाभी भुवत सुधींभां लाभ नही यूँवचय ता अन आधकारान 25 हजार डर डरकाराशः
तवीं स्वायत्ती बीपय वमा, फ
हूँ वी २००० मरी-यान भववासां वन

[illegible][illegible][illegible]

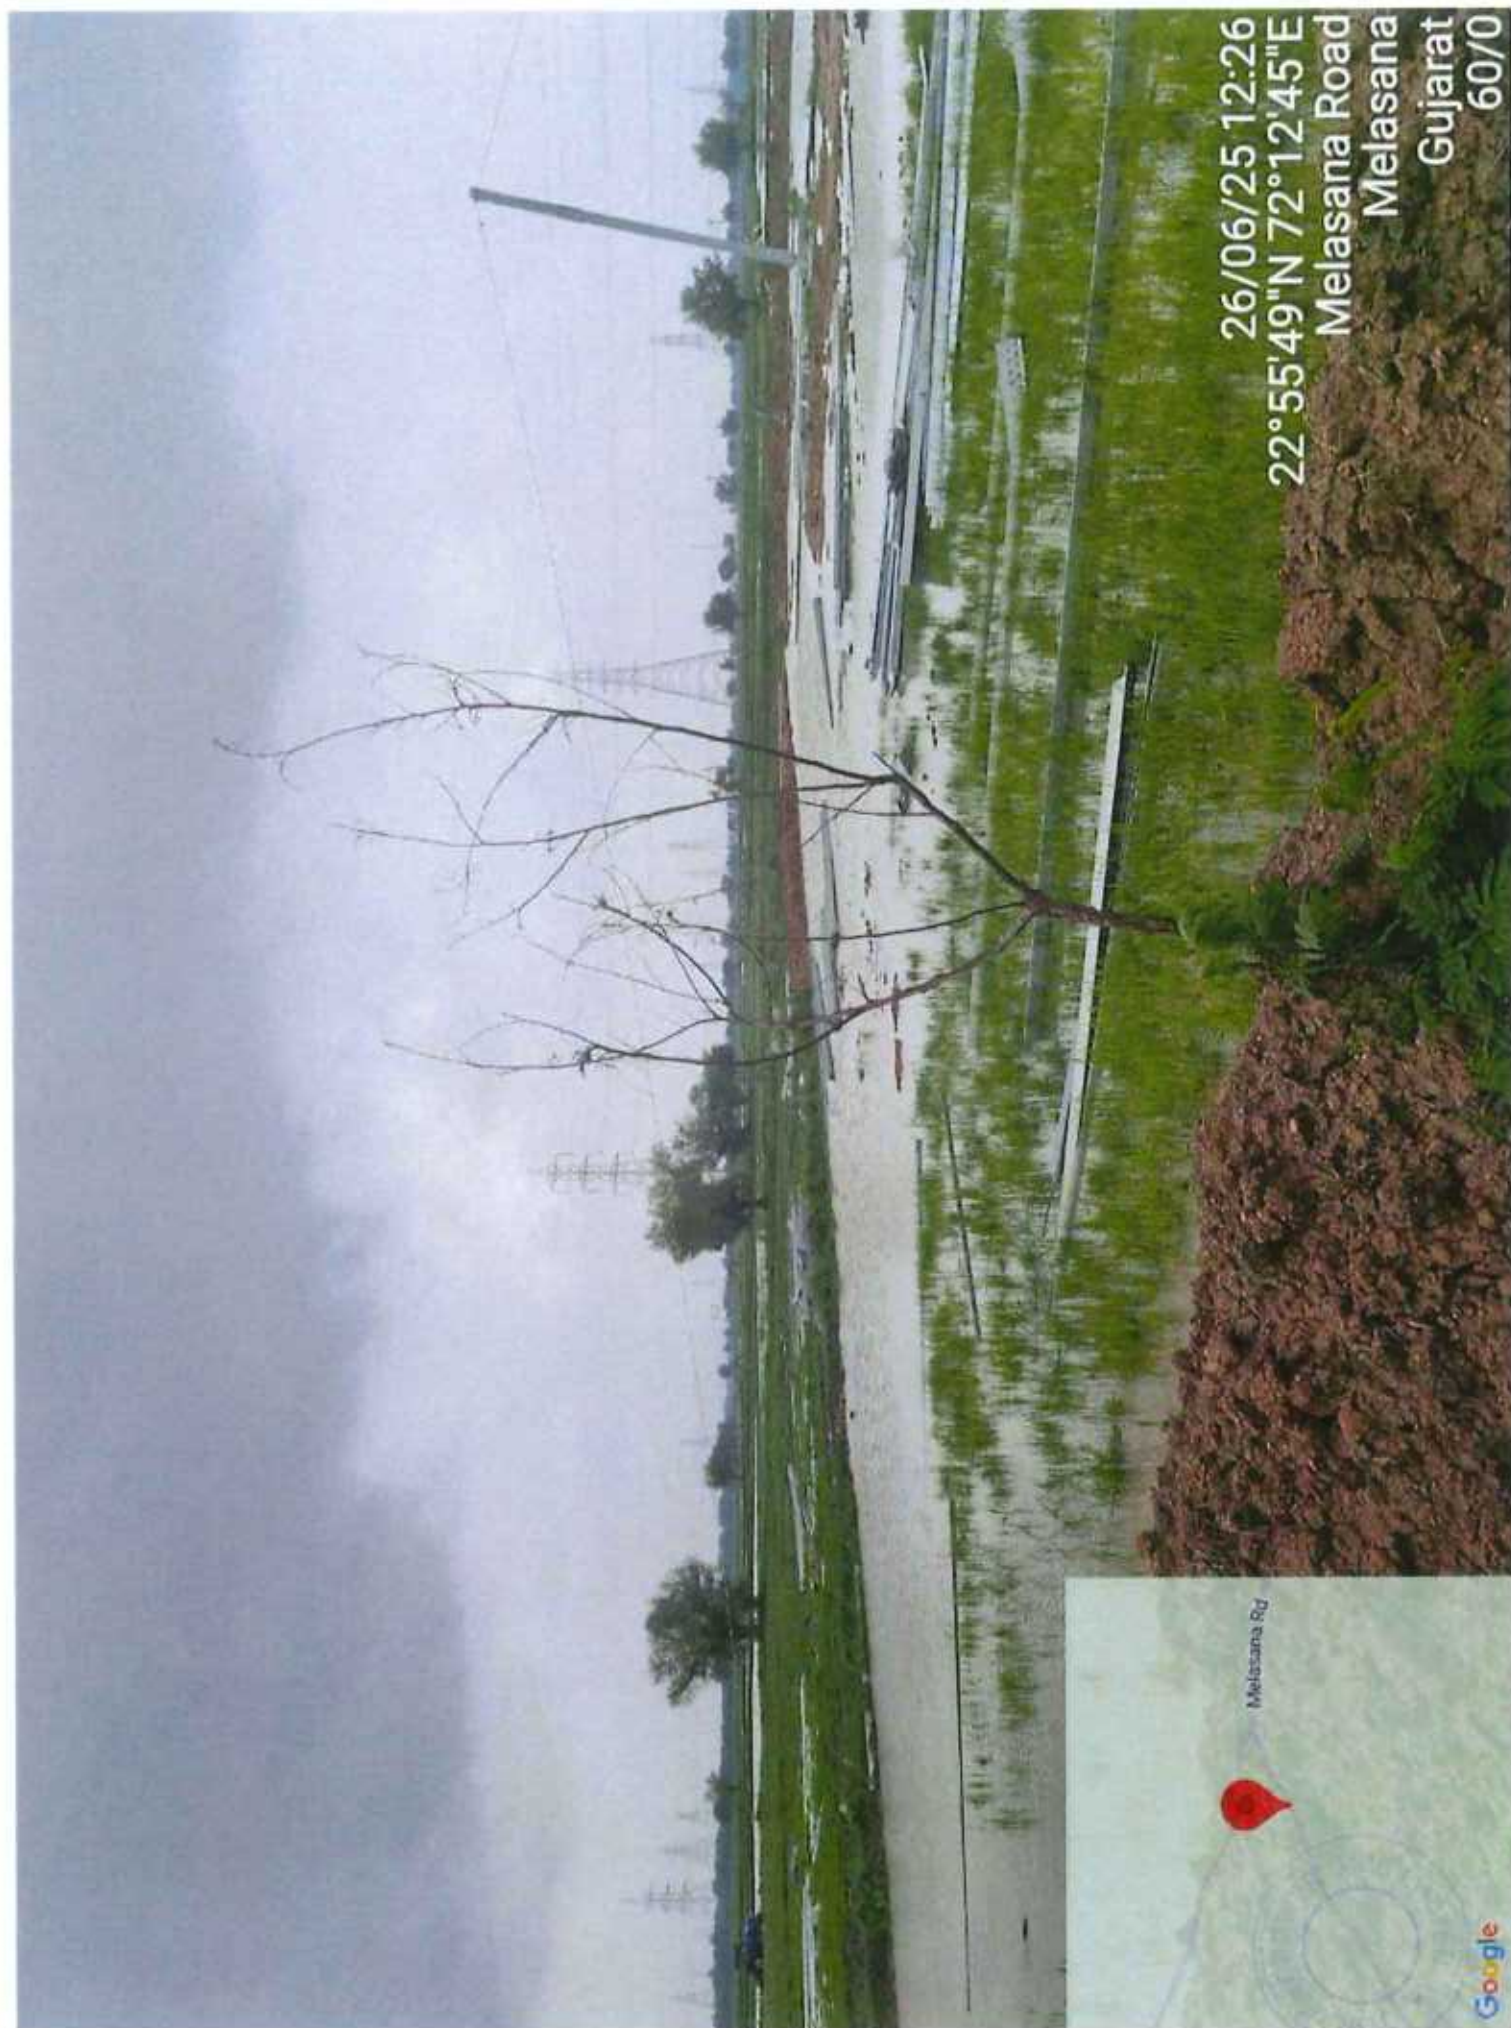

26/06/25 12:26
22°55'49"N 72°12'45"E
Melasana Road
Melasana
Gujarat
60/0



Location 42A/1 Approach Road
26-Jun-2025 12:05:07 pm





(અનુસંધાન ક્ષેત્ર પાને)

મોહાની જમીન વેચવાની છે

મોજું : ૫૩૦ ચો. મીટર, તપડીયા-વણવાળી,
કુશલ-૧, પાપણ, નાસ્થર, બગીચો અને એ.
૧૧ KV લાઇન સામે.
ઉન્ડર્ટેકિંગ વ્યવસ્થા માટે મફતકા.

Mo. 88660 47411

બેઠકો છે. પાર્ટનર

રેસીડેન્સ ઝોનમાં



29 Jun 2025 9:58:43 am
22°55'3.396"N 72°12'56.376"E
142° SE
Unnamed Road
Melasana
Gujarat





Jun 29, 2025 9:49:32 AM
Unnamed Road
Ahmedabad
Gujarat





30-Jun-2025 12:38

22°52'36.36869"N 72°14'51.22554"E

61° NE

Mankol

Gujarat


Altitude:-24.8m

Speed:0.0km/h

51/0

Index number: 2087



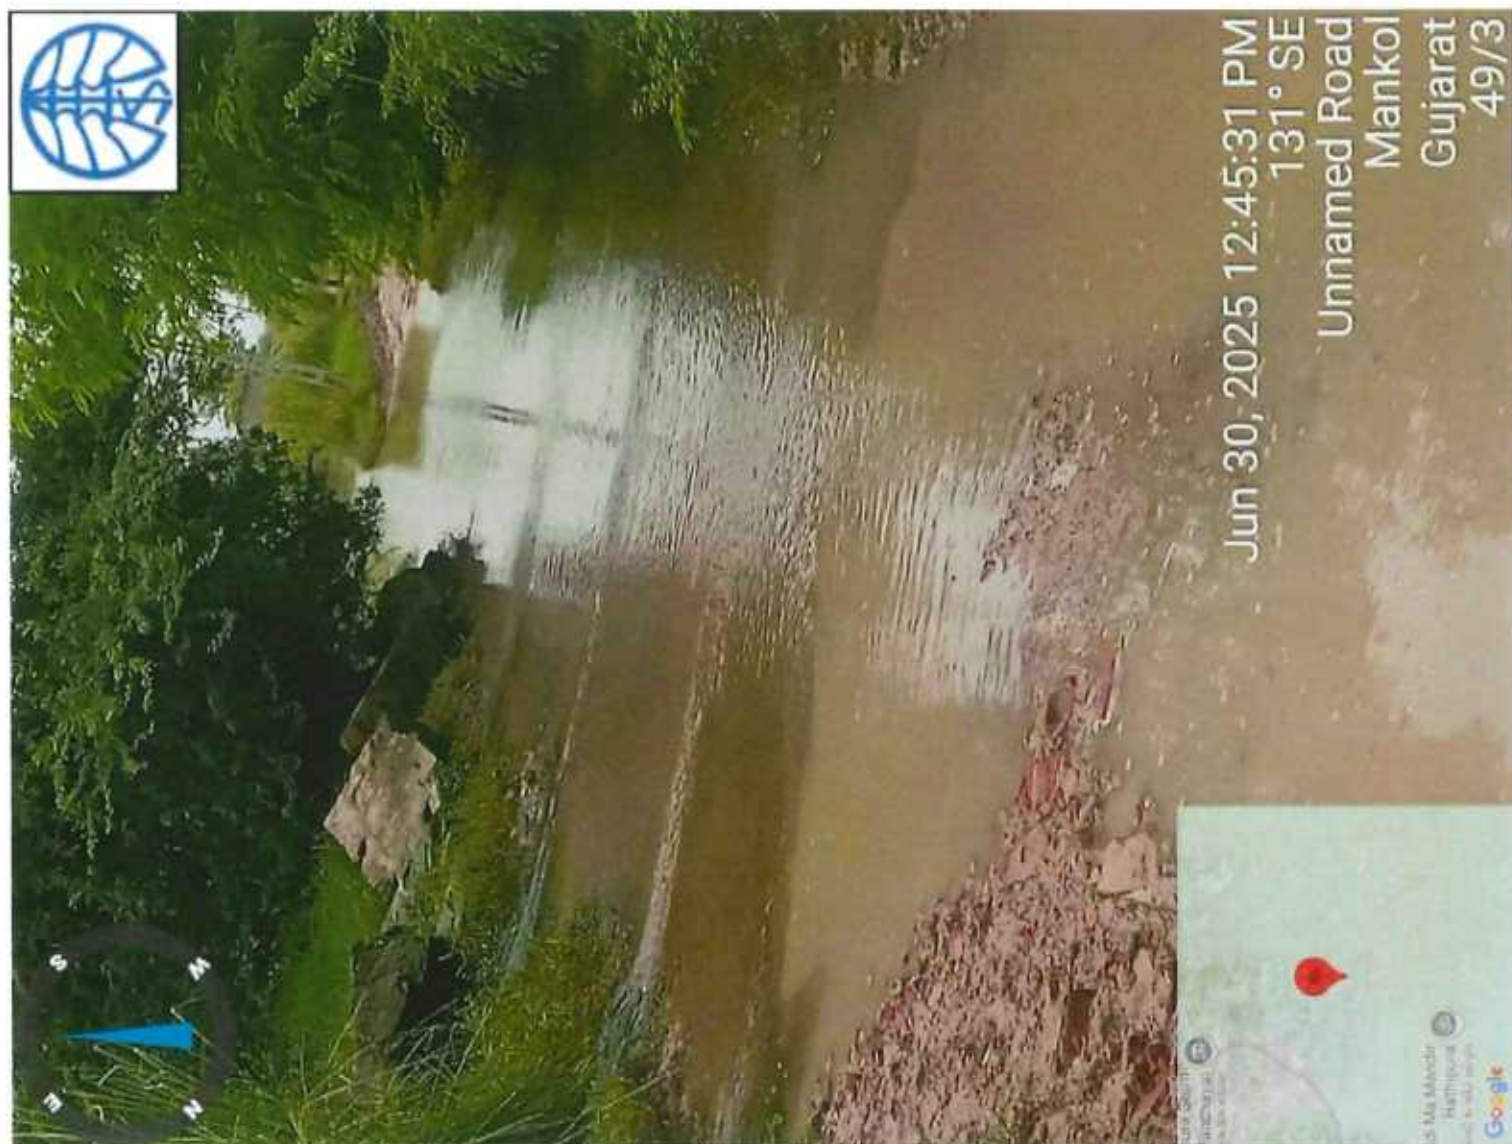

Dieci

બાઈબલ ઓફિસ ટ્રસ્ટી

ગુજરાતમાં મેદસાજની 16 દિવસની હાજરી : દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 19 દિવસ અને કચ્છમાં સૌથી ઓછા 8 દિવસ વરસાદ રહ્યો.

ગુજરાતમાં જૂન મહિનામાં 110 મીમીની જરૂરિયાત સામે 288 મીમી વરસાદ

विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

સાતપુડા ગિરિમાળામાંથી ૩૦ ફૂટ વહેતો વાહરો ધોધ શરૂ થતાં જ સૌદર્ય નિહાળવા ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના સહેલાણીઓની ભારે ભીડ જામવા લાગી

[illegible]

પંચમહાલમાં BLOની કામગીરી ચિતા ધારાસભ્ય અને માતા જિલ્લા પંચાયતઝાવાડી કાર્યકર્તાને સોંપાઈ કાલાવડ ધારાસભ્ય

योग	अंशराज	चरस्थे	उपवादी
३४०	१२३	३१३	२९.५%
७८२	११९	१७१	२४.७%
१०५५	६०५	२७८	३४.६%
१२८६	७४८	२५१	३१.७%
१५११	१४९०	५२५	३५.७%
२०१९	१४२	२६८	३१.७%

(वर्षादक्ष भूमीपा)

6.88% જળસંપદા વધ્યું, 14 જળાશયો સંપૂર્ણ ભરાયા

ગુજરાતમાં જુલાઈમાં પણ સામાન્યથી વધુ વરસાદની શક્યતા

ભારતીય હવવાન વિખેરી સાંસ્કૃતિક રજૂ કરેલા જુલાઈ અભિયાન પૂર્વાનુમાન મુજબ દેશમાં 106.63 લાખ વસ્તી રહેશે. વૃદ્ધ વસ્તીમાં 10.45 લાખ વધુ થશે. વૃદ્ધ વસ્તીમાં 10.45 લાખ વધુ થશે. વૃદ્ધ વસ્તીમાં 10.45 લાખ વધુ થશે.

વડાલીમાં દીવાલ
ધરાશાયી થતાં 2
બાળકનાં મોત



જતા આસરીના
થી રોજના ખેડખામના સેનપરના
જતા આસરીના દરેક સ્થળે જતા જે
2 આસરીના ખેડ થતાં સમયા
કર્તે માણેક સર્પથી કાચે મુઠક
આસરીનાં દિલીપ અમરનાથ
કચ્છના(4) આશા શક્તિનાઈ
1 અને રહે સેનપર તો ખેડખા
કાચે રહિલે જામના આસરીને ઉજા
વેળી બની

दत्तशिखर निर्वाण धातु विवादः ३ स्थले येडिंग-चीडियोआझी थशे
गिरनार पर्वत पर जैन देरासर, दत्त
शिखर पर युस्त बंदोबस्त गोठवाशे

[illegible][illegible]

મુત્રને સહાય મેળવી
શ્રી આવાસ

મુત્રને સહાય મેળવી
શ્રી આવાસ



1 Jul 2025 10:47:22 am
22°55'49.158"N 72°12'45.804"E
235° SW
Melasana
Gujarat
60/0







આરે વરસાદને કારણે પાલનપુરથી અંબેજી જવાના રસ્તા ઉપર પાણી ભરાયા હતા અને રસ્તા ટ્રાફિક માટે બંધ કરવા કરજી પડી હતી.

ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા ઓળધોળ ૯ ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબક્યો

ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા ઓળધોળ થતાં ૯ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. જેમાં વરસાદ સૌથી વધુ ૯ જ્યારે ઉત્તર, મેઘરાજામાં સૌથી વધુ ૮ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ કારણે જ વરસાદ પડે તે સુધી આરે વરસાદને કારણે પાલનપુરથી અંબેજી જવાના રસ્તા ઉપર પાણી ભરાયા હતા અને રસ્તા ટ્રાફિક માટે બંધ કરવા કરજી પડી હતી.

ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા ઓળધોળ થતાં ૯ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. જેમાં વરસાદ સૌથી વધુ ૯ જ્યારે ઉત્તર, મેઘરાજામાં સૌથી વધુ ૮ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ કારણે જ વરસાદ પડે તે સુધી આરે વરસાદને કારણે પાલનપુરથી અંબેજી જવાના રસ્તા ઉપર પાણી ભરાયા હતા અને રસ્તા ટ્રાફિક માટે બંધ કરવા કરજી પડી હતી.

તાલુકો	વરસાદ	ઈંચમાં
વડોદરા	વરસાદ	૯.૦૦
પાલનપુર	વરસાદ	૯.૦૦
વિજાપુર	વરસાદ	૯.૦૦
પાલનપુર	વરસાદ	૯.૦૦
દાંતીવાડા	વરસાદ	૯.૦૦
વલોડ	વરસાદ	૯.૦૦
ઉપરપાડા	વરસાદ	૯.૦૦
મહુવા	વરસાદ	૯.૦૦
વડોદરા	વરસાદ	૯.૦૦

મહેસાણાની સૌથી વધુ ૮ સમસ્ત પંચાયત ગુજરાતમાં આવતે કુલ ૫૬



અમદાવાદ કોરોના રાહચીવેલો લોકવાણી આરે વરસાદી ઝાડાના કારણે રોડ પર વરસાદ લાગે તેવા મતમાં વસ્તી પડી. (સત્યદેવ - દુર્ગાચંદ્ર)

માડા, ભૂવા, રોડ બેસી જવાની સેકડો ફરિયાદ રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી!

અમદાવાદ મુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું છે. પરંતુ આ બજેટમાં રોડ બાંધકામ માટે જરૂરી મટિરિયલનું ટેસ્ટિંગ લેબ નથી. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

અમદાવાદ મુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું છે. પરંતુ આ બજેટમાં રોડ બાંધકામ માટે જરૂરી મટિરિયલનું ટેસ્ટિંગ લેબ નથી. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

કોરોના	૩૦૪૫	પાંચ વાણી વધુના બસ
૧૫ ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. આમ છતાં ૪૮ કોરોના બસો રોડ ઉપર ચલવાની પૂર્વ તૈયારીમાં છે. આ બસોમાં ૧૦૦૦થી વધુ બસો છે. આ બસોમાં ૧૦૦૦થી વધુ બસો છે.	૧૬	૧૦

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

સુરત દરમિયાન આસાર તા કેબલ લેન્ડિંગ વખત તૈયારીઓ શરૂ. આ કારણે રોડ બાંધકામ માટે એક હજાર કરોડનું બજેટ પણ AMC પાસે મટિરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબ નથી.

રાજ્યમાં જૂનમાં જ 34.66% વરસાદ, જુલાઈમાં પાછલાં વર્ષોનો રેકોર્ડ તૂટી શકે!

સરકારે જાહેર કરેલા ચાંકડા મુજબ પાછલા ૧૧ વર્ષમાં આ વખતે રેકૉર્ડ બેક વરસાદ

જનના 15 દિવસમાં જ રાજ્યમાં 11.35 ઈંચ

માર્થે કલ સરેરાશ 12.12 ઈંચ વરસાદ થયો

2000



922911, 922912

[illegible]

સામુદાય	પરચાલક	સરકારી	કુલ
સુરત	૩૨	૩૨	૩૨
ગાંધી	૩૫.૬૪	૩૫.૬૪	૩૫.૬૪
કોમરસી	૩૬.૦૮	૩૬.૦૮	૩૬.૦૮
જેડાગામ	૩૭.૨૦	૩૭.૨૦	૩૭.૨૦
સુપરડા	૪૩.૭૯	૪૩.૭૯	૪૩.૭૯
કુલ	૧૩૨.૭૧	૧૩૨.૭૧	૧૩૨.૭૧

છેલ્લા ૧૧ વર્ષમાં જન માસમાં પડેલો વરસાદ (ઇંચમાં)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.88	1.47	5.05	2.70	4.34	4.88	4.81	2.56	9.71	4.60	12.12

૯-૧૦ ઓક્ટોબરે મહેસાણાથી ૧૧મી વાઈબ્રન્ટ સમિટનો આરંભ વાઈબ્રન્ટ સમિટ'૨૬ને બદલે ૨૦૨૭માં, તે પહેલાં ૪ પ્રાદેશિક સમિટનું આયોજન

જાન્યઆરી'૨૬માં રાજકોટ. માર્ચમાં સરત અને જૂનમાં વડોદરામાં સમિટ મળશે

Reference

६२ पै वर्षे पोखरी कर्मिन्
पुण्यल ओषध सन्निधं मेघ वर्षा
मेघ पानी १०मी सन्निध वर्ष
२०२३मी पोषण भा सन्निध वर्ष
२०२३मी ११मी सन्निध पोषण
मन्त्र पुण्यल सन्निध मेघ सन्निध
विषयमेघ सन्निध वर्ष वर्ष २०२३मी

—

સુરતમાં ભાગ્યવશે ફુલાઈ બીડીને સમય
સમયે વરસાદની માથામાં બાંહેડે ફૂટ મીડીની
સમયે વરસાદની માથામાં બાંહેડે ફૂટ મીડીની
સમયે વરસાદની માથામાં બાંહેડે ફૂટ મીડીની

સામુદાય	પરચાલક	સરકારી	કુલ
સુરત	૩૨	૩૨	૩૨
ગાંધી	૩૫.૬૪	૩૫.૬૪	૩૫.૬૪
કોમરસી	૩૬.૦૮	૩૬.૦૮	૩૬.૦૮
જેડાગામ	૩૭.૨૦	૩૭.૨૦	૩૭.૨૦
સુપરડા	૪૩.૭૯	૪૩.૭૯	૪૩.૭૯
કુલ	૧૩૨.૭૧	૧૩૨.૭૧	૧૩૨.૭૧

એલ્લા ૧૧ વર્ષમાં જન માસમાં પડેલો વરસાદ (દિયમાં)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.88	1.47	5.05	2.70	4.34	4.88	4.81	2.56	9.71	4.60	12.12

ગ્રાંસી કી રાની અને સાંભીની યાત્રી બે સ્ટેશન પર પાસ નીકાશ
દુપ વર્ષના સિટીઝન-દિવ્યાંગને
AMTS, BRTSમાં ફી મુસાફરી
શિવરત્ન પર નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં સ્ટાર્ટ અપ ઈલેવેનમ્ બાયોઝન

1. Introduction

AMC ધરાવે છે. આ સંસ્થાના નિર્દેશકો અને અન્યને દિલ્હીમાં જઈને જોવાને AMTS અને BRTSના વિનામૂલ્ય મુલાકાતી કસ્ટોમરોનું સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે. અમદાવાદથી ૭૫ થઈને નાગરિકોને આ પસંદગી પૂરી પાડશે. તેવામાં જિલ્લા પંચાયતની સુવિધા અપાવવામાં આવશે. આમ, ૭૫ થઈને નાગરિકોને AMTS અને BRTSના વિનામૂલ્ય મુલાકાતીનું લાભ મળશે. સુવાણી રોડ પર આ સુવિધા આગામી ૧૦ માર્ચે શરૂ કરવામાં આવશે.

1. INTRODUCTION

[illegible][illegible]

શાલકો	વરદાદ (કલાસ)	શાલકો	વરદાદ (કલાસ)
ખરણાસ	70.16	ખરણાસ	67.04
નગરાઈ	69.45	ખરણાસ	66.16
ઉનાસાઈ	69.04	સિરાણાઈ	61.92
ઉમરણાસ	67.72	જાગણાઈ	61.20
દણડાઈ	67.16	બળી	60.60

૧૦ વર્ષમાં જુલાઈ માસમાં પડેલો સરેરાશ વરસાદ (મિલિમી)

Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2015	12.84	8.97	21.03	15.30	8.89	9.14	7.06	21.25	17.94	16.99

‘મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ પ્રીમિયમ’ સ્વરૂપે નવો રોયલ્ટી ટર લાગુ રાજ્યમાં રેતી પછી અન્ય ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી પણ પહેલી જલાઈથી બમણી

જે ગૌણ અનિજોની લીઝ હરાજી વિના અપાયેલી છે, ત્યાં રોયલ્ટી બમણી

ઔપા પ્રતિષ્ઠાના નવા દર			દાનના સાંચકાઈ	નવા સાંચકાઈ
ક્રમ	ગોળા અભિયં	દાનના સાંચકાઈ	દર	દર
૧	કાલાંગાંગદ	૩૨૫	૨૦	૩૫૦
૨	સોલ્લે પેળા	૩૫૦	૨૫	૪૦૦
૩	ગોળાંગદ, સાંગાંગદ, ભાંગાંગદ	૩૫૦	૨૫	૪૦૦
૪	ગોળાંગદ, સાંગાંગદ, ભાંગાંગદ	૩૫૦	૨૫	૪૦૦

1111

[illegible]





સિટી

AHMEDABAD

SUNDAY, 6•07•2025

સૌથી મોટું અવકાશ મથક બનશે

નું સ્પેસ સેન્ટર આકાર લેશે

સરકાર-રાજ્ય સરકારના સહયોગથી વિકસાવાશે

ક સુધીમાં સર્વેલન્સ
ટે પર ઉપગ્રહોમાંથી
પ્રથમ લોન્ચ કરાશેકેન્દ્રના વિગ્ન સાથે સંકેતિત
પ્રકાશ મિશન નીચે રજૂ કરી
તુ ભારતના અવકાશ ક્ષેત્રમાં
બે વેગ આપવાનો છે. ભારત
માં સર્વેલન્સ નાણા માર્ગે પર
લોન્ચ કરવો. મળતી માહિતી
સિટી સમાચારી ૩૧ ઉપગ્રહોનું
પ્રકા કરશે, જ્યારે ભારતીય
કારના નિર્દેશન હેઠળ બી
દ્વારા કરવામાં આવશે, જેમાં
ક સુધીમાં શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય
રાખવામાં આવ્યું છે.

ખંડપીઠ કસૂરવાર યુવક સામે સુઓમોટો કન્ટેમ્પટ દાખલ કરી
શૌચાલયમાંથી વચ્ચે અલી હાજર રહેનારા
સામે HCએ કન્ટેમ્પટની કાર્યવાહી આદરી

D. BHASKAR

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક કેસની
વચ્ચે અલી હાજર રહેનારા
પોલીસીંગમાં શૌચાલયમાંથી અપીલર
વચ્ચે અલી હાજર રહેનારા
ગુજરાત હાઈકોર્ટ અદાલતી તિરસ્કાર
અંગેની કન્ટેમ્પટ પોલીસીંગ હાથ પરી છે.
જસ્ટિસ એ.એસ.સુપ્રીયા અને જસ્ટિસ
આર.ટી.વાયસલીની ખંડપીઠે આ કેસમાં
કસૂરવાર યુવક વિરુદ્ધ સુઓમોટો કન્ટેમ્પટ
દાખલ કરી રજિસ્ટ્રીને તા.૧૪મી જુલાઈએ
રિપોર્ટ કરવા જણાવ્યું છે.

હાઈકોર્ટે અવારનવાર બનતા આ
પ્રકારના બનાવોને લઈ રજિસ્ટ્રાર
ઉન્ડરસેન એન્ડ ટેકનોલોજી પાસેથી આ
પ્રકારના બનાવો બનતા અટકે તેની પદ્ધતિ
સમજાવવા પણ જણાવ્યું છે. હાઈકોર્ટે
જણાવ્યું કે, અદાલતના પાન પર આવ્યું છે
કે, આ પ્રકારના અવિધ અને અનિર્ણિત
વર્તનની પટનાઓ છાસવારે સામે આવી છે,
તેથી તેને રોકવી ખૂબ જરૂરી છે. અદાલતી
અદિમા અને ન્યાયવર્તનના ઉચ્ચ મૂલ્યો

જળવાય તે ખૂબ જરૂરી છે. અદાલતી
તિરસ્કાર કરનાર યુવકનો આ વીધો
સોશિયલ મીડિયામાં પણ ખૂબ વાયરલ
થયો હતો, ત્યારે આ પ્રકારના વીડિયો
પ્રતિબંધિત કરવા અને તેને કાઢી નાંખવા
પણ એટલા જ જરૂરી છે. આ પટના જન
સખાહમાં બની હતી, જેનો વીડિયો વાયરલ
થયો છે તે જસ્ટિસ નિર્દેશ એસ.ડેસાઈની
કોર્ટમાં બની હતી. વીડિયોની શરૂઆતમાં
અબ્દુલ સમદ બેટરી તરીકે લોગ ઇન
થયેલા વ્યક્તિનો કલોઝ અપ દર્શાવાય છે,
જેણે તેના મળ્યામાં બ્લુટૂથ ઈપરસેન પહેમાં
હતા. તે શૌચાલય પર બેઠેલો હોવાનું
વીડિયોમાં જોવા મળે છે. આ વ્યક્તિ પોતે
દરિયાદી હતો અને આસોપીઓની ફરિયાદ
રદ કરવાની કલોસીંગ પિટિશનમાં તે
પતિવાદી ફરિયાદી તરીકે હાજર થઈ રહ્યો
હતો. જો કે, આ પ્રકારે શૌચાલયમાંથી
ઓનલાઈન કોર્ટ પોલીસીંગમાં હાજર
થવાના તેના કૃત્યનો વીડિયો વાયરલ થતાં
હાઈકોર્ટે કસૂરવાર યુવક વિરુદ્ધ સુઓમોટો
કન્ટેમ્પટ પોલીસીંગ હાથ પરી છે.

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા
અમદાવાદ સહિત ૨૧ જિલ્લામાં
આગામી બે દિવસ યલ્લો એલર્ટ

D. BHASKAR

રાજ્યમાં મોટાભાગના
જિલ્લાઓમાં આગામી ૭ દિવસ સુધી
સર્વોચ્ચ વરસાદની હવામાન વિભાગે
આગામી કરી છે. આજે કચ્છ,
પોરબંદર, દારકા, અરવલ્લી,
મહીસાગર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં
હટાણવામાં થયેલો અતિભારે
વરસાદની આગામી કરવામાં આવી

૧૦ વાગ્યા સુધી ૫ જિલ્લામાં રેડ
એલર્ટ અપાયું છે. હવામાન વિભાગ
દ્વારા આગામી ત્રણ કલાક એટલે કે
સાંચીના ૧૦ વાગ્યા સુધી કચ્છ,
પાટણ, મોરબી, સાબરકાંઠા અને
મહેસાણામાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે.
જ્યારે બનાસકાંઠા, અમદાવાદ,
ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર,
દાહોડ, પંચમહાલ, ખેડા, અમરેલી,

આણંદમાં ત્રિભુવન સહકારિતા યુનિવર્સિટીનો શિલાન્યાસ
હવે સહકારી ધોરણે ટેકસી સેવા અને
વીમા સેવા શરૂ કરાશે : અમિત શાહ

સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસમાં
રહેલી ખામીઓ ઓળખી
અને તેના વિકાસ માટે
સાત નવા પગલાં અમલમાં

સહકારી સંસ્થામાં ભારતીય
લાગતા ભાઈ-ભત્રીજાવાદના
આદર્શો દૂર થયે અને
પારદર્શિતા વધશે : અમિત શાહ

ત્રિભુવનદાસ પટેલ
યુનિવર્સિટીથી સમગ્ર દેશમાં નવા
યુગની સહકારિતા સંસ્કૃતિનું
નિર્માણ કરશે : સીએમ

D. BHASKAR

શિલા નગરી આણંદ ખાતે
૧૨૫ એકરમાં ૫૦૦ કરોડના ખર્ચે
તૈયાર થનારી વિશ્વની પથમ
ત્રિભુવન સહકારિતા યુનિવર્સિટીનો
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી
અમિત શાહ તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર
પટેલે શિલાન્યાસ કર્યો હતો. કેન્દ્ર
સરકાર દ્વારા વર્તમાન બજેટમાં તેની
ધોષણા કરવા બાદના માન યાર જ
માસમાં આ મહત્વાકાંક્ષી શૈક્ષણિક
સંસ્થાન કાર્યાન્વિત થવા જઈ રહ્યું
છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ
જણાવ્યું કે, આગામી દિવસોમાં
સહકારી પદ્ધતિનો વ્યાપ વધવાનો
છે. સહકારી ધોરણે ટેકસી સેવા
અને વીમા સેવા શરૂ કરવાના
આયોજન વચ્ચે આ સૈનને જરૂરી
કુશળ માનવ સંસ્થાન આ
યુનિવર્સિટીમાંથી મળી રહેશે.
પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં સહકાર
મંત્રાલયની સ્થાપના એ ગરીબ અને
ખામીયા લોકોના આર્થિક
સક્ષમિકરણ માટે એક ઐતિહાસિક
પગલું છે.

આ મંત્રાલયે દેશભરના ૧૬
અગ્રણી સહકારી નેતાઓ સાથે
બેઠકો યોજી હતી અને તેમના
મંતવ્યો જાણવામાં આવ્યા હતા.



સહકારી સૈનના વિકાસમાં રહેલી
ખામીઓ ઓળખી અને તેના વિકાસ
માટે સાત નવા પગલાં અમલમાં
મુકવામાં આવ્યા છે. તેમણે
ભારતપૂર્વક જણાવ્યું કે ત્રિભુવન
સહકારી યુનિવર્સિટીની સ્થાપના એ
સહકારી સૈનની તમામ ખામીઓને
દૂર કરવાની એક પહેલ છે. સહકારી
સૈનમાં મતી ભારતીમાં
યુનિવર્સિટીમાંથી શિલા
લેનારાઓને નોકરીઓ મળશે.
આવું થવાથી સહકારી સંસ્થામાં
ભારતીમાં લાગતા ભાઈ-
ભત્રીજાવાદના આદર્શો દૂર થશે
અને પારદર્શિતા વધશે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું

હતું કે, આજનો આંતરરાષ્ટ્રીય
સહકારી દિવસના પાવન અવસરે
ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીના
નિર્માણ માટેના ખાતમુહૂર્તનો
ઐતિહાસિક પસંગ આણંદની પરતી
પર ઉજવાયો છે. જે ભારતના
સહકારી ઇતિહાસમાં એક
મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ રૂપ છે. આ
યુનિવર્સિટી દેશની પ્રથમ સહકારી
યુનિવર્સિટી તરીકે સહકાર સૈનમાં
નવા યુગની શરૂઆત કરશે. આ
ઉત્કૃષ્ટ પહેલથી સહકારી સૈનને
શૈક્ષણિક, સંશોધન અને નીતિ
નિર્માણના સ્તરે મજબૂત પાથરશે
મળશે, જે નવા યુગની સહકારિતા
સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરશે.

વસ્ત્રાપુર, એસજી હાઈવે, સોલા સહિતના વિસ્તારોમાં હળવા આપટાં
શહેરમાં હળવાથી ભારે આપટાં સાથે
સરેરાશ અડધા ઈંચથી વધુ વરસાદ

નિકોલમાં દોઢ ઈંચ, ઓઢવ, વાસણા, મક્તમપુરામાં એક- એક ઈંચ વરસાદ


D. BHASKAR

અમદાવાદમાં અપાવી માહોલ
જેવા મળી રહ્યો છે. શનિવારે દિવસ
દરમિયાન શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં
વરસાદના હળવાથી ભારે આપટાં
વરસવા સાથે સરેરાશ અડધા ઈંચથી
વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. પૂર્વ જોનના
નિકોલમાં દોઢ ઈંચ, ઓઢવમાં એક
ઈંચથી વધુ વરસાદ માંડકરો હતો.
વાસણામાં એક ઈંચ, મક્તમપુરામાં
એક ઈંચથી વધુ, મુનિ. કોપો,
દાણાપીઠમાં એક ઈંચ, ટાંગોર
કંટોલમાં પોણા ઈંચ, મણિનગરમાં
અડધો ઈંચ, વરસાદ નોંધાયો હતો.
શહેરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં
અને રોડ સાઈડમાં વરસાદી પાણી
ભરાવાને કારણે નાજરિકો અને



વિસ્તારોમાં ફક્ત એક ઈંચ વરસાદમાં
જ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાય છે

ઓઢવમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં
જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળે છે



અમદાવાદમાં અઢી ઈંચ સુધી વરસાદ
અનેક વિસ્તારોમાં ઘંટણસમા પાણી

વટવા, કોતરપુર, ચાંદબેડા, નરોડામાં ૧.૫૦ ઈંચથી વધુ વરસાદ : હજુ આગામી ૩ દિવસ વરસાદની આગાહી

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

આ વર્ષે એમ.ઈ-એમ.નાર્મમાં ૯૭૦૦થી વધુ બેઠક

૪૬૮૦ વિદ્યાર્થીમાંથી ૫૫૬ વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહ્યા : આજે પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જાહેર કરાશે

[illegible]

DATE RECEIVED: 01/27/2016

[illegible]

મિલકતના સોદામાં કોઈ પાસે વધુ તો કોઈ પાસે

સામેલકત પરની બાકી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવા વ્યક્તિ સામેથી જાય તો કલમ ૧૭૦ની જોગવાઈ હેઠળ તેની પાસેથી દંડ વસૂલી શકાતો નથી.

11. <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2016.05.004> | e-mail: arthur@math.berkeley.edu

સિદ્ધિ ફેસ્ટ

15 ફેબ્રુઆરીએ ખેડૂતોએ સિદ્ધિ ફેસ્ટની શરૂઆત કરી હતી. આ ઉજવણીમાં ખેડૂતોએ સિદ્ધિ ફેસ્ટની શરૂઆત કરી હતી.

માસ કામની યોજના

સ્વાતક કોર્સમાં પ્રવેશ લઈ આર્થિક સહાય મેળવી મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ કોલેજની ટ્યુશન ફીના 50 ટકા પરત મેળવો

ગુજરાત સરકારે 2025-26ના બજેટમાં જાહેર કરેલી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (MYSY) હેઠળ 78 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

શું છે MYSY યોજના?

ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને સહાય મળે તે માટે 2015-16થી યોજના શરૂ કરાઈ છે. મીડિયમ એન્ટ્રીના વિદ્યાર્થીઓ, B.A., B.Com, B.Sc વગેરે કોર્સના એન્ટ્રીના વેપારીને વાર્ષિક 50 ટકા ટ્યુશન ફીના 50% સહાય મળે તેનો નિર્ણય કરાયો છે.

શું છે માન્યતા: યો. 17માં 80% કે તેથી વધુ પસંદગી મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે માન્યતા આપવામાં આવે છે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મળે તેનો નિર્ણય કરાયો છે.

આ રીતે અરજી કરવી?

1. પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર કે જેણે વિદ્યાર્થીની કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવ્યો તેણે 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.
2. કોર્સમાં વિજ્ઞાતો ભરી તેમજ પસંદગી મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

કેટલી સહાય મળે?

ટ્યુશન ફીની 50% રકમ સહાય મળે તેનો નિર્ણય કરાયો છે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

સહાય મેળવવાની અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

સહાય મેળવવાની અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

સહાય મેળવવાની અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદ ફ્રંટ પેજ

અમદાવાદ, ગાંધી, 7 ફેબ્રુઆરી, 2025

મહે પોલીસ

15 વર્ષથી સ્વપ્નમાં ખાડા પૂરતા સાયન્ટિસ્ટ, કારમાં ઈંટો-હથોડી લઈ પહોંચી જાય છે, કહે છે- આ માત્ર સરકારની જ નહિ, આપણી પણ જવાબદારી



અમદાવાદના પોલીસ સ્ટેશન પર પહોંચી પોલીસ ઓફિસર સાથે વાતચીત કરી રહ્યો છે. તેણે કહ્યું કે તેણે 15 વર્ષથી સ્વપ્નમાં ખાડા પૂરતા સાયન્ટિસ્ટ બની જાય છે. તેણે કહ્યું કે તેણે 15 વર્ષથી સ્વપ્નમાં ખાડા પૂરતા સાયન્ટિસ્ટ બની જાય છે.



પૂર્વમાં દોઢ ઈંચ, પશ્ચિમમાં પોણા અને શહેરમાં સરેરાશ 1 ઈંચ વરસાદ પડ્યો કોતરપુર-વટવામાં પોણા ત્રણ ઈંચ વરસાદથી પાણી ભરાયું, બોપલ પાસે ગરનાળામાં કાર ફસાઈ એકસાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી હજુ 36 કલાક મથમથી ભારે વરસાદની આગાહી



કોતરપુર અને વટવામાં પોણા ત્રણ ઈંચ વરસાદથી પાણી ભરાયું. બોપલ પાસે ગરનાળામાં કાર ફસાઈ. એકસાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી હજુ 36 કલાક મથમથી ભારે વરસાદની આગાહી.

કોતરપુર અને વટવામાં પોણા ત્રણ ઈંચ વરસાદથી પાણી ભરાયું. બોપલ પાસે ગરનાળામાં કાર ફસાઈ. એકસાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી હજુ 36 કલાક મથમથી ભારે વરસાદની આગાહી.

કોતરપુર અને વટવામાં પોણા ત્રણ ઈંચ વરસાદથી પાણી ભરાયું. બોપલ પાસે ગરનાળામાં કાર ફસાઈ. એકસાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી હજુ 36 કલાક મથમથી ભારે વરસાદની આગાહી.

અમદાવાદ, ગાંધી, 7 ફેબ્રુઆરી, 2025

શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.

અમદાવાદના શિર્ડીમાં નાની ભૂલ હશે તો 200 ટકા સુધી દંડ થઈ શકે. આ માટે વિદ્યાર્થીઓને 10% સહાય મેળવવાની અરજી કરવી પડે છે.





09-Jul-2025 10:16
22°53'58.98469"N 72°13'52.79128"E
129° SE
Unnamed Road
Kundal
Gujarat
Altitude:-38.1m
Speed:0.0km/h
52/4
Index number: 2133





10-Jul-2025 14:48

22°49'40.211111"N 72°17'11.91394"E


197° S

Altitude:-35.6m

Speed:0.0km/h

47/0

Index number: 2148



Rajesh Yadav / Supply Point / Ahmedabad

Annexure P-10 (Colly)

From: Rajesh Yadav / Supply Point / Ahmedabad
Sent: Wednesday, November 5, 2025 17:24
To: 'fm-cil-ctu@ctuil.in'
Cc: Pramod Patel; Dipak Bhajekar; 'PSPM Division CEA'; 'K Nagraj Bhat (के. नागराज भट)'
Subject: Force Majeure Notification & Request for Time Extension – Torrent PowerGrid Limited
Attachments: TPGL Letter for Force Majeure dt 05-11-2025.pdf

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a scanned copy of our letter **TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/11/2025/20 dated 05th November 2025**, addressed to your good office, regarding **invocation of Force Majeure and request for extension of time** for the *Transmission Scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II – Part D: “LILO of 400 kV Pirana PG–Pirana (T) Torrent D/C Line at PGCIL’s 765 kV Ahmedabad SS location (RTM)”* under **Torrent PowerGrid Limited**.

The letter provides details of the **disruptions to construction activities in Ahmedabad district, Gujarat, during Oct–Nov 2025 due to heavy rainfall**.

We respectfully request you to kindly take the same on record. The **original letter has been sent today via courier** for your reference.

Enclosure: Scanned letter copy with annexures (newspaper clippings & site photographs).

With regards,
Sincerely,

Pramod Patel
Director-TPGL
Torrent Powergrid Limited

Thanking You ,

TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/11/2025/20

Date: Nov 05th , 2025

To,

Chief General Manager (CGM)

CTUIL Corporate/CGM Office

Floors 5th–10th, IRCON International Tower, Tower 1,

Plot No. 16, Institutional Area, Sector 32, Gurugram, Haryana 122003

Email: nagraj@powergrid.in

Kind Atten : Sh. K Nagraj Bhatt

Subject: Force Majeure Declaration & Request for Extension of Time – Unseasonal Rainfall Disruption (Oct & Nov 2025) in Ahmedabad District , Gujarat.

Ref: ISTS Transmission Scheme for Evacuation of 4.5 GW RE at Khavda PS under Phase II, Part-D – LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmedabad S/s.

Dear Sir,

We would like to bring to your kind attention that the ongoing construction activities for the 400 kV M/C LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/c transmission line, being executed by Torrent Power Grid Ltd. (TPGL) under the Khavda PS Phase-II Part-D Transmission Scheme, have been significantly disrupted due to heavy and unseasonal rainfall experienced in the Ahmedabad region of Gujarat during Oct & Nov- 2025.

The adverse weather conditions have caused interruption of construction works at multiple sites during rainfall, as detailed below:

Scope of Work:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D (RTM) includes:

- **LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/C line at Ahmedabad S/s with twin HTLS, along with reconductoring of the Pirana (PG) – Pirana (T) line with twin HTLS conductor and OPGW for both mainline and LILO section.**
- Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (T) 400 kV line bays (Bay Upgradation – 4 Nos).

Force Majeure Event Description

The Transmission Line traverses through the following Major Villages in Ahmedabad District Gujarat:

- Piplaj, Kamod, Bakrol-Badrabad, Visalpur, Paldi-Kankaj, Kasindra Navapura, Saroda, Badarkha, Chaloda, Juval-Rupavati, Salajada, Rupal, Bavla, Adaroda, Sankod Mankol, Kundal, Melasana, Makhiyav, Bakrana, Zolapur.

The ongoing construction of the **LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400 kV D/C line** at Ahmedabad S/s transmission line has been significantly disrupted due to unseasonal and intense heavy rainfall in the District Ahmedabad , Gujarat State during **28th Oct -3rd Nov 2025**.

The adverse weather conditions caused work interruptions at multiple locations, as detailed below:

From	To	District/State	Rainfall Duration	Remarks
28-Oct-2025	31-Oct-2025	Ahmedabad , Gujarat	Day & Night	Work hampered for ~04 days
01-Nov-2025	03-Nov-2025			Work hampered for ~03 days

Additionally, due to persistent water logging on the approach road to the sites, a **minimum of 07 further days** is required to make the area trafficable; we presently anticipate restoration of approach road access by **10 Nov 2025**, subject to weather conditions.

TORRENT POWER GRID LIMITED

CIN : U40104GJ2005PLC046660

Regd. Office : "Samarvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, India. Phone: 079 - 26628300 email: cs.tpgl@torrentpower.com



These conditions, falling under– **Natural Force Majeure Events**, have severely impacted site access and the supply chain for critical construction materials such as aggregates, cement, and tower components. The transport of materials and machinery through agricultural and marshy terrain has been particularly affected.

Progress Status as of Oct 31, 2025 Transmission Line (for 60 km M/C line):

Sno	Activity	Status (Completed/Total)	Mobilized Status	SCoD
1	Foundation	147/out of 174Nos	06 Gangs	To Align/matching with the commissioning timeframe of Khavda Phase II – Parts A to C
2	Total Erection	130/out of 174 Nos	13 Gangs	
3	Stringing M/C	19.58/60 Km	03 Gangs	

Request for Relief :

In light of these uncontrollable circumstances, we:

- **Declare a Force Majeure event** for the affected period.
- Request a **14-day extension of time** to compensate for the disruption.
- Confirm our commitment to **mitigation measures**, including revised schedules, accelerated manpower deployment, and priority logistics.
- Weather reports/newspaper cuttings (**Ahmedabad rainfall, Oct–Nov 2025**).
- Site photographs demonstrate work stoppage conditions.

We remain fully committed to the timely completion of the remaining works, with all necessary mitigation measures being adopted to minimize delays.

We sincerely request CTUIL's understanding and favorable consideration of our request for a time extension. We will continue to keep both CTUIL and CEA informed of further developments and progress in recovery efforts.

We highly appreciate your continued support and cooperation.
Yours sincerely,



Pramod Patel
Director
Torrent PowerGrid Limited



Copy for information pl : The Chief Engineer, PSPM Division,
Enclosure: As above : Copy of cutting newspaper.
: Site photographs



આવતા વિદ્યાર્થીઓમાં મોટી યુનિ.ઓમાં વિદ્યાર્થીઓ ભરે છે (તસવીર : શૈલેષ સોલંકી)

આવતા વિદ્યાર્થીઓમાં મોટી યુનિ.ઓમાં વિદ્યાર્થીઓ ભરે છે

અમદાવાદ, સોમવાર - અમદાવાદમાં આવતા વિદેશી વિદ્યાર્થીઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોઈ સૂચના કે રિપોર્ટ મળ્યો નથી. રિપોર્ટ મળ્યા બાદ અમે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરીશું.

બાદ ICCR રેવ પાર્ટીમાં મે પગલાંનો નિર્ણય લેશે

હજુ સુધી અમને યુનિ. કે પોલીસમાંથી કોઈ સૂચના કે રિપોર્ટ મળ્યો નથી. રિપોર્ટ મળ્યા બાદ અમે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરીશું.

હાલ આ ઘટનામાં કેટલા વિદેશી વિદ્યાર્થી હતા તેની જાણ નથી પરંતુ ગુજરાતની સરકારી યુનિ.ઓ અને સેન્ટ્રલ યુનિ.માં આઈસીસીઆર હેઠળ ૧૩૫૦ વિદ્યાર્થીઓ હાલ વિવિધ કોર્સમાં અભ્યાસ કરે છે. બીજા બાજુ ગુજરાત યુનિ.ના એનઆરઆઈ હોસ્ટેલ-આઈસીસીઆર સ્ટુડન્ટની જવાબદારી સંભાળતા અધિકારીએ આ મુદ્દે ફોન ઉપાડવાની પણ તસ્દી લીધી ન હતી. યુનિ.તંત્રનું કહેવું છે કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તે ખબર નથી. ગુજરાત યુનિ.તંત્ર કેટલું નિષ્ક્રિય છે તે આ બાબતથી જાણી શકાય છે. જ્યારે જીટીયુનું કહેવું છે કે અમે આઈસીસીઆરને જાણ કરી દીધી છે. હવે આઈસીસીઆર નિર્ણય લેશે. નિયમ મુજબ વિદ્યાર્થીઓની

રવિવારની મધરાતથી ઝરમર વરસાદ અમદાવાદ શહેરમાં સોમવારે દિવસ દરમિયાન સરેરાશ એક ઈંચ વરસાદ

અમદાવાદ, સોમવાર - અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા ડીપ ડીપ્રેશનના કારણે રાજ્યની સાથે અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો હતો. રવિવારની મધરાતથી શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારમાં ઝરમર વરસાદ વરસવાનું શરૂ થયું હતું. સોમવારે પણ દિવસ દરમિયાન વરસાદ ચાલુ રહેતા સાંજ સુધીમાં

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મોન્સૂન કંટ્રોલરૂમ બંધ કર્યા પછી વરસાદ

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રવિવારે મોડી રાતથી શહેરના નવા વાડજ, રાણીપ, સાબરમતી, પાલડી, નવરંગપુરા, વાસજા સહીતના અન્ય વિસ્તારમાં પીપી પારે કહી શકાય એ પ્રમાણેનો વરસાદ વરસતા રોડ ઉપર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા. સોમવારે સવારથી જ આકાશ કાળા વાદળોથી ગોરંભાયેલું જોવા મળ્યું હતું. એસ.જી.હાઈવે ઉપરાંત બોડકદેવની સાથે મણિનગર, ઈસનપુર, નરોડા, કુબેરનગર સહીતના વિસ્તારમાં

અમદાવાદના તાપમાનમાં પાંચ ડિગ્રીનો ઘટાડો અમદાવાદમાં આજે દિવસ દરમિયાન હિલ સ્ટેશન જેવો માહોલ ઘટી ગયો હતો. આજે દિવસ દરમિયાન ૨૫.૮ ડિગ્રી સાથે સરેરાશ મહત્તમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં ૪.૬

સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. આ વર્ષે નવરાત્રિમાં વરસાદના વિખ્ખ પછી લાલ પાંચમની રાતથી ફરીથી શરૂ થયેલા વરસાદને કારણે શહેરના વાઈરલ ફીવર ઉપરાંત શરદી, ખાંસી સહીતના અન્ય રોગના દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે.

મ્યુનિ.એ હાથ ધરેલી વૃક્ષ ગણતરીમાં સામે આવેલા આંકડા નવરંગપુરા વોર્ડમાં સૌથી વધુ ૧.૮૦ લાખ, દરિયાપુરમાં માત્ર ૬૫૧ વૃક્ષ!

અમદાવાદ, સોમવાર - અમદાવાદમાં વર્ષ-૨૦૧૨ પછી પહેલી વખત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વૃક્ષ ગણતરીની કામગીરી સાર્વજનિક નામની એજન્સી પાસે કરાવવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં વૃક્ષ ગણતરીને લઈ કરવામાં આવેલી કામગીરીની સામે આવેલી વિગત મુજબ નવરંગપુરા વોર્ડમાં સૌથી વધુ ૧.૮૦ લાખ વૃક્ષ મળી આવ્યા છે. દરિયાપુર વોર્ડમાં સૌથી ઓછા ૬૫૧ વૃક્ષ મળી આવ્યા છે. વૃક્ષ ગણતરીની કામગીરી પુરી થયા પછી કયા વોર્ડમાં કેટલા વૃક્ષ કેટલા વર્ષ જૂના છે, તેની ઉપયોગીતા શું છે તે અંગેની વિગત જાહેર કરવામાં આવશે. આ વર્ષની વૃક્ષ ગણતરીમાં ૪૭ વોર્ડમાં કુલ ૮.૮૧ લાખ વૃક્ષની ગણતરી પુરી કરાઈ છે. વર્ષ-૨૦૧૨માં શહેરમાં કુલ ૬.૧૮ લાખ વૃક્ષ હતા. એ સમયે શહેરની ગ્રીન કવર એરીયા ૪.૬૬ ટકા હતો.

૪૭ વોર્ડમાં કુલ ૮.૮૧ લાખ વૃક્ષો નોંધાયા, ગણતરી પૂર્ણ થયા પછી વૃક્ષોનું આયુષ્ય અને ઉપયોગીતાની વિગતો જાહેર કરાશે

વર્ષ-૨૦૨૫-૨૬માં અમદાવાદમાં ૪૦ લાખ જેટલા રોપાં અને વૃક્ષો વાવવા પાછળ રૂપિયા ૬૯ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. મ્યુનિસિપલ આઈસીસીઆર રેવ પાર્ટીમાં મે પગલાંનો નિર્ણય લેશે. નિયમ મુજબ વિદ્યાર્થીઓની

શહેરના કયા વોર્ડમાં કેટલા વૃક્ષ		શહેરના કયા વોર્ડમાં કેટલા વૃક્ષ	
વોર્ડ	વૃક્ષની સંખ્યા	વોર્ડ	વૃક્ષની સંખ્યા
દરિયાપુર	૬૫૧	જોધપુર	૧૧૨૦૮
ખાડીયા	૭૮૨	અસારવા	૩૪૩૫૭
દાણીલીમડા	૮૧૪	માલીયાજી	૩૪૩૫૭
		શહેરજી	૬૩૦૭૬



દિવ્ય ભાસ્કર

દિવ્ય ભાસ્કર

અમદાવાદ, મંગળવાર,
28 ઓક્ટોબર, 2025 | 11

બારની ચૂંટણીમાં
ઉમેદવારી માટે 1.25
લાખ ભરવા પડશે

લીમલ રિપોર્ટર | અમદાવાદ

શની 19 સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલની યોજનારી ચૂંટણીમાં વકીલોએ ઉમેદવારી ફી પેટે રૂ.1.25 લાખ ભરવાના નિર્ણય વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન કરાઈ હતી. પરંતુ સુપ્રીમે તમામ સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલની એનરોલમેન્ટ ફી ઓછી થવાના કારણે પડેલી નાણાંકીય ખાધને ધ્યાનમાં રાખી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના નિર્ણય વિરુદ્ધ પિટિશન દાખલ કરી નહોતી.

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ તેમની સાધારણ સભામાં દરેક જ્યારે પણ ચૂંટણી યોજાય અને કોઈપણ મારાશાસ્ત્રી ઉમેદવારી કરવા ઇચ્છતા હોય તેમની પાસેથી ઉમેદવારી ફી પેટે રૂ.1.25 લાખ ભરવાનું નક્કી કર્યું હતું. અગાઉ ફી રૂ.25 હજાર કરવા ભલામણ કરવામાં આવી હતી.

માવઠાથી એક દિવસમાં મહત્તમ તાપમાન 5 અને લઘુત્તમ 2.5 ડિગ્રી ગ્રેડમાં
2019 પછી શહેરમાં ઓક્ટોબરમાં સૌથી વધુ 24 મીમી વરસાદ પડ્યો

ભાસ્કર ન્યૂઝ | અમદાવાદ

અરબી સમુદ્રના પૂર્વ-મધ્ય વિસ્તારમાં ડિપ્રેશનની સાથે (વાતાવરણમાં ઉપરના લેવલમાં હવાનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ) અપર એર સાઈકલોનિક સરક્યુલેશન અને ટ્રફની સિસ્ટમની અસરથી અમદાવાદમાં હળવો વરસાદ પડ્યો હતો. છેલ્લાં 25 વર્ષમાં અમદાવાદમાં 12 વાર ઓક્ટોબર મહિનામાં માવઠું થયું છે. અગાઉ ઓક્ટોબર 2019માં 30.3 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો. આજે દિવસભર શહેરમાં 24 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો. પરંતુ દિવસભર ઝરમર વરસાદ ચાલુ રહેતાં સોમવારે અમદાવાદનું તાપમાન 4.8 ડિગ્રી ગ્રેડને 25.8 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો હતો.



વાદળિયા વાતાવરણ અને વરસાદી માહોલની અસરથી અમદાવાદમાં વિઝીબીલીટી 4 કિલોમીટરથી ઘટીને 1 કિલોમીટરની થઈ ગઈ હતી.

2 નવેમ્બર સુધી શહેરમાં વરસાદી માહોલ રહેશે

અમદાવાદમાં ઓક્ટોબરમાં વર્ષ-2000થી 2025ના 25 વર્ષો દરમિયાન 12 વખત માવઠું થયું છે. આ અગાઉ 2019માં અમદાવાદમાં ઓક્ટોબરમાં 30.3 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો. ત્યારબાદ આ વર્ષે એટલે કે, 6 વર્ષ બાદ સૌથી વધુ 24.2 મીમી વરસાદ પડ્યો છે. ડિપ્રેશનની સિસ્ટમ ખુબ જ ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહી છે, જેને કારણે અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં 2 નવેમ્બર સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. » અંકિત પટેલ, હવામાન વિશેષજ્ઞ

ફ થતાં રવિવારે રાત્રે સોલા સિવિલમાં લવાઈ હતી
તી બાળકીની સારવાર કરવાને
ડોક્ટરે ના પાડી ઉદ્ધત વર્તન કર્યું



હતો, રવિવારે બાળકીની તબિયત

મહિલા ડોક્ટર દોષિત સાબિત થશે તો પગલા લેવાશે

મહિલા ડોક્ટર અને દર્દીની સગાં વચ્ચે થયેલાં ઘર્ષણની ઘટના બાદ હોસ્પિટલના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ તપાસ હાથ પરી છે. મહિલા ડોક્ટર દોષિત સાબિત થશે તો યોગ્ય પગલા

સામાન્ય વરસાદમાં પણ RTOનો ટ્રેક 3 કલાક બંધ રહ્યો
ટ્રેકમાં પાણી ભરાઈ જતાં ટેસ્ટ માટે
આવેલા અરજદારોને ધક્કો પડ્યો

ભાસ્કર ન્યૂઝ | અમદાવાદ

સામાન્ય વરસાદમાં પણ સુભાષભિજ આરટીઓના ટેસ્ટ ટ્રેકમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. જેને કારણે 3 કલાક સુધી ટ્રેક બંધ રાખવો પડ્યો હતો અને સવારે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ આપવા આવેલા 30થી વધુ અરજદારોને ધક્કો પડ્યો હતો.

આરટીઓના અધિકારીએ જણાવ્યું કે ફેબ્રુઆરી સંધી નવો

ચોમાસામાં પણ 10થી વધુ ટ્રેક બંધ રહ્યો હતો

ચોમાસામાં સુભાષભિજ આરટીઓના ટેસ્ટ ટ્રેકમાં પાણી ભરાવા ઉપરાંત સેન્સર ખરાબ થઈ જવાના કારણે 10 દિવસ સુધી ટેસ્ટ ટ્રેક બંધ રાખવો પડ્યો હતો. જેને કારણે હજારો અરજદારોને પાછા જવું પડ્યું હતું. આરટીઓનો ટેસ્ટ

ગુજરાત

બુધવાર, તા. ૨૯ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫

જોશી ૩૧મી ઓક્ટોબરે નિવૃત્ત સ ગુજરાતના મુખ્ય ગૃહ સચિવ કોણ?

૧૬ મંગળવાર કારણે નિવૃત્ત થઈ રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાત કેડરના ૧૯૯૦ બેચના સચિવ તરીકે વરિષ્ઠ ઓઈએસ મનોજકુમાર દાસને ગુજરાતના મુખ્ય હોદ્દા કેમ કે, સચિવપદે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. હવે તેઓ ચીફ સેક્રેટરી પદથી દા ના પંકજ જોષીના અનુગામી તરીકે સેવા આપશે.

ટેન્શન મળ્યુ નહી, દાસ ૩૧મીએ મહીવટી તંત્રનું નેતૃત્વ સંભાળશે

નોજકુમાર દાસ IITમાંથી કમ્પ્યુટર સાયન્સ કરેલું છે

૨૦મી ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ના રોજ બિહારના દરભંગમાં જન્મ. આઈઆઈટી ખડગપુરમાંથી કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં બી.ટેક. (ઓનલાઈન) ની ડિગ્રી ધરાવે છે. ૨૦૧૧-૧૯૯૦ બેચના ગુજરાત કેડરના વરિષ્ઠ અધિકારી. તેમણે વડોદરા અને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશ્નર તરીકે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું છે, જ્યાં તેમના નેતૃત્વ હેઠળ શહેર વિકાસ, સ્વચ્છતા અને શહેરી આયોજનમાં નોંધપાત્ર સુધારાઓ.

ગુજરાત મરીન બોર્ડના ચેરમેન તરીકે તેમણે રાજ્યના દરિયાકાંઠાના વિકાસ અને બંદર સંચાલનના ક્ષેત્રે નવી નીતિઓ અમલમાં મૂકીને મહત્વનું ધોગદાન આપ્યું હતું. તેઓ પ્રભાવશાળી નેતૃત્વ, પારદર્શક વહીવટ અને ટકોલાત્મક પૃષ્ઠભૂમિ માટે જાણીતા છે.

નિવૃત્તિ કરી હતી. મનોજ દાસ હાલ તરીકે કાર્યરત છે. તેમણે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તરેની કાર્યાલયમાં અધિક મુખ્ય સચિવ (અનુસંધાન છટે પાને)

લેસણું
સ્વ. કાંતિલાલ જેઠાલાલ શાહોડ
(ગામ-ભારાદરવા, તા. ચાણસ્મા)
ને રવિવારના રોજ દુઃખદ અવસાન
લેસણું તા. ૩૦-૧૦-૨૦૨૫નો
માટે ૧૦ થી બપોરના ૪ સુધી
ખેલ છે.
અગ્નિ શક્તિપોલીસી બાજુમાં,
ગર, મો. ૯૯૦૯૦ ૮૮૫૬૧
કોઠીલા-ધિરજ દેતલ-ચિરાગ
પળી-કીસિક સમસ્ત પરિવાર

કાપારટરન ટિકટ અપાતા નથી. આ વખતે પણ આ આખતમાં બનવાનું કારણ નથી મોવડીમંડળ મક્કમ હોવાનું આધારભૂત સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે.

આંધ્રમાં વાવાઝોડું ત્રાટક્યું છે ત્યારે ભારે વરસાદ લાવતું અરબી સમુદ્રનું ડિપ્રેશન ગુજરાત તરફ

રાજકોટ, મંગળવાર એક તરફ પ્રચંડ વાવાઝોડું (સિવિલ સાયકલોનિક સ્ટોમ) 'મોનયા' આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા કોઠા નજીક પ્રતિ કલાકની ૧૧૦ કિ.મી.ની વિનાશક ઝડપ સાથે ધસી આવ્યું છે ત્યારે બીજી તરફ ગુજરાતમાં મુશળધાર કમોસમી વરસાદ વરસાવીને ખેડૂતોની માઠી દશા સર્જનાર પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં રહેલું ડિપ્રેશન આજે ગુજરાતની દિશા તરફ આગળ વધ્યું છે.

આશરે ૧૦૦ કિ.મી. નજીક આવ્યું, આજે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે, અન્યત્ર તોફાની વર્ષાનું એલર્ટ

ગઈકાલે તે વેરાવળથી ૫૦૦ કિ.મી.ના અંતરે હતું અને આજે સાંજના અંધવાલ મુજબ તે ૪૮૦ કિ.મી. દૂર છે, એક દિવસમાં આશરે ૧૦૦ કિ.મી. નજીક આવ્યું છે. વળી, આ ડિપ્રેશન સાથે ગુજરાતના પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાન ઉપર સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે જેના પગલે મધ્ય ગુજરાત થઈને અરબી સમુદ્રથી રાજસ્થાન સુધી સમુદ્ર સપાટીથી ૧.૫ કિ.મી. ઉંચાઈએ ભારે વરસાદ લાવે તેવું ટૂંક સમયમાં છે. આ ઉપરાંત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ કે જે સામાન્ય માવઠા વરસાવે છે તે પણ સક્રિય છે. આમ, ગુજરાતમાં માવઠાની માઠી દશા હજુ જારી રહેશે.

મોસમ વિભાગે આવતીકાલે અમરેલી, ભાવનગર જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદની (ઓરેન્જ એલર્ટ) અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભરુચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, (અનુસંધાન છટે પાને)

લેસણું
અમારા પુત્ર શ્રી કાલિદાસ ધર્મરામભાઈ પટેલ
(રીટાઈર્ડ પ્રોફેસર, શ્રી સ્વામીનારાયણ આર્ટ્સ કોલેજ, મલીનગર)
તા. ૨૮-૧૦-૨૦૨૫ના રોજ દેવલોક પ્રાપ્ત છે.
સદગતનું લેસણું - પ્રાર્થનાસભા તા. ૩૦-૧૦-૨૦૨૫,
ગુરુવારના રોજ સવારે ૮-૩૦ થી ૧૦-૩૦ કલાકે સમૃદ્ધ છે.
સ્થળ : રૂઝમલોલેલ ભાવપાર કોમ્યુનિટી હોલ,
રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ.
ડૉ. મિતેશ કાલિદાસ પટેલ
(P.S.M. Dept., B.J. Medical College)
સંજુ મિતેશ પટેલ
ડૉ. ડેવ મિતેશ પટેલ

અમદાવાદ, મંગળવાર કંબુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહ સુધીમાં આઠવાળા ચવાલ, તે જાન પંચાયત અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ હજુ પાછી ઠેલાઈ શકે છે. પંચાયતમાં સભ્ય અને મહાનગરપાલિકામાં કોર્પોરેટર બનવા ધનગનતા દાવેદારોએ હજુ રાહ જોવી પડે તેમ છે.

૫૦,૯૬૩ કર્મચારી ઘેર-ઘેર જઈને મતદારોનું વેરિફિકેશન કરશે, ગુજરાતમાં શંકાસ્પદ મતદારો કેટલાં તે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે

રાહુલ ગાધીએ કર્ણાટક સહિત મહારાષ્ટ્રમાં ડુબ્બીકેટ અને શંકાસ્પદ મતદારોને લઈને પુરાવા રજૂ કર્યા છે ત્યાર બાદ આ મુદ્દો દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે. હવે ચૂંટણીઓમાં બોગસ મતદારોની ઓફિસર ઘેર ઘેર જઈને મતદારોની ઓળખ કરશે. ૫૦,૯૬૩ બુધ લેવલ ઓફિસરોને મતદારોના વેરિફિકેશન કરવાની કામગીરી સુપરત કરાઈ છે.


૭મી ફેબ્રુઆરીએ આખરી મતદાર યાદી પ્રસિધ્ધ થશે તે જોતાં એપ્રિલ-મેમાં પંચાયત-પાલિકાની ચૂંટણી યોજાય તેવી શક્યતા

વોટિંગ ન થાય તે માટે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે આખરી કવાયત શરૂ છે. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે આદેશ કરતાં ગુજરાતમાં પણ આજથી મતદાર યાદીની ચકાસણીનું કામ શરૂ કરાયું છે. હાલ ગુજરાતમાં કુલ મળીને પાંચ કરોડ મતદારો છે ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં જન્મ-મરણના રિજિટલ સહી ધરાવતા સર્ટી. પુરાવા તરીકે માન્ય અમદાવાદ, મંગળવાર જન્મ અને મરણના રિજિટલ સહી ધરાવતા પ્રમાણપત્રો સરકારી, અર્ધ સરકારી અને અન્ય કચેરીઓમાં તમામ પ્રકારની કાર્યવાહીમાં પુરાવા તરીકે માન્ય રાખવા રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે જહેરાત કરી છે. કેન્દ્ર સરકારના સીઆરએસ પોર્ટલ પર જન્મ અને મરણની નોંધણી કરનાર રજિસ્ટ્રાર કે સબ-રજિસ્ટ્રારની રિજિટલ સહી સાથેના પ્રમાણપત્ર લોકોને ઈ-મેઈલ મારફત મોકલી આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી આવા રિજિટલ સહી ધરાવતા પ્રમાણપત્રોને માન્ય રાખવા બાબતે વિવિધ કચેરીઓમાં અસમંજસ હતી.

ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસે દર લાખ મતદારો શંકાસ્પદ હોવાનો આલોપ કર્યો છે ત્યારે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ આ પ્રક્રિયાના માધ્યમથી ડુબ્બીકેટ મતદાર તથા મૃતકના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરશે. સાથે સાથે બે સ્થળે મતદાર યાદીમાં નામ હોય તેવા મતદારોના નામ પણ યાદીમાંથી કમી કરાશે. તા. ૪ નવે. થી ૪ ડિસેમ્બર સુધી મતદાર યાદીના પ્રત્યેક મતદારની ઓળખ કરાશે. તા. ૯ ડિસેમ્બરે હંગામી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરાશે જેમાં જે મતદારોના નામ કમી થયા હશે તેમને નોટીસ પાઠવી વાંધા સાથે દસ્તાવેજ સાથે રજૂઆત કરવા તક આપવામાં

PRESTIGE HOMES
Senior Citizen's
Premium Living Facilities
વડીલો શારીરિક રીતે સ્વસ્થ, સ્વતંત્ર અને આર્થિક રીતે સહાય હોવા છતાં સલામતી તેમજ રસોઈ, ઘરકામ, જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ, ધરની જાળવણી વિગેરે સમસ્યાઓમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ અને આરામદાયક શ્રેષ્ઠ જીવનના અનુભવ માટે Prestige Homes નો આરંભ કરી રહ્યા છીએ. વધુ જાણકારી માટે સંપર્ક :
અમદાવાદ, મંગળવાર

**ચોથી વાર્ષિક પૂણ્યતિથિએ
શ્રધ્ધાંજલિ**
સ્વ. શાંતિભાઈ રતિલાલ પટેલ
સ્વ. તા. ૨૬-૧૦-૨૦૨૧
જાતકુલના સમાજના શુભચિંતક,
સાહસ, સેવા, સમર્થતા, અંતિમ સમય
સુધી લાભાનુકૂળ પ્રવૃત્તિઓ સાથે
બેઠકોલેલ એવા દિવ્ય જ્ઞાતમાને પ્રભુ
ગાંધી જયંતી ને નમ્ર પ્રાર્થના...
પ્રવિણાબેન શાંતિભાઈ પટેલ
જીવન શાંતિભાઈ પટેલ
અપિતા જીવન પટેલ & રૂઢ જીવન પટેલ
ભાગવત શાંતિભાઈ પટેલ (ઓર્થોડોક્સ)
પ્રમી ભાગવત પટેલ & હિસાબ ભાગવત પટેલ

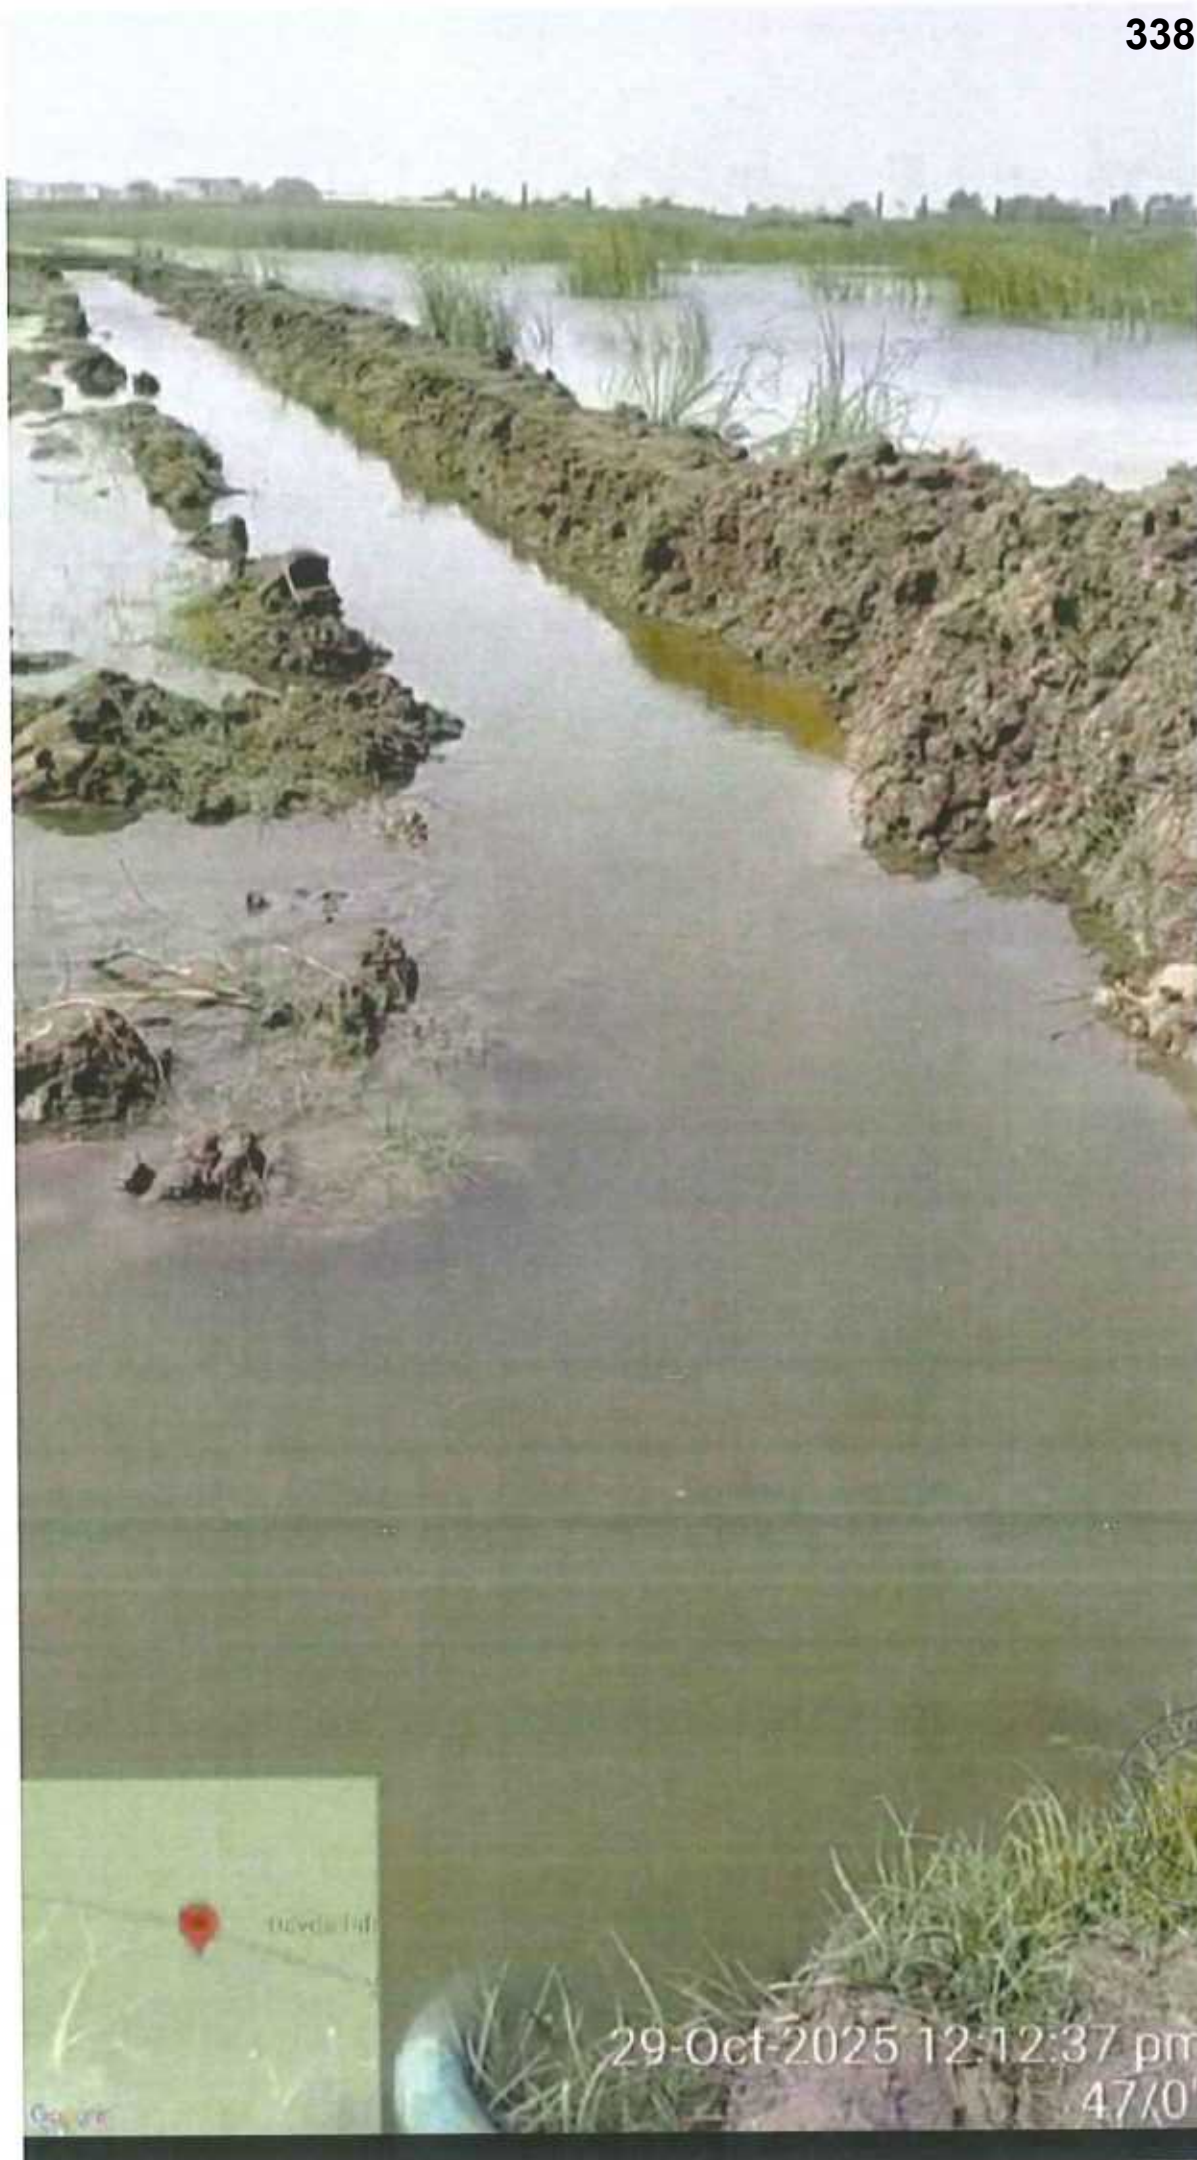

29-Oct-2025 12:12:37 pm
47/0"



મમદાવાદના RTI કાર્યકરની હત્યા દેડીજીપીને અહેવાલ આપવા નિર્દેશ

મમદાવાદ : મહાનગરપાલિકાના આરટીઆઈ કાર્યકર્તાની હત્યા કરવાના મામલે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચ HRCએ રાજ્યના ડીજીપીને બે સપ્તાહમાં અહેવાલ રજૂ નિર્દેશ આપ્યો છે. HRCએ પાઠવેલી નોટિસમાં જણાવ્યું છે કે ૨૦૨૧ના રોજ એક ટિવાંગ આરટીઆઈ

કાર્યકર્તા નરેન્દ્રભાઈ મુન ધાલતમાં મળી આવ્યો હતો. આપોંગે અવલોકન કર્યું છે કે સમાચાર અહેવાલની સામગ્રી, જો સાચી હોય તો પીડિતના માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનનો ચોખ્ખો મુદ્દો ઉઠાવે છે. જેથી ગુજરાતના પોલીસ મહાનિર્દેશકને બે સપ્તાહમાં તપાસનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવે છે.

સરવે બાદ સરકાર વિનાવિલંબે સહાય પેકેજ જાહેર કરશે : પ્રવક્તા મંત્રી ગુજરાતમાં માવઠાનો માર : ટેકનોલોજી આધારિત સરવે સાત દિવસમાં પૂર્ણ કરાશે

રાજ્યમાં ૧૦ લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તાર અસરગ્રસ્ત હોવાનો પ્રાથમિક અંદાજ

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ-માવઠાના કારણે ખેડૂતોના પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના વડપણમાં ગોપીનગર ખાતે મંત્રી મંડળની બેઠકમાં આ મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ગત અઠવાડિયામાં વરસેલા કમોસમી વરસાદને લીધે અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં ટેકનોલોજી આધારિત સર્વે સાત દિવસમાં પૂરો કરવા મુખ્યમંત્રીએ અદેશ આપ્યો છે. સર્વે પૂરો થયા બાદ ખેડૂતો માટે સહાય પેકેજ જાહેર કરવામાં આવશે. હાલના તબક્કે આશરે ૧૦ લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તાર અસરગ્રસ્ત હોવાનો પ્રાથમિક અંદાજ છે. તેમ સંકેત

સરકારના પ્રવક્તા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું. ઓક્ટોબર ૨૦૨૫ના છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં વરસેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થયું છે. ૨૩થી ૨૮ ઓક્ટોબર દરમિયાન ગુજરાતમાં ૩૩૦ મિલિમીટર જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. જેમાં હાલના તબક્કે આશરે ૧૦ લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં નુકસાનનો પ્રાથમિક અંદાજ છે. અસરગ્રસ્ત જિલ્લામાં તાકાલિક પોરેસો SARFના પારાધોરણ મુજબ સર્વે શરૂ કરીને, તેને સાત દિવસમાં પૂર્ણ કરવા સુચનાઓ અપાઈ છે. અદ્યતન ટેકનોલોજી-કૃત્રિમ પ્રગતિના માધ્યમથી ઝાડપથી સર્વેની કામગીરી હાથ પરવામાં

આવશે. ટેકનોલોજીકલ સર્વે ઉપરાંત ભૌતિક સર્વે પણ હાથ પરાશે, જેથી કોઈપણ ખેડૂત સહાયથી વંચિત ન રહે. જાણ કમોસમી વરસાદને પાને રાખીને મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય મંત્રી મંડળના સભ્યોને ત્વરિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિનો તાજ મેળવવા અદેશ આપ્યો હતો. સાથે જ ગોપીનગર ખાતેથી મુખ્યમંત્રી પરિસ્થિતિનું રિપોર્ટ ટાઈમ મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે.

ભારત સપ્તાહરિતે ૧૫મી ગઈ હતી જોકે

લગભગમાં આવેલા સરદાર પટેલના પોસ્ટરો પર કોઈ અરેખા તત્વોએ દાગ ઠાકી કાઢી નાખતા પાટીદાર સમાજમાં રોષ વ્યાપી ગયો છે. આ કૃત્ય કરનાર સામે સખત પગલા લેવા માટે ઉચિત પરિવાર દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય કોઈ પણ સમયે અંધારાનો લાભ લઈને કોઈ તત્વો દ્વારા આ કૃત્ય આચરવામાં આવ્યું છે. જેને તાકાલીન નરવત કરવા માટે પોલીસ અધિકાર અને કલેક્ટરને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ન્યુ ગોપીનગર

વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં તમામ

પોસ્ટરો લગભગમાં આવ્યા હતા. ગઈકાલે રાષ્ટ્રીય સમયે આ પોસ્ટરો કોઈ તત્વોએ કાઢી નાખ્યા હતા. કુલ પાંચ જગ્યાએ આ પ્રકારની ઘટના પકડામાં આવી છે. જેમાં પીડીપીયુ ચાર રસ્તા પાસે આવેલ રવામ શુકનની બાજુમાં, કોમ્પ સર્વિસ રોડ પર આવેલ કે.સોહાજી ત્રણ રસ્તા બાઈકપુરાથી ચિત્તોડીથી વચ્ચે આવેલ ચેરો રેલ સ્ટેશન, સાર્વક કોર્પોરેશન ચોકડી કુલસજ તથા એઆઈઆર રોડ, સીટીપલ્સ પાસેના સ્થળો સમાવેશ થાય છે.

સરદાર પટેલ

સરદાર પટેલ અતે પતિ વચ્ચે થયેલા કસર મુજબ બાળકોની કસ્ટડી માતા પાસે છે

૨૦૧૧ જાહેરવા કેટલોમાં પદ હગાર

સુવર્ણમીન કસ્ટોર સ્કાઉટ બોર્ડમાં રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી સમાજિક કલ્યાણની યોજના અને લાઈફ સાર્વિકલ મુજબ માર્ગદર્શન અપી શેવાઓ પાસેથી ચકાસી.

ડિવોર્સી માતાના બે સગીર બાળકોના પાસપોર્ટ રિન્યુ કરી આપવા HCનો આદેશ

મમદાવાદ : છૂટાછેડા લીધેલી એક માતાને તેના બે સગીર બાળકોના પાસપોર્ટ રિન્યુ કરી આપવા પાસપોર્ટ ઓથોરિટીને ગુજરાત હાઈ કોર્ટે હુકમ કર્યો છે. જસ્ટિસ એલ.એસ. પીરઝાદાએ પ્રસ્તુત કેસમાં મહિલાના છૂટાછેડા થઈ ગયા હોઈ તેના પતિના નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટનો આગ્રહ રાખ્યા વિના બંને સગીર બાળકોના પાસપોર્ટ એક સપ્તાહમાં શક્ય એટલી ઝડપથી રિન્યુ કરી આપવા રિજિસ્ટ્રારના પાસપોર્ટ ઓફિસને હુકમ કર્યો હતો. હાઈકોર્ટે અરજદાર માતા તરફથી કરાયેલી અરજી મંજૂર રાખતા આ હુકમ કરી તેને રાહત આપી હતી. હાઈકોર્ટે એ નોંધ્યું હતું કે પાસપોર્ટ

નિયમો, ૧૯૮૦ના રોડપુલ-૨ની કલમ ૪(૩) મુજબ, એકલ માતા કે પિતા જે અલગ થયા છે, પરંતુ ઔપચારિક રીતે છૂટાછેડા લીધા નથી, તે પણ સગીરો માટે અરજી કરવા અને પાસપોર્ટ મેળવવા માટે સંમતિ આપવા માટે પાત્ર છે. ટેબીલી રીતે ભારે સાવધાની રાખીને સંતાવાળાએ સુચવ્યું છે કે પાસપોર્ટ માતા-પિતામાંથી કોઈની સંમતિ વિના અથવા કોર્ટના આદેશ વિના આપી શકાતી નથી. જોકે, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે હાલના કિસ્સામાં માતાપિતા છૂટાછેડા લીધા હતા અને કસ્ટડી અંગે તેમની વચ્ચે એક સમજૂતી કરાર પણ હતો.

ગુરુ-શુક્રવારે કેવડિયામાં સરદાર પટેલ જયંતીના કાર્યક્રમો PM મોદી આજે સાંજે ૪ વાગે વડોદરા પહોંચી રાજ્યમાં ૨૨ કલાક રોકાશે

પીએમના હસ્તે ૧,૨૧૯ કરોડના વિવિધ પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન-ખાતમુહૂર્ત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવનીકાલ ગુરુવાર અને શુક્રવાર એમ બે દિવસ માટે કેવડિયા ખાતે દર વર્ષે પરંપરાગત સરદાર પટેલ જયંતીના ઉપલક્ષ્યમાં થતી એકતા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેવા ગુજરાત આવશે. બે દિવસ દરમિયાન તેઓ લગભગ ૨૨ કલાક રોકાણ કરશે. તેઓ ગુરુવારે સાંજે ચારેક વાગે વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે આવી સાંઘ પાંચ વાગે રેલિફોર્ટર મારકેટ કેવડિયા પહોંચશે. રાતવાસો બાદ તેઓ ૩૧મીએ કાર્યક્રમ પતાવી બપોરે ૧૨ વાગે આવ્યા હતા તે જ રીતે વડોદરા જવા રવાના થઈ, ત્યાંથી દિલ્લી પરત જશે. આ વખતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ૧૫૦મી જન્મજયંતીની ઉજવણી થઈ રહી હોઈ વડાપ્રધાન ગુરુવારે સાંજે કેવડિયાના એકનાનગર ખાતે યોજનારા જાહેર કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. જ્યાંથી તેઓ ૩.૧૨.૧૯ કરોડના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન તથા

ખાતમુહૂર્ત કરશે, જેમાં આગાહી સમયે ભારતમાં ભળનારા રાજ્યીઓના યોગદાન અંગે ૩.૨૬૦ કરોડના ખર્ચે સર્જનારા મ્યુઝિયમનું ખાતમુહૂર્ત, આદિવાસીઓના ભગવાન મનાતા બિરસા મુંડાના મનાઈ ૩.૩૦૩ કરોડના ખર્ચે બનેલા નવા ભવનનું ઉદ્ઘાટન, ઈ.બસોને લીલીડેડી જેવા પ્રોજેક્ટસ સામેલ હશે.

શુક્રવારે વડાપ્રધાન સરદારની પ્રતિમાને પુષ્પાર્ચણ બાદ પ્રજાસત્તાક દિનની પેટન ઉપર વિવિધ ટેબ્લોના પ્રદર્શન સાથે યોજનારી પરંદ નિશાળશે. આ પરંદમાં બી.એસ.એક, સીઆઈએસ.એક, આઈટીમીપી, સીઆરપીએક, એસએસબી, પંજાબ, જમ્મુ-કાશ્મીર, આસામ, ત્રિપુરા, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને એનરીસી સમીને ૧૬ કન્ટ્રિજન્ટસ ભાગ લેશે. દર વર્ષની માફક આ વર્ષે કેવડિયા ખાતે ૬૬૦ જેટલા તાલીમાર્થી સિવિલ સર્વેન્સને વડાપ્રધાન સંબોધન કરશે. ત્યારબાદ તેઓ દિલ્લી જવા રવાના થશે.

₹ 3,99,000ની તેજસ્વી રિસા
હવે ફક્ત **₹ 2,59,000** માં

DLX	TEJASWEE
વિવિધ રંગો સી ડિલિવરી 150 KM ની ડેન્ડ	વિવિધ રંગો સી ડિલિવરી 150 km ની યુરેન્ગ

3570703030



ગુજરાત

બાંગ વાદળો છતાં

૫૬ દિવસ દરમિયાન

૨ વરસાદ વરસ્યો

અમદાવાદ, ગુરુવાર

પ્રેશનની અસરના કારણે ગુરુવારે સવારથી જ શહેરના આકાશમાં છવાયેલા કાળા ડીબાંગ વાદળોને કારણે થી આશા ઠગારી નિવડી હતી.

૨૪ વરસાદ ઉપરાંત માં પણ ઘટાડો થયો

એ વરસાદ હતો. પરંતુ નોંધપાત્ર કહી શકાય એવો લીટીમાં વરસાદ રાત સુધી નોંધાયો નહોતો. ચાંદબેડા અને બોડકદેવ વોર્ડમાં ૮ કલાક ૭-૭ મિલિમીટર વરસાદ નોંધાયો

૨૬૪૪ ક્યુસેક પાણી છોડાયું

સાનરમતી નદીમાં ૧૬૪૪ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. અસરગ્રસ્ત ગામોમાં સલામતીના યોગ્ય પગલાં હાથ ધરવામાં આવ્યાં છે. રાત્રી ૮ કલાકે વાસણા બેરેજ ખાતે પાણીનું લેવલ ૧૩૬૨ ક્યુસેક પાણીનો ઈનફ્લો બુસેક પાણીનો આઉટફ્લો નોંધાયો હતો. બેરેજના બે

વરસાદ	હતો. ઓગસ્ટમાં ૧૨ મિલિમીટર વરસાદ
૬૦ ઈંચ	વરસ્યો હતો. હંસપુરા વિસ્તારમાં ૧૧ મિલિમીટર, કોતરપુરમાં ૧૦ જુનારે નરોડામાં ૮ મિલિમીટર વરસાદ પડ્યો
શહેરમાં	હતો. દિવસભર સારા વરસાદની સાથે જોઈ રહેલા શહેરજીનોને માત્ર હળવા વરસાદથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો.

ના સ્ટિકર' લગાવવામાં વિવાદ

દ્વારા રિક્ષાઓનો ડેટા

પોલીસ સ્ટીકર વેચે છે

અમદાવાદ, ગુરુવાર

શહેરના જે-તે પોલીસ સ્ટેશનમાં ઓટો રિક્ષાનું પાયામાં આવે તેવો આદેશ પોલીસ કમિશનરે કર્યો છે. પાયામાં એવી આલોપાત્રક રજૂઆત કરી છે કે, ખાનગી પોલીસે મેળવ્યો છે અને હવે પોલીસ પાંચી ૧૦૦ રૂપિયા

આદેશ મુજબના સ્ટિકર દીઠ

પોલીસ વસૂલતી હોવાની રજૂઆત

રિક્ષામાં	એકતા પુનિયન-૮૫, ઓટો ડ્રાઈવર
ન કરાવ્યું	એકતા સમિતિ અને નવયુગ ઓટો ડ્રાઈવર
આદેશ સામે	વેલફેર એસોસિએશને પોલીસ કમિશનરને
કમિશનર	સંબોધીને રજૂ કરેલી વાંધા અરજીમાં
છે. જાગૃત	જણાવાયું છે કે, અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ
એ સ્ટેશન	દ્વારા ખાનગી કંપનીના કહેવાથી ફક્ત
આચારલક	(અનુસંધાન ઝથે પાને)

એ જાતે શેર કરો તમારી

કમોસમી વરસાદ નહીં અટકતાં ખેડૂતો બેહાલ

ગુજરાતમાં ઓક્ટોબરમાં જ ૩.૩૦ ઈંચ

વરસાદ, છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં સૌથી વધુ

અમદાવાદ, ગુરુવાર

અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા ડિપ્રેશનથી ગુજરાતમાં માવઠાનો દોર જારી રહ્યો છે અને તેનાથી ખેડૂતો માટે પડતા પર પાટુ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આજે ગુજરાતના ૧૮૮ તાલુકામાં માવઠું

પડ્યું હતું, જેમાં ભાવનગરના મહુવામાં સૌથી વધુ ૩.૨૫ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ આગામી ૩ દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતના ૧૮૮ તાલુકામાં માવઠું, ભાવનગરના મહુવામાં સૌથી વધુ ૩ ઈંચ : હજુ ૩ દિવસ વરસાદ માટે એલર્ટ

આજે ૩૫ તાલુકામાં ૧ ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. જેમાં ભરૂચના હાંસોટમાં ૨.૭૫, ભાવનગરના

ગાંધીનગરમાં ૨.૧૦ ઈંચ સાથે સૌથી વધુ વરસાદનો સમાવેશ થાય છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર હજુ આગામી ૩ દિવસ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે.

બન્યું હતું. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબર માસમાં સરેરાશ ૨ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. ગુજરાતમાં હજુ સુધી સિંચાણનો ૧૨૫

ગુજરાતમાં ઓક્ટોબરમાં નોંધાયેલો વરસાદ

વર્ષ	ઈંચમાં
૨૦૨૫	૩.૩૦
૨૦૨૪	૨.૦૦
૨૦૨૩	૦.૦૭
૨૦૨૨	૧.૧૧
૨૦૨૧	૦.૬૩
૨૦૨૦	૦.૭૨
૨૦૧૯	૨.૩૮
૨૦૧૮	૦.૦૩
૨૦૧૭	૦.૪૭
૨૦૧૬	૨.૯૧

તળાજામાં ૨.૬૦, ડાંગના સુભિરમાં ૨.૫૦, સુરતના મહુવામાં ૨.૩૫,

જેમાં આવતીકાલે વડોદરા-છોટા ઉદે પુર-નર્મદા-ભરૂચ-સુરત-ડાંગ-નવસારી-વલસાડ-તાપી-દમણ-દાદરા નગર હવેલી-જુનાગઢ-અમરેલી-ભાવનગર-ગીર સીમનાંથમાં જ્યારે શનિવારે ભરૂચ-સુરત-અમરેલી-ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ માટે પલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય અન્યત્ર હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડે તેવી સંભાવના છે. ગુજરાતમાં આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં જ સરેરાશ ૩.૩૦ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયેલો છે. છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં ઓક્ટોબરમાં નોંધાયેલો આ સૌથી વધુ વરસાદ છે. અગાઉ છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં ૧ ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હોય તેવું ૨૦૧૬, ૨૦૨૨ અને ૨૦૨૪ના વર્ષમાં

ગુરુવારે ક્યાં વધારે વરસાદ?

તાલુકો	જિલ્લો	ઈંચમાં
મહુવા	ભાવનગર	૩.૨૫
હાંસોટ	ભરૂચ	૨.૭૫
તલાજા	ભાવનગર	૨.૫૬
સુભિર	ડાંગ	૨.૩૫
મહુવા	સુરત	૨.૨૦
ગાંધીનગર	ગાંધીનગર	૨.૧૦
કલોલ	ગાંધીનગર	૧.૭૫
કડી	મહેસાણા	૧.૬૫
તલોદ	સાબરકાંઠા	૧.૬૫
દહેગામ	ગાંધીનગર	૧.૫૫

ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં કચ્છમાં સૌથી વધુ ૧૫૦ ટકા, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૧૩૧ ટકા જેટલો વરસાદ નોંધાયેલો છે.

સરકારના મૌખિક આદેશ અને પરિપત્રને લઈને વિસંગતતા

પાક નુકસાનીના સર્વે મામલે

સરકારનું જુદાણું, ખેડૂતો ભડક્યા

અમદાવાદ, ગુરુવાર

ગુજરાતમાં માવઠાએ ખેડૂતોને આર્થિક રીતે તબાહ કર્યા છે. દરેક લાખથી વધુ હેક્ટરમાં ખેતીને નુકસાન પહોંચ્યું છે. પાક લક્ષ્યાંકના સમયે જ કમોસમી વરસાદે ઉભા પાકનો સફાઈ કર્યો છે. આ સંજોગોમાં ખેડૂતો પાસે કશું જ બચ્યું ન હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

બીજી તરફ, આ દુખની ઘડીમાં ય સરકારે ખેડૂતોને ઉઠા ભણાવવા પ્રયાસ કર્યો છે કેમકે, કૃષિમંત્રીએ મોટાઉપાડે જાહેરાત કરી કે, સાત દિવસમાં જ પાક નુકસાનીનો સર્વે થઈ જશે જ્યારે કૃષિ વિભાગે પરિપત્ર ઘડી સૂચના આપી કે, ૨૦ દિવસમાં નુકસાનીનો સર્વે પૂર્ણ કરો. હવે સાચું કોનું માનવું એ સવાલ સર્જાયો છે.

કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું, સાત જ દિવસમાં સર્વે થઈ જશે,

કૃષિ વિભાગે પરિપત્ર કર્યો, ૨૦ દિવસમાં સર્વે પૂર્ણ કરો

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે તબાહી

નુકસાનીનો સર્વે ન થાય ત્યાં સુધી ખેડૂતોને

નુકસાનીનો સર્વે થઈ જશે તેવું એલાન કર્યું

મચાવી છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિતના


કેટલાં વળતર આપવું તે નક્કી થઈ શકે

છે. પણ કૃષિ વિભાગે પરિપત્ર કરી





Oct 31, 2025 9:30:15 AM
Road Bavla Road
Bavla
Gujarat

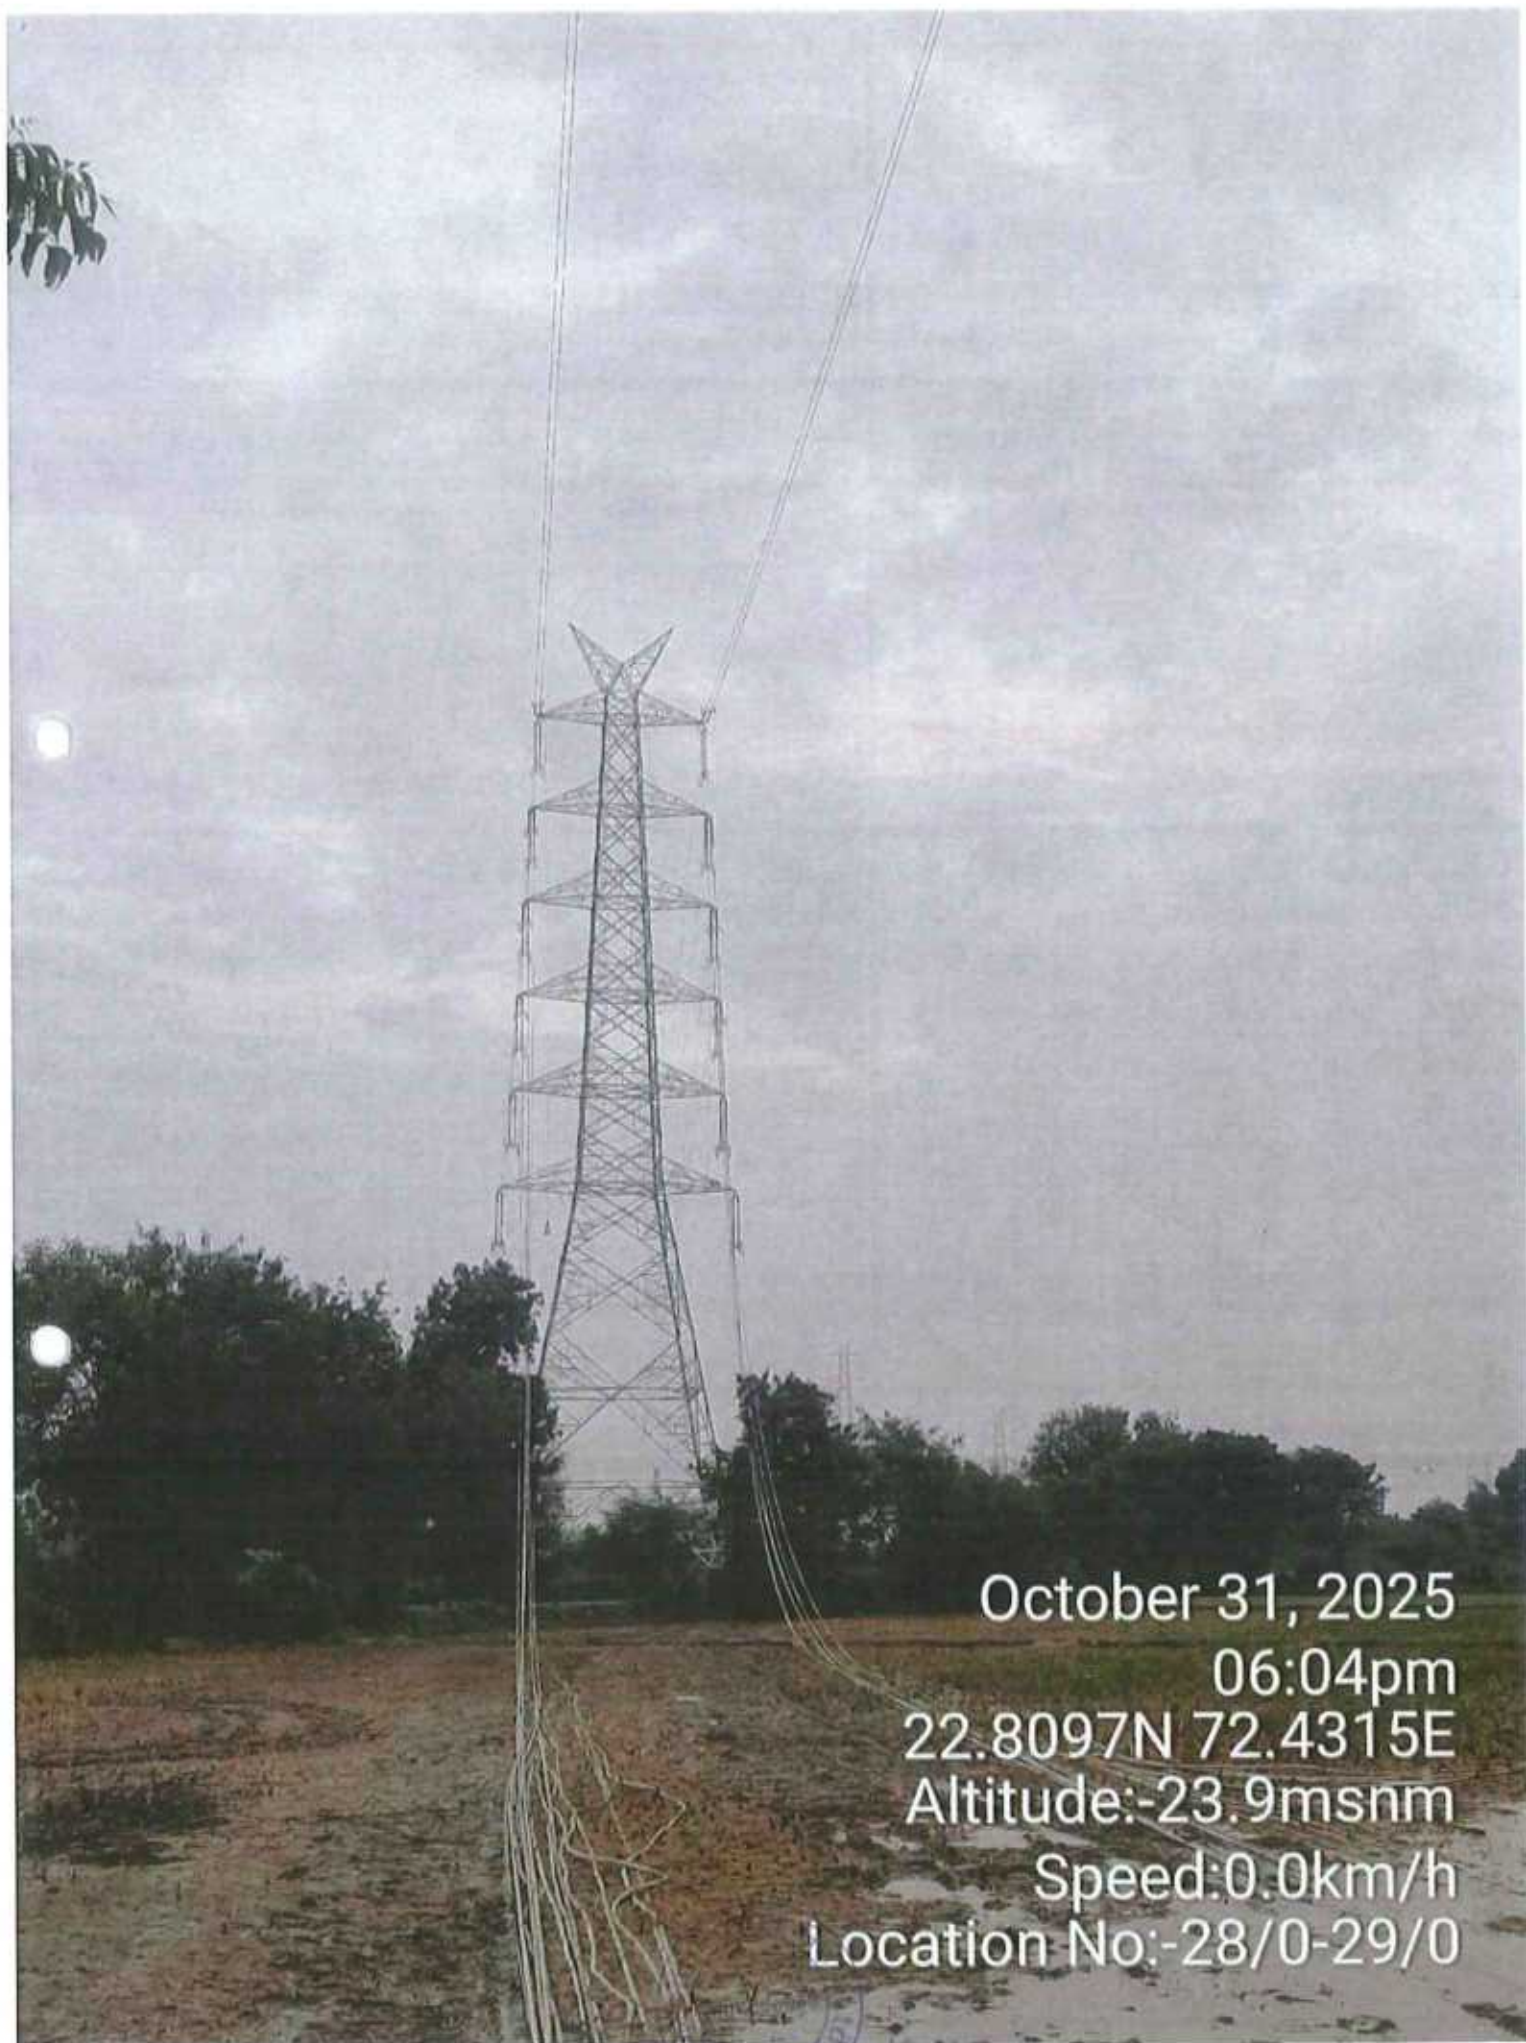

October 31, 2025

06:04pm

22.8097N 72.4315E

Altitude:-23.9msnm


Speed:0.0km/h

Location No:-28/0-29/0

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲਿਦਾਸ

[illegible]

બી.	રજિસ્ટ્રેશન
લેખામોર	૩૫૫૯
જર્જન શેર્ડ	૧૩૫૯
સિલ્કબ	૧૨૮૭
ગોહન ટીપ્પીવર	૧૨૩૦
પોસ્ટીયન	૯૮૮
બીગલ	૭૦૫
સાઈમોનીયન હરફી	૪૧૪
રોટલિસર	૩૨૬
પગ	૩૬૩
અન્ય	૬૫૪



JYOTI STRUCTURES LIMITED
— SINCE 1974 —



01-Nov-2025 10:04:46

83° E

Juval Rupavati

Gujarat

Altitude:-25.0msnm

Speed:0.0km/h

loc no 33/0

Index number: 1339












02-Nov-2025 10:47:23 am
Chhabasari
Gujarat
47/0"





JYOTI STRUCTURES LIMITED
SINCE 1974



3 Nov 2025 9:52:03 am
22.93015853N 72.21221815E
149° SE
Altitude: -22.1msnm
Speed: 0.0km/h
Index number: 584

Google





TPGL/ISTS Part-D/CTUIL/2024/... 038
Oct 16th, 2024

To,
The Chief Operating Officer,
Central Transmission Utility of India Ltd.,
1st Floor, "Saudamini", Plot No.: 02,
Sector-29, Gurugram (Gurgaon),
Haryana – 122 011.
Email: pcgarg@powergrid.in

Subject: Information Regarding Transmission Line Construction work affected due to strike of Aggregate suppliers in Gujarat (**Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II, Part D**).

Dear Sir,

We would like to bring to your attention that the ongoing construction work for the 400 kV M/C - LILO of Pirana (P) – Pirana (T) 400kV D/c line" (TPGL) under the Transmission Scheme for Khavda PS under Phase-II, Part-D has been significantly affected as **Quarries and Mines Association in Gujarat have gone on an indefinite strike from 02nd October 2024**. This strike has caused a disruption in the supply of crucial materials, specifically aggregates, which are essential for the construction activities of the transmission line.

The lack of available materials has resulted in delays in the above project's progress, and despite our best efforts to source materials from alternative suppliers, the ongoing strike has severely hampered the availability of the required aggregates across the region.

The Gujarat Government is actively monitoring the situation and maintaining continuous communication with key stakeholders to resolve the issue as swiftly as possible. However, if the strike persists, it may result in further delays to the project's scheduled completion.

We request your understanding of the situation and will keep you updated on any further developments. We are also taking steps to minimize delays and mitigate the impact on the project's overall timeline.

Thank you for your attention to this request.

Yours faithfully,

For Torrent Power Grid Limited,

Pramod Patel
TPGL-Director



CC: 1) O/o The Chief Engineer,
Power System Planning & Appraisal-I (PSPA-I) Division, Central Electricity Authority,

o/c
Encloser : News Paper Cutting

Printed from

THE TIMES OF INDIA

Quarry strike continues: Construction activities affected

Oct 14, 2024, 10.00 PM IST

Ahmedabad: The ongoing statewide quarry strike continues after no solution emerged from a meeting between the quarry association and the state govt on Monday. Quarry operators across the state have been on strike since Oct 1, affecting construction activities, with most projects at the foundation and structure level halted.

Hitendra Upadhyay, the president of the Gujarat Black Stone Quarry Association, said, "The state govt is not providing environmental clearance (EC) to quarries. There are around 2,000 quarry plants across the state, and around 70% are shut because they did not get EC due to a lack of coordination between various departments of the state govt. In Kutch alone, the state govt has shut around 245 plants out of approximately 250. We held a meeting with the mines department on Monday, but the dispute could not be resolved because there is no clarity about EC. We have decided to continue the strike."

Rajesh Vaswani, the director of CREDAI Gujarat, said, "The ongoing quarry strike has affected the construction industry significantly in the last few days. Ready mix concrete (RMC) plants at most construction sites are shut. This is delaying the construction work."

Taral Shah, MD of a leading construction company, said, "The quarry strike has affected construction activities ahead of the crucial Diwali season because workers will leave the city in a few days to go to their native places before Diwali. Most construction projects are stopped where concrete is needed. Those projects at the foundation and structure levels have seen the maximum impact of the quarry strike."

Sources said that the ongoing strike will also affect road resurfacing work after monsoon.



Government of India
Central Electricity Authority
Regional Inspectorial Organisation
 Ground Floor, WRPC Building, F-3, MIDC Area
 Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093

No. WRIO/Guj/B-02046/2026

Dated: 27/01/2026

To,
M/s Torrent Power Grid Ltd
Torrent Power Limited Naranpura
Zonal Office | Naranpura | Ahmedabad - 380013

Approval for Energization

Subject: - Inspection of LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmed S/s with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO of M/s Torrent Power Ltd under regulation 45 of CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023.

Reference: 1) Application No. B/2026/02046, Dated: 08/01/2026.

2) Inspection report of this office Dated 22/01/2026.

3) Compliance received on 23/01/2026.

Whereas the inspection of LILO of Pirana (PG) - Pirana (T) 400 kV D/c line at Ahmed S/s with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG) - Pirana (T) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main line and LILO of **M/s Torrent Power Ltd** was carried out on **20th Jan., 2026** by the undersigned.

Approval for Energization of above said Transmission Line work is hereby accorded subject to following conditions:

- 1. M/s Torrent Power Grid Ltd** ensure to have all other requisite clearances/NOCs from authorities such as CEA for prior approval, Air Headquarters, Defense Authorities, Civil Aviation, SEB for Power line crossing, National Highways, State Highways Authorities, Forest, Navigation Authorities, PTCC Clearance, Railways, or any other local authority, as applicable, before energization.
- 2. M/s Torrent Power Grid Ltd** shall have ratification by the Committee constituted by Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to Great Indian Bustard (GIB) for the modification of this transmission line, if applicable, before energization.
- 3. M/s Torrent Power Grid Ltd** shall ensure that the general public through Local authorities like Village Heads/ Panchayats/ Municipal Council/ Municipal Corporation/Police Stations/BDO/Tehsil and District Magistrate/Police Commissioner etc have been intimated about the energization schedule of line and prior information about the energization schedule of the line has been provided to the general public through distribution of handbills/publication in newspapers/other suitable media in local language of state and English and drum beating etc.
- 4. Adherence to relevant provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2023 shall be ensured by M/s Torrent Power Grid Ltd for safety during operation and maintenance.**

The periodic inspections may be carried out at an interval 5 years from the date of last inspection. The application shall be filed by the applicant at least 6 months in

advance so that compliance and final approval is granted on time. This periodicity is subject to change by Govt order/notification.

356

Digitally signed by
Saurabh Parth Sarthi
Date: 27-01-2026
18:36:07

Saurabh Parth Sarthi)
Assistant
Director

(For Chief Electrical Inspector
to the Government of India)

Email: riowestcea@gov.in

Mob. No.: 8448521795

Copy to: Chief Engineer (EI), CEA, Sewa Bhavan, New Delhi.

Annexure P-13 Colly

From: AHMEDABAD CONTROL CENTRE
Sent: Wednesday, February 4, 2026 12:28
To: WRLDC Outage
Cc: PRASANTA KUMAR MAHALIK; Vijay Kumar Kodali (विजय कुमार कोडली); Pramod Patel; Rajnikumar Prajapati / Transmission-TPGL / Ahmedabad; VINODBHAI PRAJAPATI / O&M / Ahmedabad; Dipak Prajapati / O&M / Ahmedabad; Vimalkumar Gosaliya / O&M / Ahmedabad; Omprakash Saxena / O&M / Ahmedabad; rtamcwr2; JE-MIS; oasldc; emisldc.getco; WRLDC Reliability; RTAMC WR2 <rtamcwr2@gmail.com> (rtamcwr2@gmail.com); Operation WRPC; Bhavik Shah / Power Mgmt & Scheduling / Ahmedabad; WRPC OP (opc-wrpc@nic.in)
Subject: OCC & Post OCC Outage request

Dear Sir,

As discussed, please find below details of shutdown requirement and A/R out to complete the LILO project of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line at 765kV Ahmedabad S/S.

1. **Conductor stringing, Testing, and commissioning**
 - 400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-1 from 10.02.2026 08:00hrs. to 11.02.2026 20:00hrs. (Continuous basis)
 - 400KV-SUGEN-PIRANA-T-2 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-2 from 12.02.2026 08:00hrs. to 13.02.2026 20:00hrs. (Continuous basis)
2. **Replacement of Earth wire by OPGW**
 - A/R Out 400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-1 from 07.02.2026 08:00hrs. to 10.02.2026 18:00hrs (Daily basis)

Web portal screen shot of OCC and post OCC outage requests as under for your kind reference.

OCC No	Name of Requesting Agency	Element Name	Owner	C/D	Reason	Approved shutdown Date Range	Remarks	Status	Is deferred by control room	Control room comments
OCC_599	TPL	400KV-SUGEN-PIRANA-T-2	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-2 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	12-02-2026 08:00 - 13-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously	Approved		
OCC_599	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-2	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-2 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	12-02-2026 08:00 - 13-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously	Approved		
OCC_599	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-1 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	10-02-2026 08:00 - 11-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously	Approved		
OCC_599	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-1 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	10-02-2026 08:00 - 11-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously	Approved		

OCC NO	Requester	Element Name	Owner	C / D	Reason	Shut Down Range	Req Remarks	Outage Status	Type	Tag
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL, TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	10-02-2026 08:00 - 10-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL, POWERGRID-WR2 (PGCIL), TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	10-02-2026 08:00 - 10-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL, TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	09-02-2026 08:00 - 09-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL, POWERGRID-WR2 (PGCIL), TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	09-02-2026 08:00 - 09-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL, TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	08-02-2026 08:00 - 08-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL, POWERGRID-WR2 (PGCIL), TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	08-02-2026 08:00 - 08-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL, TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	07-02-2026 08:00 - 07-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL, POWERGRID-WR2 (PGCIL), TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	07-02-2026 08:00 - 07-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	

You are kindly requested to consider and approve above requests for the completion of LILO project.

Thanking You,

Regards,

Vimal Gosaliya

EHV Control Room

Shift Incharge | EHV | AMDIST

M: +91-9227250698/7096037033/34,

Naranpura Zonal Office |Sola Road| Ahmedabad - 380013

E Mail: amdcc@torrentpower.com



www.torrentpower.com

From: AHMEDABAD CONTROL CENTRE

Sent: Tuesday, February 3, 2026 4:54 PM

To: Operation WRPC <opcwrpc@gmail.com>; WRPC OP (opc-wrpc@nic.in) <opc-wrpc@nic.in>; WRLDC Outage <wrldcoutage@grid-india.in>; wrldc_outage posoco (wrldcoutage@gmail.com) <wrldcoutage@gmail.com>

Cc: jemisldc.getco <jemisldc.getco@gebmail.com>; demissldc.getco@gmail.com; OUTAGE SLDC (oasldc.getco@gebmail.com) <oasldc.getco@gebmail.com>; MIS SECTION SLDC <emisldc.getco@gebmail.com>; DE MIS SLDC BMS <sldcdemis.getco@gebmail.com>; WRLDC Reliability <wrlcreliability@grid-india.in>; VINODBHAI PRAJAPATI / O&M / Ahmedabad <vinodprajapati@torrentpower.com>; Ronak Thakkar / O&M / Ahmedabad <ronakthakkar@torrentpower.com>; Vimalkumar Gosaliya / O&M / Ahmedabad <vimalgosaliya@TORRENTPOWER.COM>; Rajnikumar Prajapati / Transmission-TPGL / Ahmedabad <rajnikprajapati@torrentpower.com>; Omprakash Saxena / O&M / Ahmedabad <OMPRAKASHSAXENA@torrentpower.com>; Pravin Dudhat / Supply Point / Dholera <pravindudhat@torrentpower.com>; ABT / TORRENTPOWER / AHMEDABAD <abt@TORRENTPOWER.COM>; PRASANTA KUMAR MAHALIK <PRASANTAKUMARMAHALIK@TORRENTPOWER.COM>; Pramod Patel <pramodpatel@TORRENTPOWER.COM>; Milindkumar Modi <milindmodi@torrentpower.com>

Subject: Post OCC requests for A/R out of 400kV Pirana-UNOSUGEN-1 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-1 lines

Dear Sir,

We have created post OCC requests of A/R out of 400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1 and 400KV-PIRANA-T-PIRANA-1 for **replacement work of Earth wire By OPGW** from 400 kV Pirana (PGCIL) S/S to 400kV Pirana (Torrent) S/S as under.

OCC NO	Requester	Element Name	Owner	C / D	Reason	Shut Down Range	Req Remarks	Outage Status	Type	Tag
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	10-02-2026 08:00 - 10-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	10-02-2026 08:00 - 10-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	09-02-2026 08:00 - 09-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	09-02-2026 08:00 - 09-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	08-02-2026 08:00 - 08-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	08-02-2026 08:00 - 08-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	07-02-2026 08:00 - 07-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	
PNOCC	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	D	Replacement of Earth wire By OPGW	07-02-2026 08:00 - 07-02-2026 18:00	A/R Out of Both Lines, on Same 400kV M/C Tower on Same side, A/R out required simultaneously	Requested	PNOCC	

You are requested to consider and approve for the same.

Vinod Prajapati

EHV Control Room

Shift Incharge | EHV | AMDIST

M: +91-9227250698/7096037033/34,

Naranpura Zonal Office |Sola Road| Ahmedabad - 380013

E Mail: amdcc@torrentpower.com



www.torrentpower.com

Annexure P-14

From: WRLDC Reliability <wrlcreliability@grid-india.in>
Sent: Monday, February 9, 2026 18:19
To: NLDC Outage Coordination; scetaps12@gmail.com; scr.mel@adani.com; manza.ss@powericaltd.com; rajeshkumar.t@rkm.in; aepl.nanavalka220kv@alfanar.com; parvati1301@gmail.com; baranda.substation@suzlon.com; jemislde.getco@gebmil.com; oasldc.getco@gmail.com; bms.0072@gmail.com; mistrygj72@gmail.com; bhuvad.substation@renewpower.in; scesipat; Ostro.kutch@renewpower.in; SKRPL.Chugger@edf-re.in; avc.dayapar; controlroom@rkm.in; wr1rtamc@powergrid.in; rtamcwr2@powergrid.in; khakharda.controlroom@apraava.com; WRLDC Outage Group; Dedhia.220kvPSS@adani.com; nwpl.kotdamadh220kv@alfanar.com; slde.opn@mptransco.nic.in; emisldc.getco; narendra@nhptl.com; bkhandelwal@npcil.co.in; NLDC Outage Coordination; WRLDC Outage Group; Sugan Operations / Torrent Power SUGEN; om.pritamnagar@adani.com; Saurabh.sharma@adani.com; 400kvswitchyard@trnenergy.com; pss1.khavda@adani.com; pss2.khavda@adani.com; pss3.khavda@adani.com; Electrical.jpl@jhabuapower.co.in; Shiftincharge.jpl@jhabuapower.co.in; sldcmpjbp; dilsce@rpsg.in; 400kv_hazira_cr1@amns.in; naranparpss.giwel; controlroom@rkm.in; dbpl.swyd; scheduling.raigarh; AHMEDABAD CONTROL CENTRE; konhalli.pss4@renew.com; Jemislde.getco@gmail.com; Sldcdemisldc.getco@gebmil.com; demissldc.getco@gebmil.com; jgcturs1.controlroom@zmail.ril.com; 400kvswitchyard; Controlroom.Badwar@seit.co.in; sanjeev.pal@jsw.in; Shiftincharge.jpl@jhabuapower.co.in; Pachora; ashishkumarshukla@ntpc.co.in; VEL.Switchyard@vedanta.co.in; msldc_cr@mahasldc.in
Cc: Mahesh M. Mehendale (महेश एम. मेहंदले); ED WRLDC; T R Mohapatra (टी आर मोहापात्रा); S S Raghuwanshi (एस एस रघुवंशी); WRLDC FTC Grid Element; WRLDC SCADA; WRLDC Protection; Madhukar Goodelli (मधुकर गूदेल्ली); Akhil Gupta (अखिल गुप्ता); M K Thakur (एम के ठाकुर); Minnakuri Venkateswara Rao (मिन्नाकुरी वेंकटेश्वर राव); Kollabathula Suresh Kumar (कोलाबाथुला सुरेश कुमार); Naresh Kumar Mhalas (नरेश कुमार म्हालस); WRLDC Outage; Naga Suresh Movva (नागा सुरेश मोव्वा); T Muthukumar (टी मुथुकुमार); Vijay Kumar Kodali (विजय कुमार कोडली); Suresh Chandra Bachkheti; SHIVENDRA YADAV; Rahul Shukla (राहुल शुक्ला)
Subject: RC-1 of 10 February 2026 के लिए पश्चिम क्षेत्रिय भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा दी गयी रेलियाबिलिटी सहमति
Attachments: WRLDC_10 Feb_2026_RC-1.xlsx

[External : Treat content with extra caution.]

Sir,

Please find attached RC-1 of 10 February 2026.

सादर धन्यवाद / Thanks & Regards,

रेलियाबिलिटी टीम / Reliability Team

प.क्षे.भा.प्रे.के., मुंबई / WRLDC, Mumbai

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड / Grid Controller of India Limited



उत्कृष्टता और विश्वसनीयता के साथ भारतीय विद्युत प्रणाली का संचालन।

From: WRLDC Reliability

Sent: 08 February 2026 13:11

To: NLDC Outage Coordination; scetaps12@gmail.com; scr.mel@adani.com; manza.ss@powericaltd.com; rajeshkumar.t@rkm.in; aepl.nanavalka220kv@alfanar.com; parvati1301@gmail.com; baranda.substation@suzlon.com; jemisldc.getco@gebmil.com; oasldc.getco@gmail.com; bms.0072@gmail.com; mistrygj72@gmail.com; bhuvad.substation@renewpower.in; scesipat; Ostro.kutch@renewpower.in; SKRPL.Chugger@edf-re.in; avc.dayapar; controlroom@rkm.in; wr1rtamc@powergrid.in; rtamcwr2@powergrid.in; khakharda.controlroom@apraava.com; WRLDC Outage Group; Dedhia.220kvPSS@adani.com; nwpk.kotdamadh220kv@alfanar.com; sldc.opn@mptransco.nic.in; emisldc.getco@gebmil.com; narendra@nhptl.com; bkhandelwal@npcil.co.in; NLDC Outage Coordination; WRLDC Outage Group; sugenoperations@torrentpower.com; om.pritamnagar@adani.com; Saurabh.sharma@adani.com; 400kvswitchyard@trnenergy.com; pss1.khavda@adani.com; pss2.khavda@adani.com; pss3.khavda@adani.com; Electrical.jpl@jhabuapower.co.in; Shiftincharge.jpl@jhabuapower.co.in; sldcmpjbp; dilsce@rpsg.in; 400kv_hazira_cr1@amns.in; naranparpss.giwel; controlroom@rkm.in; dbpl.swyd; scheduling.raigarh; amdcc@torrentpower.com; konhalli.pss4@renew.com; Jemisldc.getco@gmail.com; Sldcdemisldc.getco@gebmil.com; demissldc.getco@gebmil.com; jgcturs1.controlroom@zmail.ril.com; 400kvswitchyard; Controlroom.Badwar@seit.co.in; sanjeev.pal@jsw.in; Shiftincharge.jpl@jhabuapower.co.in; Pachora; ashishkumarshukla@ntpc.co.in; VEL.Switchyard@vedanta.co.in; msldc_cr@mahasldc.in

Cc: Mahesh M. Mehendale (महेश एम. मेहंदले); ED WRLDC; T R Mohapatra (टी आर मोहापात्रा); S S Raghuwanshi (एस एस रघुवंशी); WRLDC FTC Grid Element; WRLDC SCADA; WRLDC Protection; Madhukar Goodelli (मधुकर गूदेल्ली); Akhil Gupta (अखिल गुप्ता); M K Thakur (एम के ठाकुर); Minnakuri Venkateswara Rao (मिन्नाकुरी वेंकटेश्वर राव); Kollabathula Suresh Kumar (कोलाबाथुला सुरेश कुमार); Naresh Kumar Mhalas (नरेश कुमार म्हालस); WRLDC Outage; Naga Suresh Movva (नागा सुरेश मोव्वा); T Muthukumar (टी मुथुकुमार); Vijay Kumar Kodali (विजय कुमार कोडली); Suresh Chandra Bachkheti; SHIVENDRA YADAV; Rahul Shukla (राहुल शुक्ला)

Subject: 10 February 2026 के लिए पश्चिम क्षेत्रिय भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा दी गयी रेलियाबिलिटी सहमति

Sir,

कृपया 10 Feb 2026 के पश्चिम क्षेत्रिय भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा दी गयी रेलियाबिलिटी सहमति की प्रति प्राप्त करें। Kindly find the enclosed Reliability consent file for 10 Feb 2026

महत्वपूर्ण पारेषण औटेजेस- Important Transmission Outages

1. 400KV-KAKRAPAR 3&4-VAPI-II-1

टिप्पणी/Remarks-

- सभी उपयोगिताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अनुलग्नक में रेलियाबिलिटी की सहमति फ़ाइल में दी गयी रेलियाबिलिटी टिप्पणी की जांच करें और उस पर नज़र रखें। किसी भी मुद्दे को दिन -2 में सूचित किया जाए। All utilities are requested to check reliability consent file attached with reliability remark and adhere to that. If any issues same shall be informed in Day-2.
- सभी उपयोगिताओं से अनुरोध है कि वे D-3 में आउटेज के पुनर्निर्धारण के बारे में बताएं, अन्यथा इसका पुनर्निर्धारण नहीं किया जाएगा। All utilities are requested to convey rescheduling of outages in D-3 otherwise same will not be rescheduled.
- सभी पीएमयू कनेक्शन से संबंधित आउटेज, संबंधित RPC से सहमति के साथ D-3 में प्रस्तावित करें। All PMU connection wiring works related outages to be proposed in D-3, with consent from respective concerned RPC.
- सभी योजनाबद्ध लंबे आउटेज (2 दिन से अधिक या उससे अधिक के बराबर) को कृपया OCC में अनुमोदित उसी तारीख पर लें। All

planned long outages (More than or equal to 2 days) may please be availed on same dates as approved in the OCC.

5. वास्तविक समय में पं. क्षेत्रों के नियंत्रण कक्ष द्वारा संबंधित विद्युत उपकरणों से टेलीमेट्री की उपलब्धता होने पर ही आउटेज कोड जारी किया जाएगा। Outage code shall be issued by WRLDC subject to telemetry availability from the station in real time.

6. सभी संरक्षण संबंधित आउटेज को, सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ जो कि महत्वपूर्ण ग्रिड तत्वों की सूची में उल्लिखित है, जो WRLDC की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। D-3 में outage software अपडेट करें। All Protection related outages to be updated in outage portal in D-3 with all relevant details which are mentioned in List of Important Grid elements which is available in WRLDC website.

7. सभी उपयोगिताओं से अनुरोध है कि यदि कोई आउटेज 2 या अधिक दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो आउटेज के विस्तार के संबंध में WRPC की मंजूरी ली जाए और WRLDC को भी सूचित किया जाए। All utilities are requested If any outage is extended for 2 or more Days then WRPC approval to be taken regarding extension of outage and also WRLDC to be informed

8. सभी संबंधित उपयोगिताओं से अनुरोध है कि कृपया संबंधित दस्तावेज एवं आकस्मिक योजना का विवरण डी में उपलब्ध कराएं। All the utilities to submit necessary documents/contingency plans to under review outages before 10:00 hrs of tomorrow else treated as deemed rejected.

Regards
Shivendra

सादर धन्यवाद / Thanks & Regards,
रेलियाबिलिटी टीम / Reliability Team
प.क्षे.भा.प्रे.कें, मुंबई / WRLDC, Mumbai
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड / Grid Controller of India Limited



उत्कृष्टता और विश्वसनीयता के साथ भारतीय विद्युत प्रणाली का संचालन।

Follow Grid-India on:



* This e-mail is an official email of Grid Controller of India Limited (Grid-India), is confidential and intended to use by the addressee only. If the message is received by anyone other than the addressee, please return the message to the sender by replying to it and then delete the message from your computer. Internet e-mails are not necessarily secure. The Grid Controller of India Limited (Grid-India) does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent. Whilst all reasonable care has been taken to avoid the transmission of viruses, it is the responsibility of the recipient to ensure that the onward transmission, opening or use of this message and any attachments will not adversely affect its systems or data. No responsibility is accepted by the Grid-India in this regard and the recipient should carry out such virus and other checks as it considers appropriate. Visit our website at www.grid-india.in *

पश्चिम क्षेत्रिय भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा दी गयी रेलियाबिलिटी सहमति											
Request Id	Element Name	Type	KV	Owner	For Date	10-Feb-26	On Date	08-Feb-26	R0		
					Start Date	Start Time	End Date	End Time	S/D Type	Requesting Agency	Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
											Reason
											RLDC Status
						</					

Annexure P-15

From: AHMEDABAD CONTROL CENTRE
Sent: Monday, February 9, 2026 19:17
To: WRLDC Outage; Operation WRPC
Cc: PRASANTA KUMAR MAHALIK; Vijay Kumar Kodali (विजय कुमार कोडली); Pramod Patel; Rajnikkumar Prajapati / Transmission-TPGL / Ahmedabad; VINODBHAI PRAJAPATI / O&M / Ahmedabad; Dipak Prajapati / O&M / Ahmedabad; Vimalkumar Gosaliya / O&M / Ahmedabad; Omprakash Saxena / O&M / Ahmedabad; rtamcwr2; JE-MIS; oasldc; emisldc.getco; WRLDC Reliability; RTAMC WR2 <rtamcwr2@gmail.com> (rtamcwr2@gmail.com); Operation WRPC; Bhavik Shah / Power Mgmt & Scheduling / Ahmedabad; WRPC OP (opc-wrpc@nic.in)
Subject: Request to approve outages of 400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-1 & • 400KV-SUGEN-PIRANA-T-2 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-2

Respected Sir,

We have rescheduled shutdown of following outages as per communication for conductor stringing to complete the LILO project of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line at 765kV Ahmedabad S/S.

Conductor stringing, Testing, and commissioning

- 400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-1 from 16.02.2026 08:00hrs. to 17.02.2026 20:00hrs. (Continuous basis)
- 400KV-SUGEN-PIRANA-T-2 & 400KV-PIRANA-T-PIRANA-2 from 18.02.2026 08:00hrs. to 19.02.2026 20:00hrs. (Continuous basis)

Web portal screen shot of outage requests as under for your kind reference.

All							
OCC NO	Name of Requesting Agency	Element Name	Owner	C/D	Reason	Approved shutdown	Remarks
OCC_599	TPL	400KV-UNOSUGEN-PIRANA-T-1	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-1 at 765kV	16-02-2026 08:00 - 17-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously

					Ahmedabad S/S, Testing and commissioning		
OCC_599	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-1	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-1 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	16-02-2026 08:00 - 17-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously
OCC_599	TPL	400KV-SUGEN-PIRANA-T-2	TPGL,TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-2 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	18-02-2026 08:00 - 19-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously
OCC_599	TPL	400KV-PIRANA-T-PIRANA-2	TPGL,POWERGRID-WR2 (PGCIL),TORRENT POWER (TPL)	C	Conductor stringing of Proposed LILO of 400kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-2 at 765kV Ahmedabad S/S, Testing and commissioning	18-02-2026 08:00 - 19-02-2026 20:00	Both Lines on Same 400kV M/C Tower on Same side, Outage required simultaneously

You are requested to consider the outages

Regards,

Dipak Prajapati

EHV Control Room

Shift Incharge | EHV | AMDIST

M: +91-9227250698/7096037033/34,

Naranpura Zonal Office |Sola Road| Ahmedabad - 380013

E Mail: amdcc@torrentpower.com



www.torrentpower.com

Ref. no. TPGL/087/2026

05.03.2026

To,
As per Distribution List

NOTIFICATION OF DOCO

It is hereby intimated that subsequent to the Successful Trial Operation completed on dt.23.02.2026 (Copy attached), the following assets under the scheme "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D" along with Communication, Metering, Telemetry and Protection system has been put under Commercial Operation with effect from 00:00 hours of 24.02.2026 in line with Clause no.5(1) of CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2024 and clause no. 27(1)(c)(i) of CERC(Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 and CTUIL project award letter no. CTUIL/OM/09/Rev dated 16.02.2023

On successful Trial operation of the following assets / elements along with communication, metering, telemetry and protection system under the subject project put under commercial operation as per the details below:

Sl. No	Name of the Asset / Element
1	LILO of 400 kV Pirana (PG)_ - Pirana (Torrent) D/C line at Ahmedabad S/S with twin HTLS along with reconductoring of Pirana (PG)_ - Pirana (Torrent) line with twin HTLS conductor with OPGW for both main and LILO portion.
2	Bay upgradation work with requisite FOTE at Pirana (PG) & Pirana (Torrent) 400 kV line bays (Bay Upgradation) - 4 nos with Bus.

Transmission charges for the above-mentioned assets are payable with effect from 24.02.2026.



(Pramod. G. Patel)
Managing Director,
Torrent Power Grid Limited

List of Distribution:

1. Member Secretary, WRPC, F-3, M.I.D.C Area, Andheri (East), Mumbai - 400093.
2. Executive Director (WRLDC), Western Regional Load Dispatch Centre, Plot No. F-3, MIDC Area, Marol, Opp. SEEPZ, Andheri (East), Mumbai-400093.
3. Chief Engineer, Power System Project Monitoring, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi-110 066.
4. COO (Central Transmission Utility of India Ltd), Floor no. 5-10, Tower-1, IRCON International Tower, Plot no-16, Institutional Area, Sector-32, Gurugram, Haryana-122023.
5. Chief Engineer, SLDC, 132KV Gotri Sub-Station Campus, Vadodara, Gujarat-390021.
6. CGM(I/C), WR-II, PGCIL, Plot no.54, Savli Road, Vadodara, Gujarat-390008.
7. Executive Director, Torrent Power Ltd, Naranpura, Ahmedabad, Gujarat-380013.



ग्रिड-इंडिया
GRID-INDIA

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
GRID CONTROLLER OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

[formerly Power System Operation Corporation Limited (POSOCO)]

पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र / Western Regional Load Despatch Centre

कार्यालय : एफ-3, एम. आई. डी. सी. क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093

Office : F-3, M.I.D.C. Area, Marol, Andheri (East), Mumbai- 400093

CIN : U40105DL2009GOI188682, Website : www.wrlc.in, E-mail : wrldc@grid-india.in, Tel: 022 28202690, Fax: 022 28235434, 28202630

प्रमाणपत्र संदर्भ : प.क्षे.भा.प्रे.के./TPGL/2026/1

दिनांक: 27/02/2026

पारेषण तत्वों एवं बे द्वारा सफल ट्रायल ऑपरेशन (विद्युत भार के साथ) का प्रमाण पत्र
Certificate of successful Trial Operation (with electrical load) of Transmission
Element(s)/bay(s)

Reference:

- TPGL Communication (U.ID-1615) dated 28.01.2026 (Format-I and IA)
- WRLDC Communication to TPGl dated 02.02.2026 (Format-II-Acknowledgement)
- TPGL request for charging & trial operation dated 18.02.2026
- WRLDC Communication to TPGl dated 18.02.2026 (Format-IV -1643)
- Charging codes from WRLDC to TPGl on 19.02.2026, 21.02.2026 & 22.02.2026
- Communication dated 25.02.2026 & from TPGl [C1-C4] [TR.ID- 705]
- Communication from TPGl dated 25.02.2026 on compliance of Metering/SCADA requirements at WRLDC.

Based on the above documents under reference, it is hereby certified that the following Transmission elements/bays of **TORRENT POWER GRID LIMITED (TPGL)** have successfully undergone trial operation (with electrical load) at **765/400KV Ahmedabad SS:**

क्रमांक / S.No	पारेषण संपत्ति का नाम / Name of the Transmission Asset:	ट्रायल ऑपरेशन प्रारम्भ किए जाने का समय एवं तारीख / Date and Time of commencement of trial operation	ट्रायल ऑपरेशन समाप्ति का समय एवं तारीख / Date and time of completion of trial operation
1	400kV Pirana (T) - Ahmedabad (PG) line-1 (LILo portion of 400 kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-1 at Ahmedabad)	19-02-2026 17:45	20-02-2026 17:45
2	400kV Pirana (PG) - Ahmedabad (PG) line-1 (LILo portion of 400 kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-1 at Ahmedabad)	19-02-2026 19:20	20-02-2026 19:20
3	400kV Pirana (T) - Ahmedabad (PG) line-2 (LILo portion of 400 kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-2 at Ahmedabad)	21-02-2026 22:55	22-02-2026 22:55
4	400kV Pirana (PG) - Ahmedabad (PG) line-2 (LILo portion of 400 kV Pirana (PG) - Pirana (T) line-2 at Ahmedabad)	22-02-2026 02:00	23-02-2026 02:00

This certificate is being issued in accordance with Reg. 25 of CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations 2023 to certify trial operation of transmission element. Usage of this certificate for any other purpose is prohibited.

अहमदा मेहेन्दके

एम. एम. मेहेन्दके

कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.भा.प्रे.के

TO: प्रोजेक्ट इनचार्ज, टॉरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड

प्रति: 1. सदस्य सचिव, प.क्षे.वि.स, मुंबई

2. कार्यपालक निदेशक, रा.भा.प्रे.के, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय : बी- 9, प्रथम तल, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

Registered Office : B-9, 1st Floor, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi- 110016

Website : www.grid-india.in

CERTIFIED TRUE COPY OF RESOLUTION PASSED AT THE 86TH MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TORRENT POWER GRID LIMITED HELD ON WEDNESDAY, MAY 01, 2024 FROM 04:30 P.M. TO 05:30 P.M. THROUGH AUDIO VIDEO CONFERENCING CONDUCTED FROM "SAMANVAY", 600 TAPOVAN, AMBAWADI, AHMEDABAD – 380 015

APPROVAL OF REVISED PROJECT COST FOR TRANSMISSION SCHEME FOR EVACUATION OF 4.5 GW RE INJECTION AT KHAVDA PS UNDER PHASE-II, PART-D

"RESOLVED THAT in supersession of the Board resolution dated January 29, 2024, the Board be and hereby approves revised total estimated Project Cost of upto ₹ 800 Crore (Rupees Eight Hundred Crore only) for Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D ("Project").

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to provisions of Section 179 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and as permitted under the Memorandum and Articles of Association of the Company, approval of the Board be and is hereby accorded for equity infusion of upto ₹ 240 Crores and upto ₹ 560 Crores as debt to fund the cost of the Project.


RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 179 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and (including any statutory modification or re-enactment thereof), approval of the Board be and is hereby accorded for taking loans or guarantees from Torrent Power Limited ("TPL"), Holding Company, in one or more tranches, upto a maximum outstanding limit not exceeding ₹ 560 Crore, till the time financing facilities from Bank(s)/ Financial Institution(s) of the said Project of the Company is tied-up to meet the cash flow requirement of the Company and once the external loan is tied-up, any loan taken from TPL will be repaid to TPL by the Company such that no loan of the Company remains outstanding.



RESOLVED FURTHER THAT Managing Director, Chief Financial Officer and any Directors of the Company, be and are hereby severally authorised to do all such acts, deeds and things as may be necessary and to take all necessary steps incidental and ancillary in relation to the setting up of the above Project."

For Torrent Power Grid Limited


Darshan Soni
Company Secretary



Price Waterhouse Chartered Accountants LLP

The Board of Directors
Torrent Power Grid Limited
"Samanvay", 600, Tapovan,
Ambawadi,
Ahmedabad - 380015.

Auditor's Certificate on the Statement containing details of Capital Cost incurred for Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D till March 31, 2026

1. This certificate is issued in accordance with the terms of our agreement dated May 22, 2026.
2. The accompanying Statement containing details of Capital Cost incurred for Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D till March 31, 2026 " (the "Statement") of Torrent Power Grid Limited (the "Company") has been prepared by the Management of the Company pursuant to the requirement mentioned in Clause 9(1) of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024 issued vide Notification No. L-1/268/2022/CERC dated 15th March, 2024 (hereinafter referred to as the 'CERC Regulations') in connection with its obligation to submit such Statement to Central Electricity Regulatory Commission (the 'CERC'). We conducted our examination at the request of the Company as communicated to us vide the Company's email on May 13, 2026 (the "Company's Request"). We have digitally signed the Statement for identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement is the responsibility of the Management of the Company including the creation and maintenance of all accounting and other records supporting its contents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.
4. The Management is also responsible for ensuring that the Company complies with the requirement of the CERC Regulations and that it provides complete and accurate information to CERC as required therein.

Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, 17th Floor, Shapath V, Opp. Karnavati Club, S G Highway
Ahmedabad - 380 051, Gujarat, India
T: +91 (79) 69247156

Registered office and Head office: 11-A, Vishnu Digamber Marg, Sucheta Bhawan, New Delhi - 110002

Price Waterhouse (a Partnership Firm) converted into Price Waterhouse Chartered Accountants LLP (a Limited Liability Partnership with LLP identity no: LLPIN AAC-5001) with effect from July 25, 2014. Post its conversion to Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, its ICAI registration number is 01 2754NN500016 (ICAI registration number before conversion was 012754N)

Price Waterhouse Chartered Accountants LLP

Torrent Power Grid Limited

Auditor's Certificate on the Statement containing details of Capital Cost incurred for Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D till March 31, 2026

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the CERC Regulations and the Company's Request, it is our responsibility to examine the Statement and the underlying audited books of account and records of the Company, and provide reasonable assurance in the form of an opinion on whether:
 - a. the financial information set out in the Statement is in agreement with the underlying audited books of account and records of the Company as at and for the year ended March 31, 2026; and
 - b. the calculation in the Statement is mathematically accurate.
6. The financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2026 relating to the books of account and records referred to in paragraph 5 above, have been audited by us pursuant to the requirements of the Companies Act, 2013, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 8, 2026. Our audit of those financial statements has been conducted in accordance with the Standards on Auditing referred to in Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
7. We conducted our examination in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' (the "Guidance Note") issued by the ICAI. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control 1, 'Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements'.

Opinion

9. Based on our examination and the information and explanations given to us, we are of the opinion that:
 - a. the financial information set out in the Statement is in agreement with the underlying audited books of account and records of the Company as at and for the year ended March 31, 2026; and
 - b. the calculation in the Statement is mathematically accurate.

Price Waterhouse Chartered Accountants LLP

Torrent Power Grid Limited

Auditor's Certificate on the Statement containing details of Capital Cost incurred for Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D till March 31, 2026

Restriction on Use

10. Our obligations in respect of this certificate are separate from, and are not amended, increased, or otherwise affected by any other role we have or may have had as auditor of the Company or otherwise. Nothing in the certificate, nor anything said or done in the course of or in connection with the Services that are the subject of the certificate, will extend any duty of care we have or may have had in our capacity as auditors of the Company.
11. This certificate has been issued solely for submission to CERC, pursuant to the requirements of the CERC Regulations, and should not be used by any other person or for any other purpose. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP does not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person other than the Company.

For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP
Firm Registration Number: 012754N / N500016

Shah Viren

Bhanuchandra

a

Digitally signed by
Shah Viren
Bhanuchandra
Date: 2026.05.22
21:36:41 +05'30'

Viren Shah
Partner

Membership No.: 046521
UDIN: 26046521EGFLMX5238

Place : Ahmedabad
Date : May 22, 2026

Statement containing details of Capital Cost incurred for Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D till March 31, 2026

Torrent Power Grid Limited (the “Company”) is engaged in the business of transmission of power. The Company has set up a transmission system for evacuation of power from Torrent Power Limited's 1,147.5 MW Generation Project near Akhakhhol in District Surat, Gujarat to Pirana sub-station and the system is being used to transmit power to its beneficiaries within and outside Gujarat State.

As per the NCT vide letter dated 16.02.2023, the Company was awarded with the Inter-State Transmission System Schemes for its implementation under Regulated Tariff Mechanism mode. During the FY 2025-26, the Company has commissioned "Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D" as per the letter awarded (the 'Project').

This Statement is prepared by the management of the Company pursuant to the requirement contained in Clause 9(1) of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024 in Notification No. L-1/268/2022/CERC dated March 15, 2024.

Details of capital expenditure incurred on the Project till March 31, 2026

Particulars	(amount in INR in lakhs)				
	Capital Cost	Interest During Construction (IDC)	Incidental Expenditure during Construction (IEDC)	Finance Charges	Total Amount
i. Capital expenditure upto the date of commercial operation i.e. February 23, 2026.	48,766.81	1,177.17	207.53	12.45	50,163.96
ii. Capital Expenditure from Date of commercial operation till March 31, 2026.	2,814.20	-	-	-	2,814.20
Total	51,581.01	1,177.17	207.53	12.45	52,978.16

Notes:

- Expenditure incurred on the Project are considered on accrual basis. Cost considered for capital expenditure includes purchase price, taxes and duties, and other directly attributable costs (including Borrowing costs) incurred upto the date the asset is ready for its intended use as per the accounting policy followed by the Company.
- The above capital expenditure amount is gross amount of capitalisation done during the financial year 2025-26.
- We confirm, the information given in this Statement is in agreement with the audited books and records of the Company for the year ended March 31, 2026.

For Torrent Power Grid Limited

NAIMESH
VINODCHANDRA
SHAH

Digitally signed by NAIMESH
VINODCHANDRA SHAH
Date: 2026.05.22 21:13:11
+05'30'

Authorised Signatory

Place: Ahmedabad

Date: 22/05/2026

Shah Viren
Bhanuchandra
a

Digitally signed by
Shah Viren
Bhanuchandra
Date: 2026.05.22
21:35:45 +05'30'

TORRENT POWER GRID LIMITED

CIN: U40104GJ2005PLC046660

Registered Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India.

Phone: 079 26628300 IE-Mail: cs.tpgl@torrentpower.com

[illegible]

Annexure P-20

PART-III
FORM-1

Summary of Tariff

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

S. No.	Particulars	Form No.	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	5	6	7	8
1	Depreciation	Form No. 10A	215.40	2,424.42	2,593.07	2,593.07
2	Interest on Loan	Form No. 9E	295.20	3,214.79	3,238.43	3,023.20
3	Return on Equity	Form No. 8	277.88	3,084.80	3,299.39	3,299.39
4	Interest on Working Capital	Form No. 11	12.82	137.93	144.02	141.59
5	O&M Expenses	Form No. 2	17.26	172.97	181.94	191.32
	Total AFC		818.57	9,034.92	9,456.84	9,248.57

Note: This Form is a summary form and the Data to this from should flow from other base forms.

(Petitioner)

PART-III
FORM-1A

Summary of Asset Level Cost

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

A) Summary of Capital Cost, Means of Finance of the Asset								
Particular	i) Apportioned		ii) Summary of Actual / Projected Capital Cost					
	<i>as per IA</i>	As per RCE	As on COD (24/02/2026)	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29	As on 31.03.2029
Land (Freehold Land)								
Land (Leasehold)								
Building & Civil Works								
Transmission Line			48,583.33	2,735.50	7,371.80			58,690.63
Sub-Station			2,559.69	78.70	-			2,638.39
Communication System			33.22	-	-			33.22
Total Capital Cost as per Books			51,176.24	2,814.20	7,371.80	-	-	61,362.24
Less: Un-discharged liabilities			1,218.27					1,218.27
Add: Discharge of liability			-	608.46	609.82			1,218.27
Total Capital Cost			49,957.97	3,422.66	7,981.62	-	-	61,362.24
Equity			14,987.39	1,026.80	2,394.49	-	-	18,408.67
Debt			34,970.58	2,395.86	5,587.13	-	-	42,953.57

Note: This Form is a summary form and the Data to this form should flow from other base forms.

PART-III
FORM-2

Details of Transmission Lines, Substations and Communication System covered in the project scope and O&M for instant asset

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

1. Transmission Lines:

S. No.	Name of Line	Type of Line AC/HV DC	S/C or D/C	No. of Sub-Conductors	Voltage Level kV	Line Bays	Line Reactor (Including Switchable Reactor)	Line length km	Date of Commercial Operation	Covered in the present Petition	
										Yes/No	If No, Petition No.
1	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D	AC	Multi Circuit (Twin Conductor)	-	400kV	-	-	62.82	24-02-2026	Yes	N/A
2											
3											
-											
-											

Summary:

O&M Expenses for the Transmission lines covered in the instant petition	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
Normative rate of O&M as per Regulation (Rupees in Lakh)		1.588	1.671	1.759	1.851
Length in km		62.82	62.82	62.82	62.82
O&M Claimed (Rupees in Lakh)		99.76	104.97	110.50	116.28

2. Substations:

S. No.	Name of Sub- station	Type of Substation Conventional (Greenfield/ Brownfield) /GIS/ HVDC terminal/ HVDC Back to Back	Voltage level kV	No. of transformers / Reactors/S VC etc. (with capacity)*	No. of Bays				MVA/MVAr Capacity				Date of Commercial operation	Covered in the	
					765 kV	400 kV	220 kV	132 kV & Below	765 kV	400 kV	220 kV	132 kV & Below		Yes /No	If No, Petition No.
1	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D		400kV		-	2.00	-	-	-	-	-	-	24-02-2026	Yes	N/A
2															
3															
-															
-															

Summary:

O&M Expenses for the Substations covered in the instant petition	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
Normative rate of O&M as per Regulation (Rupees in Lakh)*		31.08	32.71	34.43	36.23
No. of units		2.00	2.00	2.00	2.00
O&M Claimed (Rupees in Lakh)		62.16	65.42	68.86	72.46

PART-III
FORM-2

Details of Transmission Lines, Substations and Communication System covered in the project scope and O&M for instant asset

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

3. Communication System:

S. No.	Name of Communication System	Type of Communication System – Communication System under ULDC/ SCADA/	Length of OPGW links	No. of RTU	No. of PMU	Date of Commercial operation	Capital Cost upto Cutoff date(Original Project cost)	Covered in the present Petition Yes/No	If No, Petition No.
1									
2									
3									
-									

Summary

O&M Expenses for the Communication System covered in the instant petition	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
Original Project Cost / Asset related to the communication system					
O&M expenses as per regulations (2% of Original Project Cost)					
Actual O&M Expense (Rupees in Lakh)*					

4) Summary of O&M Expenses claim

(Rupees in Lakh)

S. No	Particulars	2024-25	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
	No. of Days in the year		365	365	366	365
	No. of days for which tariff claimed		36	365	366	365
	A) Normative O&M					
1	Transmission line		9.84	104.97	110.50	116.28
2	Substation		6.13	65.42	68.86	72.46
3	Communication System					
	Total Normative O&M		15.97	170.39	179.36	188.74
	B) O&M Claimed under Regulation 35 (3)©					
1	Security Expenses		-	-	-	-
2	Actual Capital Spare consumed ¹		-	-	-	-
3	Insurance Premium Paid ²		1.29	2.58	2.58	2.58
	Total O&M		17.26	172.97	181.94	191.32

(Petitioner)

PART-III
FORM-3

Normative Parameters considered for Tariff Computation

Name of the Transmission Assets

1.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

Particulars	Unit	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Base Rate of Return on Equity	%		15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
Base Rate of Return on Equity on Additional Capitalization after Cut-off Date	%		-	-	-	-	-
Tax Rate	%		17.47%	17.47%	16.31%	16.31%	16.31%
Effective Tax Rate ²	%		17.47%	17.47%	16.31%	16.31%	16.31%
Target Availability	%		98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
Normative O&M per km	Rs. Lakh		1.509	1.588	1.671	1.759	1.851
Normative O&M per Bay	Rs. Lakh		29.53	31.08	32.71	34.43	36.23
Normative O&M per MVA	Rs. Lakh						
Spares for WC as % of O&M	%		15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
Receivables in Days for WC	Days		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Reference Rate as on first day of financial year ³	%		11.90%	12.25%	11.95%	11.95%	11.95%
Lapsed life as on 01.04.2024 and beginning of every year(in completed years)	No. of years			-	35.00	34.00	33.00

(Petitioner)

Name of the Transmission Assets:	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
---	---

A) Details of All the Asset Covered under the Scope of the Project						
Asset No. & Asset Name description	Actual COD	COD considered for Tariff	Effective COD for the project as whole (Refer C)	Weighted Average useful life of the project (Refer D)	Lapsed useful Life of the project as on 01-04-2024 (Refer E)	Balance useful Life of the Project as on 01.04.2024 (Refer E)
Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D	24-02-2026	24-02-2026	N/A	N/A	N/A	N/A

Particulars as on 31-03-2024 after true up of 2019- 24 period.	Asset 1	Asset 2	Asset 3	Asset 4	and so on	Total as on 01.04.2024 for the project as whole
a	b	c	d	e	f	g=(b+c+d+e+f)
Capital Cost as on 31.03.2024						
Cumulative Depreciation as on 31-03-2024						
Debt Equity Ratio as on 31.03.2024						
Gross Equity for Normative ROE as on 31.03.2024	N/A					
Gross Loan as on 31.03.2024						
Cumulative Re-payment of Loan as on 31.03.2024						

PART-III
FORM-4

Abstract of existing transmission assets/elements under project, Determination of Effective COD and Weighted Average Life for single AFC for the project as whole

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

C) Computation of Effective COD for determining lapsed useful life of the project as whole.

Asset No.	Asset 1	Asset 2	Asset 3	Asset 4	and so on	Total
a	b	c	d	e	f	g=(b+c+d+e+f)
1) Actual COD of the Asset.	N/A					
2) COD considered for tariff purpose ⁽ⁱ⁾						
3) No. of days between the COD of the asset considered for tariff and the COD of the Project ^{(ii)&(iii)}						
4) True up Capital Cost as on 31-03-2024 (in Lakh)						
5) Weight of the Cost of an asset (in %) ^(iv)						
6) Weighted days = (3x5)						
7) Effective COD = (i.e. COD of the Project - Total Weighted days)						

D) Weighted Average useful Life of the Project as whole

Particulars	Capital Cost as on 01-04-2024 after true up of 2014-19					Combined Cost	Useful life	Weighted Cost
	Asset 1	Asset 2	Asset 3	Asset 4	and so on			
a	b	c	d	e	f	g=(b+c+d+e+f)	h	i = (g)x(h)
Freehold Land	N/A							
Leasehold Land								
Building & Other Civil Works								
Transmission Line								
Sub-Station Equipment								
PLCC								
and so on								
Total								
Weighted Average life = Total Weighted Cost/Total Combine Cost (Rounded off to get complete year)								Years

E) Lapsed weighted average useful life of the project & Balance weighted average Useful life

This refers to the No. of completed years from the Effective COD till the last day of the previous tariff period (i.e. 31.03.2024)

i) Effective COD	
------------------	--

PART-III
FORM-4

Abstract of existing transmission assets/elements under project, Determination of Effective COD and Weighted Average Life for single AFC for the project as whole

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

ii) Last day of the previous tariff control period	N/A	N/A
iii) No. of Completed years lapsed as on		
iv) Remaining useful life (in year) (WAL-lapsed year)		

(Petitioner)

PART-III
FORM-4A

Statement of Capital cost

Name of the Transmission Assets:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

A) Capital Cost		FY 2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
1	a) Opening Gross Block Amount as per books (as on COD i.e. 24/02/2026)	48,766.81	1,091.91	47,674.89
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A(a) above	2,201.90	124.02	2,077.88
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in A(a) above	207.53	2.34	205.20
2	a) Addition in Gross Block Amount during the period	2,814.20	-482.10	3,296.30
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B(a) above		-124.02	124.02
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in B(a) above		-2.34	2.34
3	a) Closing Gross Block Amount as per books	51,581.01	609.82	50,971.19
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in C(a) above	207.53	-	207.53

A) Capital Cost		FY 2026-27		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
1	a) Opening Gross Block Amount as per books	51,581.01	609.82	50,971.19
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in A(a) above	207.53	-	207.53
2	a) Addition in Gross Block Amount during the period	7,371.80	-609.82	7,981.62
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B(a) above	-		-
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in B(a) above	-		-
3	a) Closing Gross Block Amount as per books	58,952.81	-	58,952.81
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in C(a) above	207.53	-	207.53

PART-III
FORM-4A

Statement of Capital cost

Name of the Transmission Assets:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

A) Capital Cost		FY 2027-28		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
1	a) Opening Gross Block Amount as per books	58,952.81	-	58,952.81
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in A(a) above	207.53	-	207.53
2	a) Addition in Gross Block Amount during the period			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B(a) above			
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in B(a) above			
3	a) Closing Gross Block Amount as per books	58,952.81	-	58,952.81
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in C(a) above	207.53	-	207.53

A) Capital Cost		FY 2028-29		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
1	a) Opening Gross Block Amount as per books	58,952.81	-	58,952.81
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in A(a) above	207.53	-	207.53
2	a) Addition in Gross Block Amount during the period			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B(a) above			
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in B(a) above			
3	a) Closing Gross Block Amount as per books	58,952.81	-	58,952.81
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C(a) above	2,201.90	-	2,201.90
	c) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in C(a) above	207.53	-	207.53

Statement of Capital cost

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

B) Flow of liability for the Asset						
Particulars	(as on COD i.e. 24/02/2026)	2024-25	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
1. Opening balance of liability ²			1,218.27	609.82	0.00	0.00
2. Add: Liability from ACE ³			-	-	-	-
3. Discharge of liability by payment and claimed as ACE ⁴			-608.46	-609.82	-	-
4. Reversal/cancelation (to be entered) ⁵			-	-	-	-
5. Closing Balance of Admitted liability ⁶	1,218.27		609.82	0.00	0.00	0.00

(Petitioner)

**PART-III
FORM-4B**

Statement of Capital Works in Progress

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

		As on 31.03.2026		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
A	a) Opening CWIP Amount as per books	-	-	-
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A (a) above	-	-	-
B	a) Addition/Adjustment in CWIP Amount during the period	2,814.20	-482.10	3,296.30
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B (a) above		-126.36	126.36
C	a) Capitalization/Transfer to Fixed asset of CWIP Amount during the period	2,814.20	-482.10	3,296.30
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C (a) above	-	-126.36	126.36
D	a) Closing CWIP Amount as per books	-	-	-
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost in D (a) above	-	-	-

		As on 31.03.2027		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
A	a) Opening CWIP Amount as per books	-	-	-
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A (a) above	-	-	-
B	a) Addition/Adjustment in CWIP Amount during the period	7,371.80	-609.82	7,981.62
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B (a) above			
C	a) Capitalization/Transfer to Fixed asset of CWIP Amount during the period	7,371.80	-609.82	7,981.62
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C (a) above	-	-	-
D	a) Closing CWIP Amount as per books	-	-	-
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost in D (a) above	-	-	-

**PART-III
FORM-4B**

Statement of Capital Works in Progress

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

		As on 31.03.2028		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
A	a) Opening CWIP Amount as per books			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A (a) above			
B	a) Addition/ Adjustment in CWIP Amount during the period			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B (a) above			
C	a) Capitalization/Transfer to Fixed asset of CWIP Amount during the period			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C (a) above			
D	a) Closing CWIP Amount as per books			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost in D (a) above			

		As on 31.03.2029		
	Particulars	Accrual Basis	Un-discharged Liabilities	Cash Basis
A	a) Opening CWIP Amount as per books			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in A (a) above			
B	a) Addition/ Adjustment in CWIP Amount during the period			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in B (a) above			
C	a) Capitalization/Transfer to Fixed asset of CWIP Amount during the period			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost included in C (a) above			
D	a) Closing CWIP Amount as per books			
	b) Amount of (i) IDC (ii) FC (iii) FERV & (iv) Hedging cost in D(a) above			

Note: Relevant date/s means date of COD of transmission element/s and financial year start date and end date

(Petitioner)

PART-III
FORM-4C

Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning for New Project/Element

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

Board of Director/ Agency approving the Capital cost estimates:	Board of Directors	
Date of approval of the Capital cost estimates:	16-02-2023	
	Present Day Cost	Completed Cost
Price level of approved estimates	As of End of _____ Qtr. of the year _____	As on Actual COD of the transmission system/ transmission element/ Communication System
Foreign Exchange rate considered for the Capital cost estimates		
Capital Cost excluding IDC, IEDC& FC		
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)	-	-
Domestic Component (Rs. Lakh)	76,770.09	58,952.81
Capital cost excluding IDC, FC, FERV & Hedging Cost (Rs. Lakh)	76,770.09	58,952.81
IDC, IEDC, FC, FERV & Hedging Cost		
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)		
Domestic Component (Rs Lakh)	3,329.91	2,409.43
Total IDC, FC, FERV & Hedging Cost (Rs Lakh)	3,329.91	2,409.43
Rate of taxes & duties considered		
Capital cost Including IDC, IEDC, FC, FERV & Hedging Cost		
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)		
Domestic Component (Rs Lakh)	80,100.00	61,362.24
Capital cost Including IDC, IEDC& FC (Rs Lakh)		
Schedule of Commissioning		
COD of transmission system 1 /transmission element 1/Communication System 1	24-02-2026	

Note:

1. Copy of approval letter by the Board duly certified by the Company secretary should be enclosed
2. Details of Capital Cost are to be furnished as per FORM-5 or 5A as applicable
3. Details of IDC & Financing Charges are to be furnished as per FORM-12(B).
4. Cost should be based on Management Certificate or Auditor Certificate. In case based on management certificate, Auditor Certificate to be provided within 90 days from filing of the Petition.

(Petitioner)

PART-III
FORM-5

Element wise Break-up of Project/Asset/Element Cost for Transmission System or Communication System

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

(Amount in Rs. Lakh)																				
S. No. (1)	Particulars (2)	Cost in Lakh										The portion Capital cost included in col. 5 which is not eligible for transmission tariff	Projected/actual cost of Deferred work to be capitalised after COD but before cut-off date (7)	Variation between actual Cost and IA/RCE cost as on COD (8=(5-6+7)-(3 or	Reasons for Variation1 (9)	Un-Discharge Liabilities included in Col. 5 (10)	Admitted cost (11)	Capital Work in Progress as per Books of Account as on		
		As per Original Estimates (3)			As per Revised Cost Estimates (if any)(4)			Actual Capital Expenditure (Gross Block) as on COD as per Books of Account(5)												
		Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Gross Block of the asset										
A	TRANSMISSION LINE																			
1	Preliminary works																			
1.1	Design & Engineering			-						-				-						
1.2	Preliminary Investigation, Right of way, forest clearance, PTCC, etc.			34,450.38						12,588.39		6,152.78	-15,709.20							
1.3	Total Preliminary works (1.1+1.2)			34,450.38						12,588.39		6,152.78	-15,709.20							
2	Transmission Lines material																			
2.1	Towers Steel			22,101.19						19,030.94			-3,070.25			453.58				
2.2	Conductor																	-		
2.3	Earth Wire																	20.21		
2.4	Insulators																			
2.5	Hardware Fittings																	45.34		
2.6	Conductor & Earth wire accessories																	4.21		
2.7	Spares																			
2.8	Erection & Stringing			11,115.97						9,466.62		3,223.13	1,573.78			533.57				
2.9	Total Transmission Lines material (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)			33,217.16						28,497.56		3,223.13	-1,496.48			1,056.91				
3	Taxes and Duties																			
3.1	Custom Duty			-						-			-							
3.2	Other Taxes & Duties			5,979.09						5,208.54		581.42	-189.13							
3.3	Total Taxes & Duties (3.1+3.2)			5,979.09						5,208.54		581.42	-189.13							
3.4	Total - Transmission lines (1.3+2.9+3.3)			73,646.63						46,294.49		9,957.33	-17,394.81			1,056.91				
B.	SUBSTATIONS																			
4	Preliminary works & land																			
4.1	Design & Engineering			-						-			-							
4.2	Land ²			-						-			-							
4.3	Site preparation			-						-			-							
4.4	Total Preliminary works & land (4.1+4.2+4.3)			-						-			-							
5	Civil Works																			
5.1	Control Room & Office Building including HVAC			-						-			-							
5.2	Township & Colony			-						-			-							
5.3	Roads and Drainage			-						-			-							
5.4	Foundation for structures			-						-			-							
5.5	Misc. civil works			-						-			-							
5.6	Total Civil Works (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)			-						-			-							
													-							

PART-III
FORM-5

Element wise Break-up of Project/Asset/Element Cost for Transmission System or Communication System

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

(Amount in Rs. Lakh)																	
S. No. (1)	Particulars (2)	Cost in Lakh										Variation between actual Cost and IA/RCE cost as on COD (8=(5-6+7)-(3 or 6+7))-(3 or 6+7)	Reasons for Variation1 (9)	Un-Discharge Liabilities included in Col. 5 (10)	Admitted cost (11)	Capital Work in Progress as per Books of Account as on	
		As per Original Estimates (3)			As per Revised Cost Estimates (if any)(4)			Actual Capital Expenditure (Gross Block) as on COD as per Books of Account(5)			The portion Capital cost included in col. 5 which is not eligible for transmission tariff						Projected/actual cost of Deferred work to be capitalised after COD but before cut-off date (7)
		Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Gross Block of the asset							
6	Substation Equipment												-				
6.1	Switchgear (CT,PT, Circuit Breaker, Isolator etc)			2,289.63						1,757.54		25.51	-506.57				
6.2	Transformers																
6.3	Compensating Equipment (Reactor, SVCs etc)																
6.4	Control , Relay & Protection Panel																
6.5	PLCC																
6.6	HVDC package																
6.7	Bus Bars/ conductors /Insulators																
6.8	Outdoor lighting																
6.9	Emergency D.G. Set																
6.1	Grounding System																
6.11	Structure for switchyard																
6.12	Erection- Service			315.00						308.86		41.19	35.05		35.00		
6.13	Total Substation Equipment (Sum of 6.1 to 6.12)			2,604.63						2,066.39		66.71	-471.53		35.00		
7	Spares			incl. in 6.1 to 6.11						incl. in 6.1 to 6.11							
8	Taxes and Duties																
8.1	Custom Duty			-									-				
8.2	Other Taxes & Duties			468.83						372.71		12.00	-84.13				
8.3	Total Taxes & Duties (8.1+8.2+8.3)			468.83						372.71		12.00	-84.13		-		
8.4	Total (Sub-station) (4.4+5.6+6.13+7+8.3)			3,073.46						2,439.10		78.70	-555.66		35.00		
C	Communication System																
9.1	Preliminary Works			-													
9.2	Communication System equipment's			42.37						28.21			-14.17				
9.3	Taxes and Duties			7.63						5.01			-2.62				
9.4	Total (Communication System) (9.1+9.2+9.3)			50.00						33.22		-	-16.78		-		
10	Cost of Plant & Machinery (3.4+8.4+9.4)			76,770.09						48,766.81		10,036.03	-17,967.25		1,091.91		

PART-III
FORM-5

Element wise Break-up of Project/Asset/Element Cost for Transmission System or Communication System

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

(Amount in Rs. Lakh)																	
S. No. (1)	Particulars (2)	Cost in Lakh										Variation between actual Cost and IA/RCE cost as on COD (8=(5-6+7)-(3 or	Reasons for Variation1 (9)	Un-Discharge Liabilities included in Col. 5 (10)	Admitted cost (11)	Capital Work in Progress as per Books of Account as on	
		As per Original Estimates (3)			As per Revised Cost Estimates (if any)(4)			Actual Capital Expenditure (Gross Block) as on COD as per Books of Account(5)			The portion Capital cost included in col. 5 which is not eligible for transmission tariff						Projected/actual cost of Deferred work to be capitalised after COD but before cut-off date (7)
		Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Gross Block of the asset							
11	Construction and pre-commissioning expenses																
11.1	Site supervision & site administration .etc.			229.91						207.53		149.97	127.59	2.34			
11.2	Tools and Plants			-						-			-				
11.3	construction Insurance			-						-			-				
11.4	Total Construction and pre commissioning expenses (11.1+11.2+11.3)			229.91						207.53		149.97	127.59	2.34			
12	Overheads																
12.1	Establishment			-													
12.2	Audit & Accounts			-													
12.3	Contingency			-													
12.4	Other overheads			-													
12.5	Total Overheads (12.1+12.2+12.3+12.4)			-													
13	IDC, FC, FERV & Hedging																
13.1	Interest During Construction (IDC)			3,100.00						2,201.90			-898.10	124.02			
13.2	Financing Charges (FC)																
13.3	Foreign Exchange Rate Variation (FERV)			-						-			-				
13.4	Hedging Cost			-						-			-				
13.5	Total of IDC, FC, FERV & Hedging Cost (13.1+13.2+13.3+13.4)			3,100.00						2,201.90		-	-898.10	124.02			

PART-III
FORM-5

Element wise Break-up of Project/Asset/Element Cost for Transmission System or Communication System

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

S. No. (1)	Particulars (2)	Cost in Lakh											Variation between actual Cost and IA/RCE cost as on COD (8=(5-6+7)-(3 or	Reasons for Variation ¹ (9)	Un-Discharge Liabilities included in Col. 5 (10)	Admitted cost (11)	Capital Work in Progress as per Books of Account as on
		As per Original Estimates (3)			As per Revised Cost Estimates (if any)(4)			Actual Capital Expenditure (Gross Block) as on COD as per Books of Account(5)			The portion Capital cost included in col. 5 which is not eligible for transmission tariff	Projected/actual cost of Deferred work to be capitalised after COD but before cut-off date (7)					
		Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Gross Block of the asset							
14	Capital cost including IDC, FC, FERV & Hedging Cost (10+11.4+12.5+13.5)			80,100.00						51,176.24		10,186.00	-18,737.76		1,218.27		

B) Summary of Capital Cost as on COD

Particular	Plant & Machinery Cost including initial spare but excluding IDC&IEDC	Initial Spare capitalised	IEDC capitalised	IDC capitalised	Loan FERV	Gross Block as per books of Account as on COD	Deduction from Gross Block ³	Gross block meant for tariff as on COD / 01.04.2024 (after deductions)	Un- discharged liability included in 8	Capital Cost on Cash basis for tariff as on COD / as on 01.04.2024
	1	2	3	4	5	6=(1+3+4+5)	7	8=(6-	9	10=(8-9)
Land (Freehold Land)										
Land (Leasehold)										
Building & Civil Works										
Transmission Line	46,294.49		197.14	2091.70	-	48,583.33	-	48,583.33	1,176.95	47,406.38
Sub-Station	2,439.10		10.39	110.20	-	2,559.69	-	2,559.69	41.32	2,518.37
Communication System	33.22				-	33.22	-	33.22		33.22
Total Capital Cost as per Books of Account	48,766.81		207.53	2,201.90	-	51,176.24	-	51,176.24	1,218.27	49,957.97
Less: Un-discharged liabilities	1,091.91		2.34	124.02	-	1,218.27	-	1,218.27		
Total Capital Cost Claimed for tariff	47,674.89		205.20	2,077.88	-	49,957.97	-	49,957.97		
% of IDC / IEDC on the base of (Plant & Machinery cost including initial spare as per Books of Account)										
Means of Finance										
Equity										
Debt										

(Petitioner)

PART-III
FORM-5A

Break-up of Construction/Supply/Service Packages

Name of the Transmission Assets:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

S. No.	Name/No. of Construction /supply/service package	Scope of works ¹ (in line with head of cost break-ups as applicable)	Whether awarded through ICB/DCB/ Departmentally/ Deposit Work, etc.	No. of bids received	Date of Award	Date of Start of work	Date of Completion of Work	Value of Award ² in (Rs. Lakh).	Firm or With Escalation in prices	Actual expenditure till the completion or up to COD (Rs. Lakh)	Taxes & Duties and IEDC (Rs. Lakh)	IDC, FC, FERV & Hedging cost (Rs. Lakh)	Sub- Total (Rs. Lakh)
	Jyoti Structure Limited/TPGL/T04/40934/3160088023	EPC work of 400kV M/C.(TWIN HTLS) LILO of Pirana (PG)- Pirana(T) Ahmedabad S/s.alonwith reconductoring of Pirana (PG) - Pirana(T) line with Twin HTLS Conductor	DCB		07-02-2024	07-02-2024	23-02-2026	12,189.44	Firm	11,410.87	2,107.69	-	13,518.56
	Jyoti Structure Limited/TPGL/T04/40934/3130036677	EPC work of 400kV M/C.(TWIN HTLS) LILO of Pirana (PG)- Pirana(T) Ahmedabad S/s.alonwith reconductoring of Pirana (PG) - Pirana(T) line with Twin HTLS Conductor	DCB		09-02-2024	09-02-2024	23-02-2026	10,508.67	Firm	9,978.81	1,834.46	-	11,813.27
	Apar Industries Limited/TPGL/T04/10014/3160089100	supply of HTLS Conductor ACSS for TPGL Project	DCB		29-03-2024	29-03-2024	23-02-2026	7,605.23	Firm	7,601.99	1,368.36	-	8,970.35
	Linxon India Private Limited/TPGL/T04/41732/3160089554	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 400kV AIS Augmentation Substation Bay (400 kV Bay upgradation at PGCIL, Pirana SS and TPL Pirana SS for TPGL)	DCB		19-04-2024	19-04-2024	23-02-2026	1,795.16	Firm	1,781.28	320.53	-	2,101.81
	Linxon India Private Limited/TPGL/T04/41732/3130037230	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 400kV AIS Augmentation Substation Bay(400 kV Bay upgradation at PGCIL, Pirana SS and TPL Pirana SS for TPGL)	DCB		19-04-2024	19-04-2024	23-02-2026	324.09	Firm	324.09	58.46	-	382.55
	Linxon India Private Limited/TPGL/T04/41732/3130042451	Installation of LMU Coupling Device (Make-Hitachi) 400KV PGCIL SS	DCB		03-11-2025	03-11-2025	23-02-2026	0.70	Firm	0.70	0.13	-	0.83
	Linxon India Private Limited/TPGL/T04/41732/3160102107	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 400kV AIS Augmentation Substation Bay(400 kV Bay upgradation at PGCIL, Pirana SS and TPL Pirana SS for TPGL)	DCB		03-11-2025	03-11-2025	23-02-2026	8.40	Firm	8.40	1.51	-	9.91
	Rajesh Power Services Limited/ Service Agreement - dt. 18.01.2024	RoW resolution consultancy charges	DCB		18-01-2024	18-01-2024	23-02-2026	1,689.30	Firm	200.09	36.02	-	236.11

Note:

1 The scope of work in any package should be indicated in conformity of cost break-up in Form-5 to the extent possible.

2 If there is any package, which need to be shown in Indian Rupee and foreign currency(ies), the same should be shown separately along with the currency, the exchange rate and the date e.g. Rs. 800 Lakh. + US\$ 5m=Rs. 4800 Lakh. at US\$=Rs. 80 as on say 01.04.2024.

(Petitioner)

PART-III
FORM-5B

Details of all the assets covered in the project

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
SCOD: 21-03-2025

S. No.	Name of Asset	COD	Delay (in No. of in days)	Apportioned approved cost (Rs. Lakh)	Revised cost estimates, if applicable (Rs. Lakh)	Completed Cost (Rs. Lakh)	Covered in the present	
							Yes/No	If No, Petition No.
1	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D	24-02-2026	340	80,100.00	N/A	61,362.24	Yes	N/A
2								
3								
4								
5								

Total								

(Petitioner)

**PART-III
FORM-6**

Actual Cash Expenditure and Financial Package upto COD

Name of the Transmission Assets : Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

A) Actual Cash Expenditure up to COD

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	Q4-23-24	Q1-24-25	Q2-24-25	Q3-24-25	Q4-24-25	Q1-25-26	Q2-25-26	Q3-25-26	Up to COD
Actual Payment to contractors/ suppliers during the quarter	29.79	1,876.16	2,219.07	2,537.39	10,246.24	8,373.22	8,658.97	11,332.69	3,672.17
Cumulative Cash payments at the end of the	29.79	1,905.94	4,125.02	6,662.41	16,908.65	25,281.87	33,940.84	45,273.52	48,945.69
% of cumulative cash Payment on Total Payment up to Actual COD	0.06%	3.89%	8.43%	13.61%	34.55%	51.65%	69.34%	92.50%	100.00%

B) Financial package

	Financial Package as Approved		Financial Package as on COD		As Admitted on COD	
	Currency and Amount\$		Currency and Amount\$		Currency & Amount \$	
1	2	3	4	5	6	7
Loan	INR	56,070.00	INR	34,970.58		
Total Loans						
Equity-						
Foreign						
Domestic	INR	24,030.00	INR	14,987.39		
Total Equity						
Debt : Equity Ratio		70:30		70:30		
Total Cost	INR	80,100.00	INR	49,957.97		
Add Cap.	Debt	Equity	Actual Debt	Actual equity	Debt	Equity
2025-26 (24/02/2026 to			2,395.86	1,026.80		
2026-27			5,587.13	2,394.49		
Total Capital Cost with add cap.			61,362.24			

Note:

* Say Rs. 800 Lakh + US\$ 5m = Rs. 4800 Lakh including US\$ 5m at an exchange rate of US\$=Rs. 80.

For Example: US\$ 5m, etc.

\$ In case of foreign loans exchange rate considered on date of commercial operation.

(Petitioner)

PART-III
FORM-7

Statement of Additional Capitalisation after COD

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

A) ACE for the year: 2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)								
Particulars	Addition into Gross Block as per books of Account during the year	Less: Deductions dr. the year towards				Add: Discharge of earlier admitted liability	ACE on cash basis for tariff purpose	Admitted Cost in final tariff ¹ (Rs Lakh)
		Grants Received (if any)	Asset pertaining to other business (If any)	Other Deduction (if any)	Less: Un-discharged liability included in (2-4-5)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-3-4-5- 6+7)	
Land (Freehold Land)	-	-	-	-	-	-	-	
Land (Leasehold)	-	-	-	-	-	-	-	
Building, Civil Work	-	-	-	-	-	-	-	
Transmission Line	2,735.50	-	-	-	-	567.13	3,302.63	
Sub-Station	78.70	-	-	-	-	41.32	120.03	
PLCC	-	-	-	-	-	-	-	
Total	2,814.20	-	-	-	-	608.46	3,422.66	

A) ACE for the year: 2026-27								
Particulars	Addition into Gross Block as per books of Account during the year	Less: Deductions dr. the year towards				Add: Discharge of earlier admitted liability	ACE on cash basis for tariff purpose	Admitted Cost in final tariff ¹ (Rs Lakh)
		Grants Received (if any)	Asset pertaining to other business (If any)	Other Deduction (if any)	Less: Un-discharged liability included in (2-4-5)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-3-4-5- 6+7)	
Land (Freehold Land)	-	-	-	-	-	-	-	
Land (Leasehold)	-	-	-	-	-	-	-	
Building, Civil Work	-	-	-	-	-	-	-	
Transmission Line	7,371.80	-	-	-	-	609.82	7,981.62	
Sub-Station	-	-	-	-	-	-	-	
PLCC	-	-	-	-	-	-	-	
Total	7,371.80	-	-	-	-	609.82	7,981.62	

PART-III
FORM-7

Statement of Additional Capitalisation after COD

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

A) ACE for the year: <u>2027-28</u>								
Particulars	Addition into Gross Block as per books of Account during the year	Less: Deductions dr. the year towards				Add: Discharge of earlier admitted liability	ACE on cash basis for tariff purpose	Admitted Cost in final tariff ¹ (Rs Lakh)
		Grants Received (if any)	Asset pertaining to other business (If any)	Other Deduction (if any)	Less: Un-discharged liability included in (2-4-5)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-3-4-5- 6+7)	
Land (Freehold Land)	-	-	-	-	-	-	-	
Land (Leasehold)	-	-	-	-	-	-	-	
Building, Civil Work	-	-	-	-	-	-	-	
Transmission Line	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Station	-	-	-	-	-	-	-	
PLCC	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	

A) ACE for the year: <u>2028-29</u>								
Particulars	Addition into Gross Block as per books of Account during the year	Less: Deductions dr. the year towards				Add: Discharge of earlier admitted liability	ACE on cash basis for tariff purpose	Admitted Cost in final tariff ¹ (Rs Lakh)
		Grants Received (if any)	Asset pertaining to other business (If any)	Other Deduction (if any)	Less: Un-discharged liability included in (2-4-5)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-3-4-5- 6+7)	
Land (Freehold Land)	-	-	-	-	-	-	-	
Land (Leasehold)	-	-	-	-	-	-	-	
Building, Civil Work	-	-	-	-	-	-	-	
Transmission Line	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Station	-	-	-	-	-	-	-	
PLCC	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	

PART-III
FORM-7

Statement of Additional Capitalisation after COD

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

B) Regulation wise ACE claim on Cash basis						
Regulation No.	Particulars	2024-25	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2029-29
Reg. 24	ACE within the original scope and upto the cut-off date.					
24 (1) (a)	Un-discharged liabilities recognized to be payable at a future date		3,422.66	7,981.62	-	-
24 (1) (b)	Works deferred for execution				-	-
24 (1) (c)	Procurement of initial capital spares		-	-	-	-
24 (1) (d)	Liabilities to meet award of arbitration etc.		-	-	-	-
24 (1) (e)	Change in law or compliance of any existing law		-	-	-	-
24 (1) (g)	Force Majeure events		-	-	-	-
	Total under Regulation 24		3,422.66	7,981.62	-	-
Reg. 25	ACE within the original scope and after the cut-off date					
25 (1) (a)	Liabilities to meet award of arbitration etc.					
25 (1) (b)	Change in law or compliance of any existing law					
25 (1) (d)	Liability for works executed prior to the cut-off date					
25 (1) (e)	Force Majeure events					
25 (1) (f)	Liability for works admitted by the Commission after the cut-off date					
	Total under Regulation 25					
Reg. 26	ACE beyond the original scope:					
26 (1) (a)	Liabilities to meet award of arbitration etc.		-	-	-	-
26 (1) (b)	Change in law or compliance of any existing law;		-	-	-	-
26 (1) (c)	Force Majeure Events;		-	-	-	-
26(1) (d)	Need for higher security and safety of the plant....		-	-	-	-
26(1) (i)	Expenditure necessary for Efficient Operation including works required towards projects		-	-	-	-
	Total under Regulation 26		-	-	-	-
	Total ACE claimed for tariff		3,422.66	7,981.62	-	-
	Total Admitted ACE during Final tariff ¹					

(Petitioner)

PART-III
FORM-7A

Financing of Additional Capitalisation

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

	Actual/Projected					Admitted				
Financial Year (Starting from COD)	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2029-29	Year1	Year2	Year3	Year4	Year 5 & So on
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amount capitalised in Work/Equipment	49,957.97	3,422.66	7,981.62	-	-	N/A				
Financing Details										
Loan-1	34,970.58	2,395.86	5,587.13	-	-					
Loan-2										
Loan-3 and so on										
Total Loan										
Equity	14,987.39	1,026.80	2,394.49	-	-					
Internal Resources										
Others										
Total										

(Petitioner)

PART-III
FORM-7B

Statement of Additional Capitalisation claimed during five year before the end of the useful life of the Project

Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

S. No.	Year	Work/Equipment Proposed to be added five years before the useful life	Amount capitalised /Proposed to be capitalized (Rs Lakh)	Justification for capitalisation proposed	Impact on life extension
1	2	3	4	5	6
1	N/A				
2					
3					
4					
5					

(Petitioner)

PART-III
FORM-8

Calculation of Return on Equity at Normal Rate

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

S. No	Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
	No. of Days in the year		365	365	366	365
	No. of days for which tariff claimed		36	365	366	365
1	Opening Normative Equity		14,987.39	16,014.19	18,408.67	18,408.67
2	Less: Adjustment in Equity*					
3	Adjustment during the year					
4	Net Opening Equity (Normal)		14,987.39	16,014.19	18,408.67	18,408.67
5	Add: Increase in Equity due to addition during the year/period		1,026.80	2,394.49		
6	Less: Decrease due to de-capitalisation during the year					
7	Add: Increase due to discharges during the year/period					
8	Closing Normative Equity	14,987.39	16,014.19	18,408.67	18,408.67	18,408.67
9	Average Normative Equity		15,500.79	17,211.43	18,408.67	18,408.67
11	Rate of Return on Equity (Base Rate)		15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
12	Reduced rate of 1% decided by commission under Regulation 30 (2) (if any)		-	-	-	-
13	Effective tax rate / MAT rate for the respective years		17.47%	16.31%	16.31%	16.31%
14	Rate of Return on Equity (Pre Tax)		18.18%	17.92%	17.92%	17.92%
15	Return on Equity on project cost till Cutoff date (Pre Tax)		2,817.42	3,084.80	3,299.39	3,299.39

S. No.	Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	5	6	7	8
1.1	Equity as on COD/Admitted equity	14,987.39	14,987.39	16,014.19	18,408.67	18,408.67
1.2	Notional Equity for Add Cap		1,026.80	2,394.49	-	-
1.3	Total Equity	14,987.39	16,014.19	18,408.67	18,408.67	18,408.67
1.4	Return on Equity		277.88	3,084.80	3,299.39	3,299.39
	Total					

PART-III
FORM-8

Calculation of Return on Equity at Normal Rate

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

Statement showing Return on Equity at Weighted Average Rate of Interest on Actual Loan Portfolio

S. No.	Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gross Opening Equity [pertaining to Proviso to Regulation 30(2)]	N/A				
2	Less: Less: Adjustment in Equity ¹					
3	Adjustment during the year					
4	Net Opening Equity [pertaining to Proviso to Regulation 30(2)]					
5	Add: Increase in equity due to addition during the year/period					
6	Less: Decrease due to de-capitalisation during the year/period					
7	Less: Decrease due to reversal during the year / period					
8	Add: Increase due to discharges during the year / period					
9	Closing Normative Equity					
10	Average Normative Equity					
11	Rate of Return on Equity					
12	Reduced rate of 1% decided by commission under Regulation 30 (2) (if any)					
13	Effective tax rate / MAT rate for the respective years					
14	Rate of Return on Equity (Pre Tax)					
15	Return on Equity on project cost till Cutoff date (Pre Tax)					

(Petitioner)

Name of the Transmission Assets
Exchange Rate on date/s of Infusion:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

S.No.	Financial Year	Year 1				Year 2				Year 3 and so on			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (Rs Lakh)	Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (Rs Lakh)	Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (R Lakh)
	Currency1 ¹												
A.1	At the date of infusion ²	N/A											
2													
	Currency2 ¹												
A.1	At the date of infusion ²												
2													
	Currency3 ¹												
A.1	At the date of infusion ²												
2													
	Currency4 ¹ and so on												
A.1	At the date of infusion ²												
2													
3													

PART-III
FORM-9

Details of Allocation of corporate loans to various transmission elements

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

Exchange Rate on date/s of Infusion:

Particulars	Package1	Package2	Package3	Package4	Package5	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Source of Loan ¹	N/A					
Currency ²						
Amount of Loan sanctioned						
Amount of Gross Loan drawn upto 31.03.2024/COD						
Interest Type ⁶						
Fixed Interest Rate, if applicable						
Base Rate, if Floating Interest ⁷						
Margin, if Floating Interest ⁸						
Are there any Caps/Floor ⁹						
If above is yes, specify caps/floor						
Moratorium Period ¹⁰						
Moratorium effective from						
Repayment Period ¹¹						
Repayment effective from						
Repayment Frequency ¹²						
Repayment Instalment ^{13,14}						
Base Exchange Rate ¹⁶						
Are foreign currency loan hedged?						
If above is yes, specify details ¹⁷						

Distribution of loan packages to various transmission elements/ Communication system						
Name of the Projects						Total
Transmission element 1/Communication system 1						
Transmission element 2 /Communication system 2						
Transmission element 3/Communication system 3 and so on						

(Petitioner)

PART-III
FORM-9A

Details of Project Specific Loans

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

Particulars	Package1	Package2	Package3	Package6
1	2	3	4	7
Source of Loan ¹	Bank of Baroda			
Currency ²	INR			
Amount of Loan sanctioned				
Amount of Gross Loan drawn upto COD	22500			
Interest Type ⁶	Floating			
Fixed Interest Rate, if applicable				
Base Rate, if Floating Interest ⁷	3 Month MCLR			
Margin, if Floating Interest ⁸	0.15% Over - 3 Month MCLR			
Are there any Caps/Floor ⁹	No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
If above is yes, specify caps/floor				
Moratorium Period ¹⁰	12 month from COD			
Moratorium effective from	24-02-2026			
Repayment Period ¹¹	60 Quarterely Installment			
Repayment effective from	Jun-27			
Repayment Frequency ¹²	QUARTERLY			
Repayment Instalment ^{13,14}	1.25% of loan Sixty quarterely installment + Final Installment 25% loan amount			
Base Exchange Rate ¹⁶				
Are foreign currency loan hedged?				
If above is yes, specify details ¹⁷				

(Petitioner)

Details of Foreign loans
Name of the Transmission Assets: Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
Exchange Rate at COD/31.03.2024 whichever is later

S. No.	Financial Year (Starting from COD)	Year 1				Year 2 and so on			
	1	2	3	4\$	5	6	7	8\$	9
	Particulars	Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (Rs Lakh)	Date	Amount (Foreign Currency)	Exchang e Rate	Amount (Rs Lakh)
	Currency1 ¹								
A.1	At the date of Drawl ²	N/A							
2	Scheduled repayment date of principal								
3	Scheduled payment date of interest								
4	At the end of Financial year								
B	In case of Hedging ³								
1	At the date of hedging								
2	Period of hedging								
3	Cost of hedging								
	Currency2 ¹								
A.1	At the date of Drawl ²								
2	Scheduled repayment date of principal								
3	Scheduled payment date of interest								
4	At the end of Financial year								
B	In case of Hedging ³								
1	At the date of hedging								
2	Period of hedging								
3	Cost of hedging								

(Petitioner)

PART-III
FORM-9C

Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans1

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	4	5	6	7
Loan-BOB					
Gross loan - Opening		22,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Cumulative repayments of Loans up to previous year					
Net loan - Opening					
Add: Drawl(s) during the Year		3,500.00			
Less: Repayment (s) of Loans during the year					
Net loan - Closing	22,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Average Net Loan		24,250.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Rate of Interest on Loan on annual basis		8.30%	8.30%	8.30%	8.30%
Interest on loan					
<i>Loan repayment effective from (date to be indicated)</i>					
Total Loan					
Gross loan - Opening		22,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Cumulative repayments of Loans up to previous year					
Net loan - Opening					
Add: Drawl(s) during the Year		3,500.00			
Less: Repayment (s) of Loans during the year					
Net loan - Closing		26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Average Net Loan		24,250.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
Interest on loan		8.30%	8.30%	8.30%	8.30%
Weighted average Rate of Interest on Loans		8.30%	8.30%	8.30%	8.30%

(Petitioner)

PART-III
FORM-9D

Loans in Foreign Currency

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	Existing 2023-24	2024-25	2025- 26	2026- 27	2027- 28	2028- 29
1	2	3	4	5	6	7
Foreign Loan-1 (USD in Lakh) Exchange rate						
Gross loan - Opening	N/A					
Cumulative repayments of Loans upto previous year						
Net loan - Opening						
Add: Drawl(s) during the Year						
Less: Repayment (s) of Loans during the year						
Net loan - Closing						
Average Net Loan						
Rate of Interest on Loan on annual basis						
Interest on loan						
<i>Loan repayment effective from (date to be indicated)</i>						
Foreign Loan-2 (USD in Lakh) Exchange rate						
Gross loan - Opening						
Cumulative repayments of Loans upto previous year						
Net loan - Opening						
Add: Drawl(s) during the Year						
Less: Repayment (s) of Loans during the year						
Net loan - Closing						
Average Net Loan						
Rate of Interest on Loan on annual basis						
Interest on loan						
<i>Loan repayment effective from (date to be indicated)</i>						

(Petitioner)

PART-III
FORM-9E

Calculation of Interest on Normative Loan

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

S. No.	Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
	No. of Days in the year		365	365	366	365
	No. of days for which tariff claimed		36	365	366	365
1	Gross Normative loan – Opening	34,970.58	34,970.58	37,366.44	42,953.57	42,953.57
2	Cumulative repayment of Normative Loan upto previous year		-	215.40	2,639.82	5,232.89
3	Net normative loan – Opening		34,970.58	37,151.04	40,313.75	37,720.68
4	Addition in Normative loan towards the ACE		2,395.86	5,587.13		
5	Adjustment of Normative Gross loan pertaining to the decapitalised asset.					
6	Normative Repayments of Normative Loan during the year		215.40	2,424.42	2,593.07	2,593.07
7	Adjustment of Cum. repayment pertaining to the decapitalised asset.					
8	Net Normative loan – Closing		37,151.04	40,313.75	37,720.68	35,127.61
9	Average Normative Loan		36,060.81	38,732.39	39,017.22	36,424.15
10	Weighted average Rate of Interest of actual Loans		8.30%	8.30%	8.30%	8.30%
11	Interest on Normative loan		295.20	3,214.79	3,238.43	3,023.20

(Petitioner)

PART-III
FORM-10

Calculation of Depreciation Rate on original project cost

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

S. No.	Name of the Assets ¹	Gross Block as on 24/02/2026	Depreciation Rates as per CERC's Depreciation Rate Schedule ²	Gross Block as on 31/03/2026	Gross Block as on 31/03/2027	Gross Block as on 31/03/2028	Gross Block as on 31/03/2029	Depreciation Amount for each year up to 31.03.2029
	1	2	3	4	5	6	7	4= Col.2 X
1	Transmission Line	47,406.38	4.22%	50,709.01	58,690.63	58,690.63	58,690.63	
2	Sub-Station	2,518.37	4.22%	2,638.39	2,638.39	2,638.39	2,638.39	
3	Communication System	33.22	15.00%	33.22	33.22	33.22	33.22	
4								
	TOTAL	49,957.97		53,380.63	61,362.24	61,362.24	61,362.24	
	Weighted Average Rate of Depreciation (%)			4.23%	4.23%	4.23%	4.23%	

Note:

1. Name of the Assets should conform to the description of the assets mentioned in Depreciation Schedule appended to the Notification.
2. For Existing Project Depreciation Rate shall be as per Appendix-I while for New Project the rate shall be as per Appendix-II.

(Petitioner)

PART-III
FORM-10A

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

Statement of Depreciation						
S. No.	Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
I	No. of Days in the year		365	365	366	365
II	No. of days for which tariff claimed		36	365	366	365
	<i>Life at the beginning of year</i>			35.00	34.00	33.00
1.1	Weighted Average useful Life of the Asset/Project.					
1.2	Lapsed weighted average useful life of the asset/project (in Completed no. of Year).					
1.3	Balance weighted average useful life of the asset/project (in Completed no. of Years)			35.00	34.00	33.00
	<i>Capital Base</i>					
1.4	Opening Capital Cost		49,957.97	53,380.63	61,362.24	61,362.24
1.5	Additional Capital Expenditure dr. the year		3,422.66	7,981.62		
1.6	De-Capitalisation during the year					
1.7	Closing Capital Cost	49,957.97	53,380.63	61,362.24	61,362.24	61,362.24
1.8	Average Capital Cost		51,669.30	57,371.44	61,362.24	61,362.24
1.9	Freehold land included in 1.8					
1.10	Asset having NIL Salvage value included in 1.8		33.22	33.22	33.22	33.22
1.11	Asset having 10% Salvage value included in 1.8		53,347.41	61,329.03	61,329.03	61,329.03
1.12	Depreciable value (1.10+ 90% of 1.11)		48,045.89	55,229.34	55,229.34	55,229.34
	<i>Depreciation for the period and Cum. Depreciation.</i>					
1.13	Weighted Average Rate of depreciation		4.23%	4.23%	4.23%	4.23%
1.14	Depreciation (for the period)		2,183.91	2,424.42	2,593.07	2,593.07
1.15	Depreciation (annualised)		215.40	2,424.42	2,593.07	2,593.07
1.16	Cumulative depreciation at the beginning of the period			215.40	2,639.82	5,232.89
1.17	Less: Adj. of Cum. dep. pertaining to the de-capitalised asset.					
1.18	Cumulative depreciation at the end of the period		215.40	2,639.82	5,232.89	7,825.96

(Petitioner)

PART-III
FORM-10B

Statement of De-capitalisation

Name of the Transmission Assets
COD:

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

(Amount in RS. Lakh)									
S. No.	Category	Date of Decapitalisati on	Details of the Asset Decapitali sed	Date / Year of capitalisatio n of asset/equip ment being decapitalise d	Original Capital Cost admitted for tariff for the asset being decapitalis ed	Debt Equity ratio considere d on for tariff on the Capital cost at (5)	Cumulative Depreciation correspondi ng to decapitalise d asset up to the date of decapitalisat ion	Cumulative Repayment of Loan correspondin g to decapitalised asset up to the date of decapitalisati on	Details of Petition in which the tariff of the asset being de-capitalised was approved by Commission (Specify All the Pet. No. & Order date, Project name, Asset No for all the periods starting from its COD till date)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2024-25									
1									
2....									
Total									
2025-26									
1									
2....									
Total									
2026-27									
1									
2...									
Total									
2027-28									
1									
2...									
Total									
2028-29									
1									
2...									
Total									

Note: Category include

1. Replacement due to no usable condition like destroyed, completed useful life etc.
2. Replacement due to change in law.
3. Inter Unit transfer (transfer outside of the project)
4. Asset not put to use

(Petitioner)

PART-III
FORM-11

Calculation of Interest on Working Capital

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D
(Amount in Rs. Lakh)

S. No.	Particulars	As on COD i.e. 24/02/2026	2025-26 (24/02/2026 to 31/03/2026)	2026-27	2027-28	2028-29
I	No. of Days in the year		365	365	366	365
II	No. of days for which tariff claimed		36	365	366	365
1	O & M Expenses - one month		13.60	14.41	15.16	15.94
2	Maintenance Spares 15% of O&M Expenses		24.48	25.95	27.29	28.70
3	Receivables equivalent to 45 days of AFC		1,023.21	1,113.89	1,162.73	1,140.23
4	Total Working Capital		1,061.29	1,154.25	1,205.18	1,184.88
5	Reference rate as on 01.04.2024 or as on 01st April of the COD year, whichever is later.	12.25%	12.25%	11.95%	11.95%	11.95%
6	Interest on Working Capital		12.82	137.93	144.02	141.59

(Petitioner)

PART-III
FORM-12

Details of time over run

Name of the Transmission Assets

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

(Amount in Rs. Lakh)

S. No.	Description of Activity/ Works/ Service	Original Schedule (As per Planning)		Actual Achieved (As per Actual)		Time Over-Run	Agency responsible and whether such time over run was beyond the control of the Transmission Licensee	Reasons for delay	Other Activity affected (Mention Sr. No of activity affected)
		Start Date	Completion Date	Start Date	Completion Date	Days			
1.	Delay due to belated intimation of location of Ahmedabad S/s by PGCIL			24-03-2023	18-02-2024	332		Delay in receiving Ahmedabad Substation Location / Change in Scope work	
2.	Delay by DM in issuing RoW clearances			26-07-2024	01-05-2025	280		RoW Concerns - Delay in DM orders & Police Protection	
3.	Tower Supply, Supply of Hardware & Accessories			02-10-2024	16-10-2024	15		Metal Quarry strike effecting supply of material	
4.	Tower Foundation & erection					50		Delay in work due to rainfall	
5.	Testing & Commissioning			10-02-2026	15-02-2026	6		Delay for LILO connectivity Outage	
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

(Petitioner)

Name of the Transmission Assets

Drawdown schedule Calculation of IDC & Financing Charges

Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

Interest During Construction: Foreign Loan										
S. No.	Draw Down	Quarter 1			Quarter 2			Quarter n (COD)		
	Particulars	Quantum in Foreign currency	Exchange Rate on draw down date	Amount in Indian Rupee (Rs. Lakh)	Quantum in Foreign currency	Exchange Rate on draw down date	Amount in Indian Rupee (Rs. Lakh)	Quantum in Foreign currency	Exchange Rate on draw down date	Amount in Indian Rupee (Rs. Lakh)
1	Loans									
1.1	Foreign Loans									
1.1.1	Foreign Loan ¹									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									
1.1.2	Foreign Loan ²									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									
1.1	Total Foreign Loans									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									

N/A

PART-III
FORM-12B

Drawdown schedule Calculation of IDC & Financing Charges
Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

Name of the Transmission Assets

Interest During Construction: Domestic Loan																	
S. No.	Name of the Lender & Loan	Loan Type ^a	Interest type ^b	Interest frequency ^c	Interest Due dates	Date of infusion	Loan Principal Amount	Rate of Interest	COD	No. of Interest Days	Interest up to COD	Adjustments if any	Capitalised IDC Up to COD	Interest on Cash basis ^d	Un-Discharge IDC liability	2025-26 Discharge ^e	2026-27 Discharge ^f
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-	11=(7*8*	12	13=11-12	14	15=(13-14)	16	17
1	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		03-07-2024	1500	8.50%	30-05-2025	332	115.97	-	115.97	115.97			
2	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		25-09-2024	1400	8.50%	30-05-2025	248	80.85	-	80.85	80.85			
3	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		26-12-2024	500	8.50%	30-05-2025	156	18.16	-	18.16	18.16			
4	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		10/01/2025	900	8.50%	30-05-2025	141	29.55	-	29.55	29.55			
5	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		13/01/2025	1500	8.50%	30-05-2025	138	48.21	-	48.21	48.21			
6	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		30/01/2025	600	8.50%	30-05-2025	121	16.91	-	16.91	16.91			
7	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		06/02/2025	1700	8.50%	30-05-2025	114	45.13	-	45.13	45.13			
8	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		15/02/2025	1700	8.50%	30-05-2025	105	41.57	-	41.57	41.57			
9	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		27/02/2025	150	8.50%	30-05-2025	93	3.25	-	3.25	3.25			
10	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		05-03-2025	1350	8.50%	30-05-2025	87	27.35	-	27.35	27.35			
11	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		10-03-2025	900	8.50%	30-05-2025	82	17.19	-	17.19	17.19			
12	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		12-03-2025	500	8.50%	30-05-2025	80	9.32	-	9.32	9.32			
13	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		25-03-2025	150	8.50%	30-05-2025	67	2.34	-	2.34	2.34			
14	Torrent Power Limited-24-25	Capex Loan	Fix	Qtrly		27-03-2025	375	8.50%	30-05-2025	65	5.68	-	5.68	5.68			
15	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		02-04-2025	425	8.50%	30-05-2025	59	5.84	-	5.84	5.84			
16	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		05-04-2025	150	8.50%	30-05-2025	56	1.96	-	1.96	1.96			
17	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		07-04-2025	200	8.50%	30-05-2025	54	2.52	-	2.52	2.52			
18	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		09-04-2025	450	8.50%	30-05-2025	52	5.45	-	5.45	5.45			
19	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		17-04-2025	425	8.50%	30-05-2025	44	4.35	-	4.35	4.35			
20	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		19-04-2025	75	8.50%	30-05-2025	42	0.73	-	0.73	0.73			
21	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		28-04-2025	625	8.50%	30-05-2025	33	4.80	-	4.80	4.80			
22	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		30-04-2025	175	8.50%	30-05-2025	31	1.26	-	1.26	1.26			
23	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		08-05-2025	725	8.50%	30-05-2025	23	3.88	-	3.88	3.88			
24	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		14-05-2025	150	8.50%	30-05-2025	17	0.59	-	0.59	0.59			
25	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		15-05-2025	50	8.50%	30-05-2025	16	0.19	-	0.19	0.19			
26	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		27-05-2025	1200	8.50%	30-05-2025	4	1.12	-	1.12	1.12			
27	Torrent Power Limited-25-26-1	Capex Loan	Fix	Qtrly		29-05-2025	300	8.50%	30-05-2025	2	0.14	-	0.14	0.14			
28	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		16-07-2025	250	8.50%	29-09-2025	76	4.42	-	4.42	4.42			
29	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		29-07-2025	200	8.50%	29-09-2025	63	2.93	-	2.93	2.93			
30	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		30-07-2025	625	8.50%	29-09-2025	62	9.02	-	9.02	9.02			
31	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		01-08-2025	400	8.50%	29-09-2025	60	5.59	-	5.59	5.59			
32	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		04-08-2025	500	8.50%	29-09-2025	57	6.64	-	6.64	6.64			
33	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		07-08-2025	400	8.50%	29-09-2025	54	5.03	-	5.03	5.03			
34	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		26-08-2025	200	8.50%	29-09-2025	35	1.63	-	1.63	1.63			
35	Torrent Power Limited-25-26-2	Capex Loan	Fix	Qtrly		29-08-2025	200	8.50%	29-09-2025	32	1.49	-	1.49	1.49			
36	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		02-09-2025	10000	8.85%	23-02-2026	174	421.88	-	421.88	366.11	55.77	55.77	
37	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		06-11-2025	1500	8.85%	23-02-2026	110	40.01	-	40.01	31.64	8.37	8.37	
38	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		20-11-2025	1500	8.85%	23-02-2026	96	34.92	-	34.92	26.55	8.37	8.37	
39	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		25-11-2025	1000	8.85%	23-02-2026	91	22.06	-	22.06	16.49	5.58	5.58	
40	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		05-12-2025	2500	8.85%	23-02-2026	81	49.10	-	49.10	35.16	13.94	13.94	
41	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		09-12-2025	1500	8.85%	23-02-2026	77	28.00	-	28.00	19.64	8.37	8.37	
42	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		15-12-2025	1500	8.85%	23-02-2026	71	25.82	-	25.82	17.46	8.37	8.37	
43	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		22-01-2026	1500	8.85%	23-02-2026	33	12.00	-	12.00	3.64	8.37	8.37	
44	Bank of Baroda	Term Loan	Variable	Monthly		05-02-2026	1500	8.85%	23-02-2026	19	6.91	-	6.91	-	6.91	6.91	
	Financing Charges (FC)										12.45		12.45	12.45	-	-	
	Charges for Letter of Credit										5.40		5.40	5.40	-	-	
Total											1,189.62		1,189.62	1,065.60	124.02	124.02	-

PART-III
FORM-12B

Name of the Transmission Assets

Drawdown schedule Calculation of IDC & Financing Charges
Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D

Capitalised Finance Charges (Domestic Loan)								
S. No	Name of the Finance Charge	Whether one time payment/periodical payment ?	Basis of payment	Date	Finance Charges paid/Payable	Capitalised FC	Liabilities	FC on Cash Basis
Total					-	-		

(Petitioner)

Part III
FORM -13

Details of Initial Spares													
Name of the petitioner		Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D											
Claimed / Admitted COD		24-02-2026								Cut-off Date of the Asset:			
A) Determination of Excess initials spare and its adjustment from Capital cost													
Particulars	Plant and machinery cost as on cut-off Date ¹	Initial Spare Capitalised as per Books of Account up to Cut-off Date					Ceiling limit as mentioned in Regulations 23	Entitled Initial Spare as per Regulations	Excess of capitalised Initial Spare to be reduced from Capital cost.	Adjustment of Excess Initial Spare from Capital cost of Plant and Machinery			
		As on COD	As ACE dr. Y1	As ACE dr. Y2	As ACE dr. Y3	Total as on Cut off Date ³				COD	ACE for Y1	ACE for Y2	ACE for Y3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-9 (Note 2)	11	12	13	14
Transmission Line		N/A											
Substation Green field													
Substation Brown Field													
Series Compensation devices and HVDC Station													
GIS/S- Green field													
GIS/S-Brown field													
Communication System													
Static Synchronous Compensator													
Initial spare as per Books of Account													
Un-Discharge liabilities included above													
Total Capitalized initial spare													
B) Determination of Plant & Machinery Cost for ceiling of initial spare.													
Particulars	Gross Block of Asset as on COD	Less: Amount included in Col. B towards					Plant and machinery cost as on COD for Initial Spare	Plant & Machinery			plant and machinery cost as on cut-off Date for the		
		Land Cost	Cost of Civil Works	IEDC	IEDC	Initial Spare		Year -1	Year-2	Year-3			
a	b	c	d	e	f	g	h=b-c-d-e-f-g	i	j		l=h+i+j+k		
Transmission Line		N/A											
Substation Green field													
Substation Brown Field													
Series Compensation devices and HVDC Station													
Gas Insulated Substation- Green field													
Gas Insulated Substation- Brown field													
Communication System													
Static Synchronous Compensator													

Note: The Cost details for the year in which Cut-off date falls has to be provide only up to the cut-off date.

(Petitioner)

PART-III
FORM- 14

Non-Tariff Income

S. No.	Parameters	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1.	Income from rent of land or buildings or eco-tourism		-	-	-	-	-
2.	Income from sale of scrap		-	-	-	-	-
3.	Income from advertisements		-	-	-	-	-

Note: To be submitted at the time of truing up
(Petitioner)

PART-III
FORM- 15

Summary of issue involved in the petition

1. Name of the Petitioner	Torrent Power Grid Limited			
2. Petition Category				
3. Tariff Period	2024-29			
4. Name of the Project	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D			
5. Investment Approval date	16-02-2023			
6. SCOD of the Project	21-03-2025			
7. Actual COD of the project	24-02-2026			
8. Whether entire scope is covered in the present petition.	Yes			
9. No. of Assets covered in instant petition	1			
10. No. of Assets having time over run				
11. Estimated Project Cost as per IA	N/A			
12. Is there any REC? if so, provide the date	N/A			
13. Revised Estimated Project Cost (if any)				
14. Completion cost for all the assets covered in the instant				
15. No. of Assets covered in instant petition and having cost				
16	Prayer in brief			
17	Key details and any Specific issue involved			
18	Respondents			
	Name of Respondents			
	1.	Central Transmission Utility of India Limited	7.	Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited
	2.	Western Regional Power Committee	8.	Torrent Power Limited
	3.	PTC India Limited, Respondent	9.	Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited
	4.	Goa Electricity Department	10.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Power Distribution Corporation Ltd
	5.	Gujarat Urja Vikas Nigam Limited	11.	Central Electricity Authority
	6.	M.P. Power Management Company Limited	12.	

(Petitioner)

Summary of Capital Cost & Annual Fixed Cost (AFC) Claimed for ALL the assets covered in the present petition.													
Name of the Petitioner				Torrent Power Grid Limited									
Tariff Period				2024-29									
Name of the Transmission Project				Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D									
COD of the Project (if entire scope of project is completed)				24-02-2026									
													Rupees in lakh
A) Summary of Capital Cost as on COD and Additional Capital Expenditure claimed for all the assets Covered in the instant petition.													
S. No.	Asset No.	COD	Cut-off Date	i) Apportioned Approved		ii) Summary of Actual / Projected Capital Cost							Capital Cost as on Cut-off Date
				As per Investment approval	As per RCE	As on COD	2024-25	2025- 26	2026- 27	2027 -28	2028 -29	Capital Cost as on 31.03.2029 11=(5+6+7+8+9+10)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Asset 1			80,100.00		49,957.97	-	3,422.66	7,981.62			61,362.24	61,362.24
2	Asset 2												
----	Asset												
Total Capital Cost Claimed													
B) Summary of Annual Fixed Cost (AFC) claimed for all the assets covered in the instant petition.													
S. No.	Asset No.	Asset Name and its location						2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	
1	Asset 1	Transmission scheme for evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase-II, Part-D							818.57	9,034.92	9,456.84	9,248.57	
2	Asset 2												
----	Asset												
Total AFC for all the Assets									818.57	9,034.92	9,456.84	9,248.57	

Note: 1) The purpose of this form is to summarise the Capital cost & AFC claimed for all the assets covered in the instant petition.

(Petitioner)

CERTIFIED TRUE COPY OF RESOLUTION PASSED AT THE 89TH MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TORRENT POWER GRID LIMITED HELD ON MONDAY, JANUARY 27, 2025 FROM 04:00 PM TO 04:30 PM THROUGH AUDIO VIDEO CONFERENCING CONDUCTED FROM "SAMANVAY", 600 TAPOVAN, AMBAWADI, AHMEDABAD – 380 015


REVISION IN AUTHORITY IN RESPECT OF VARIOUS LEGAL MATTERS

"RESOLVED THAT in supersession of resolution passed by the Board of Directors on July 27, 2023, the following Directors/ Authorised Signatories namely:

1. Shri Jinal Mehta
2. Shri Varun Mehta
3. Shri Naimesh Shah
4. Shri Saurabh Mashruwala
5. Shri Sudhir Prasad
6. Shri Chetan Bundela
7. Shri Pramod G. Patel
8. Shri Jignesh Langalia
9. Shri Mihir Thakkar

a) be and are hereby severally authorised to appear and file any petition, application, affidavit, reply, rejoinder; to give evidence and to depose before:

- State Electricity Regulatory Commissions including Gujarat Electricity Regulatory Commission (GERC);
- Central Electricity Regulatory Commission (CERC);
- Central Electricity Authority (CEA);
- Central Government, its departments, undertakings and Corporations;
- State Governments, its departments, undertakings and Corporations;
- Public sector units;
- Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL);
- Central Transmission Utility of India Limited (CTU);
- Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL);
- Gujarat Energy Transmission Corporation Limited (GETCO);
- Other state government electricity boards;
- Appellate tribunals for electricity and any other competent authority including courts of law;



TORRENT POWER GRID LIMITED


CIN : U40104GJ2005PLC046660

Regd. Office : "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, India. Phone: 079 - 26628300 email: cs.tpgl@torrentpower.com

- Roads and Building Departments of State and Central Government;
 - Municipal corporations including Ahmedabad Municipal Corporation and Surat Municipal Corporation and other local bodies including gram panchayats;
 - Offices of sub-registrar of assurances;
 - City Survey Offices;
 - Urban development authorities including Ahmedabad Urban Development Authority and Surat Urban Development Authority;
 - SEZ Developer;
 - SEZ authority;
 - Direct and Indirect Tax Authorities & Tribunals thereof
 - Other legal authorities;
 - Other various government/ semi-government/ local authorities, statutory and regulatory agencies/ commissions;
- b) To appoint consultants and determine their fees and out-of-pocket expenses from time to time.
- c) To engage advocates and to sign Vakalatnama for and on behalf of the Company to initiate proceedings, suits, legal actions, etc. and to defend/ protect interest of the Company in all types of proceedings including consumer disputes, civil, contractual, labour or criminal matters before all forums, tribunals, courts whether at local, district, state or central level, other quasi-judicial bodies, government authorities and local bodies.
- d) To affix Common Seal of the Company on the above-referred documents, if necessary, in presence of any one of the above-referred Directors/ Authorised Signatories or the Company Secretary, who shall sign the same in token thereof."

For Torrent Power Grid Limited


Darshan Soni
Company Secretary





426

BEFORE LD. CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AT NEW
DELHI


PETITION NO. /TT/2026

IN THE MATTER OF:

Torrent Power Grid Limited

AND

Central Transmission Utility of India Ltd. & Ors.



VAKALATNAMA

I, Mihir Hasmukhbhai Thakkar, son of Mr. Hasmukhbhai Thakkar, aged about 38 years, having office at "Samnvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380015, being the authorized signatory of the Petitioner, Torrent Power Grid Limited, do hereby appoint and retain Ms. Poonam Verma Sengupta [online ID: poonamsengupta], Mr. Saunak Kumar Rajguru, Mr. Pradyumn Amit Sharma, Mr. Palash Moolchandani, Ms. Gayatri Aryan, Ms. Sakshi Kapoor, Mr. Rajesh Jha, Mr. Subham Bhut, and all advocates of J. Sagar Associates to appear, plead and act for me/us in the above appeal/petition/application and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect thereof and applications for return of documents, enter into a compromise and to draw any moneys payable to me/us in the said proceeding and also to appear in all applications for review and for leave to the Supreme Court of India in all applications for review of judgment.

Place: Ahmedabad

Date: 15.06.2026

Signature of the Party

Executed in my presence.



M. H. Thakkar
"Accepted"



Poonam

J. Sagar Associates,
Advocates for the Petitioner
3rd Floor, Tower-C,
World Trade Centre,
Nauroji Nagar, New Delhi-110029

*Signature with date
(Name and Designation)



15 JUN 2026

JIGNESH
DHANSUKHLAL
LANGALIA

Digitally signed by JIGNESH
DHANSUKHLAL LANGALIA
Date: 2026.06.16 19:32:51
+05'30'

